


国分寺市バリアフリー特定事業計画  
令和6年度実績

# 目 次

1. 国分寺駅周辺地区の重点整備地区の区域、生活関連施設、生活関連経路…	1
2. 特定事業計画（令和6年度実績）	2
!	2
2-2. 道路特定事業	4
2-3. 都市公園特定事業	21
2-4. 建築物特定事業	24
2-5. 交通安全特定事業	53
2-6. 教育啓発特定事業	58
2-7. その他の特定事業	66

図 国分寺駅周辺地区の重点整備地区の区域、生活関連施設、生活関連経路

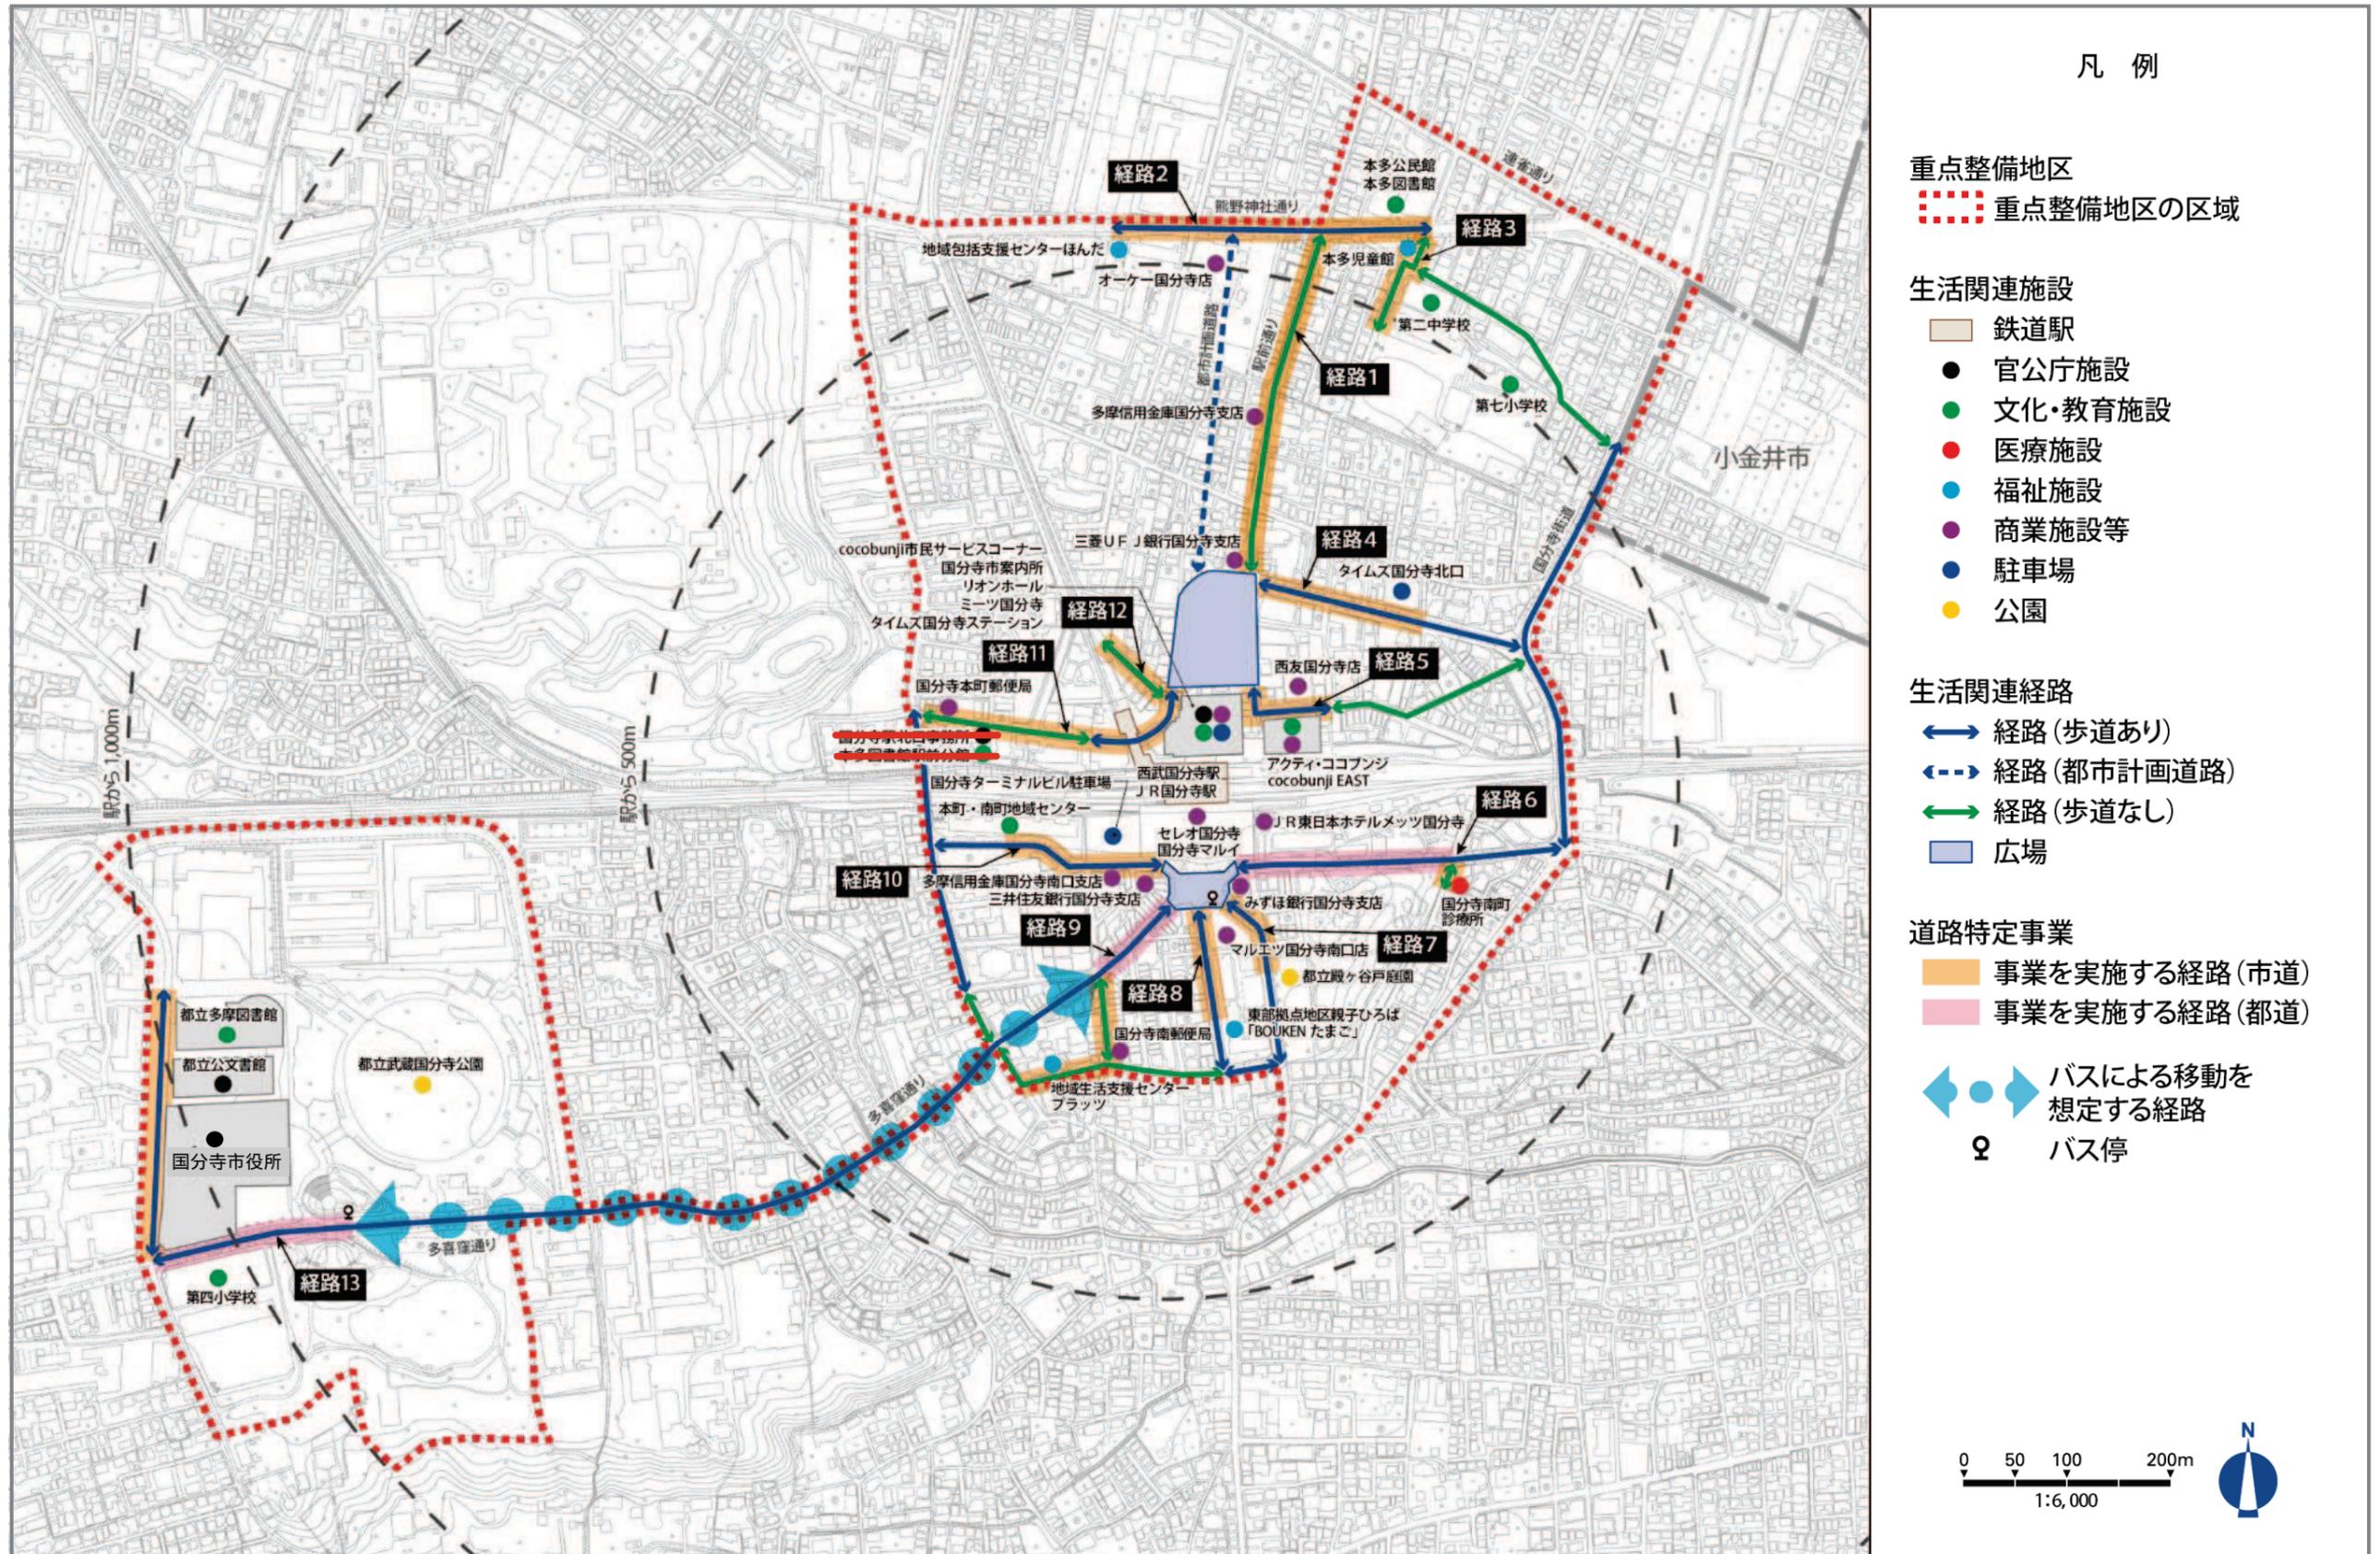

**公共交通特定事業**

<b>整備対象</b>	<b>JR 国分寺駅</b>	<b>対象事業者名</b>	<b>JR 東日本</b>
-------------	----------------	---------------	---------------

**事業内容・実施時期**

番号	事業内容	延長(m) 箇所数	目標 時期		実施時期										
					短期					長期					
					R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	
1	有人改札口に車いす使用者 に対応したカウンターを設 置	1 箇所	継続 検討	実施時期	※検討中										
				備考 進捗状況	大規模改修に併せ改修を検討										
2	有人改札口における筆談ツ ールの準備とその表示の設 置	1 箇所	短期	実施時期	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	
				備考 進捗状況	実施済										
3	ホーム階段下への侵入防止 のための柵等の設置	3 箇所	継続 検討	実施時期	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	
				備考 進捗状況	2箇所（上りホーム）は実施済み、 1箇所（下りホーム）は侵入防止設備の整備を検討中、R7 現在は 緩衝材設置による対処済み。今後大規模改修に併せ侵入防止設備整 備を検討。										
4	ホームドアの設置	2 ホー ム 4 列	長期	実施時期	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	
				備考 進捗状況	2028（R10）年度までの整備に向け検討中										
そ の 他				実施時期	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	
				備考 進捗状況											

**実施に必要な資金額及び調達方法**

- ・自己資金及び東京都からの補助により調達予定

**実施済項目**

- ・各ホームエレベーター整備済み
- ・駅ホーム内方線整備済み

**その他事項**

**事業箇所図**

②筆談ツールの準備・表示の設置

③階段下への侵入防止

1 中央線（立川・八王子・高尾方面）

2 中央線（立山・八王子・高尾方面）

3 中央線（三鷹・新宿・東京方面）

4 中央線（三鷹・新宿・東京方面）

八王子・大月方面

新宿・東京方面

**公共交通特定事業**

<b>整備対象</b>	西武国分寺駅	<b>対象事業者名</b>	西武鉄道株式会社
-------------	--------	---------------	----------

**事業内容・実施時期**

番号	事業内容	延長(m) 箇所数	目標 時期		実施時期										
					短期					長期					
					R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	
1	有人改札口の筆談対応の表示の改善	1カ所	短期	実施時期											
				備考 進捗状況	R5 実施済み										
2				実施時期											
				備考 進捗状況											
3				実施時期											
				備考 進捗状況											
その他				実施時期											
				備考 進捗状況											

**実施に必要な資金額及び調達方法**

--


**実施済項目**

--

**その他事項**

--

**事業箇所図**

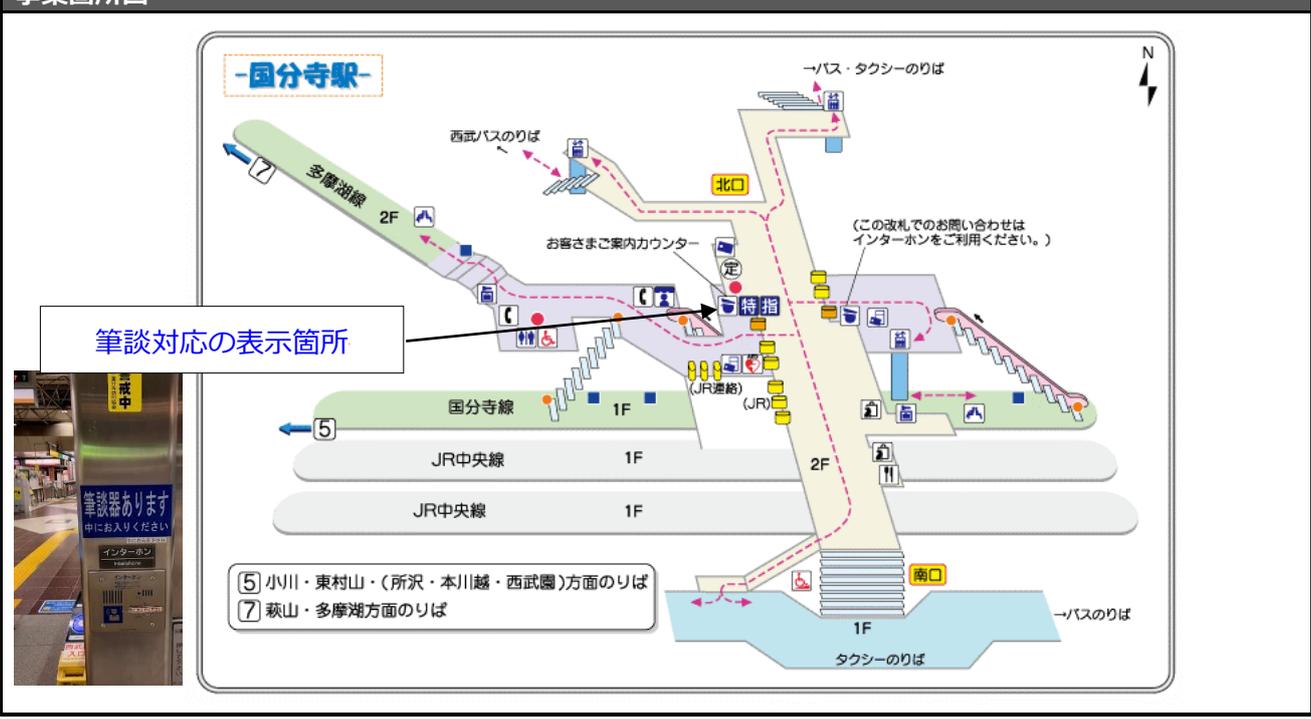

**道路特定事業**

<b>整備対象</b>	都道 145 号立川国分寺線 (多喜窪通り・丸山通り)	<b>対象事業者名</b>	東京都
-------------	-----------------------------	---------------	-----

**事業内容・実施時期**

番号	事業内容	延長(m) 箇所数	目標 時期		実施時期												
					短期						長期						
					R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13			
1	視覚障害者誘導用ブロックの改善・設置	200m	継続 検討	実施時期	※検討中												
				備考 進捗状況	・適切な維持管理を継続して実施												
2	歩道の勾配の改善	200m	継続 検討	実施時期	※検討中												
				備考 進捗状況	・継続検討												
3	歩道の有効幅員確保	200m	継続 検討	実施時期	※検討中												
				備考 進捗状況	・未定												
その他				実施時期	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13			
				備考 進捗状況													


**実施済項目**

--

**その他事項**

--

**事業箇所図**

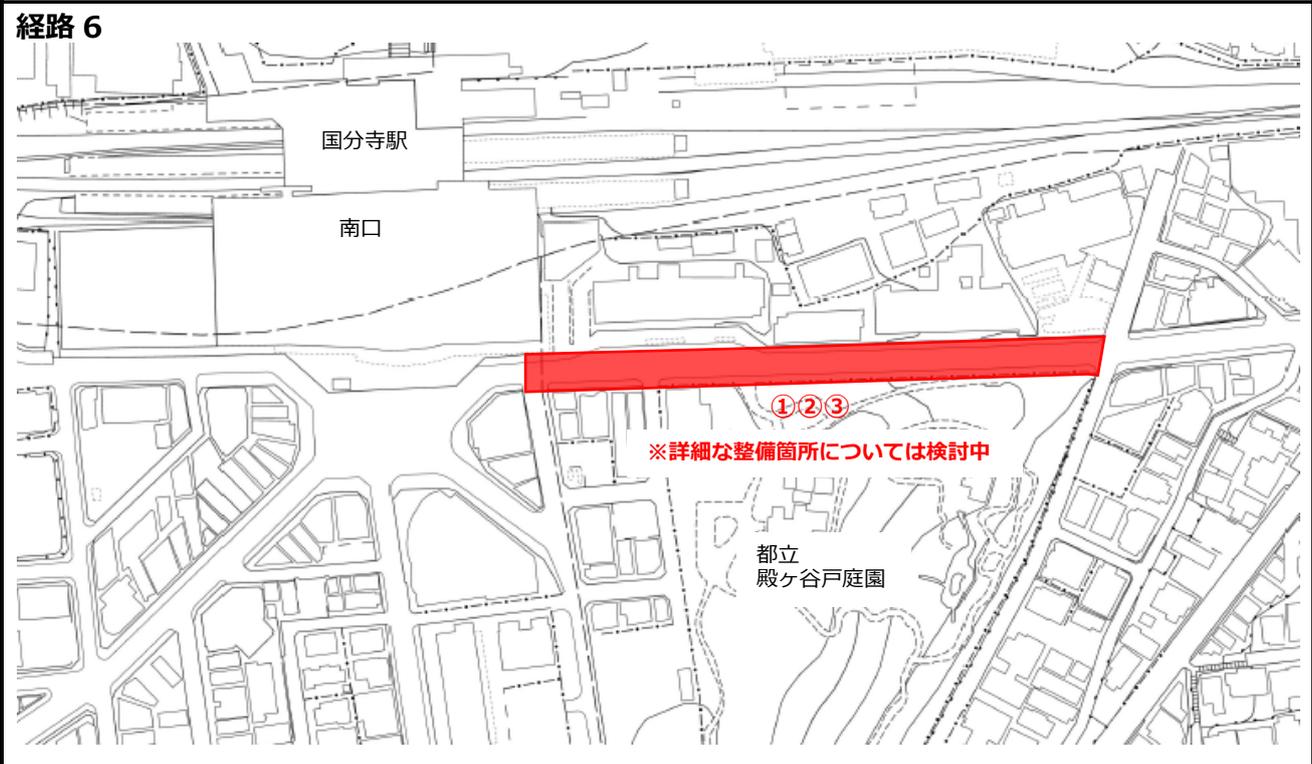

**道路特定事業**

<b>整備対象</b>	都道 145 号立川国分寺線 (多喜窪通り)	<b>対象事業者名</b>	東京都
-------------	------------------------	---------------	-----

**事業内容・実施時期**

番号	事業内容	延長(m) 箇所数	目標 時期		実施時期												
					短期						長期						
					R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13			
1	視覚障害者誘導用ブロックの改善・設置	100m	継続 検討	実施時期	※検討中												
				備考 進捗状況	・適切な維持管理を継続して実施												
2	歩道の勾配の改善	100m	継続 検討	実施時期	※検討中												
				備考 進捗状況	・継続検討												
3	歩車道境界部の段差の改善	100m	継続 検討	実施時期	※検討中												
				備考 進捗状況	・適切な維持管理を継続して実施												
その他				実施時期	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13			
				備考 進捗状況													

**実施済項目**

--

**その他事項**

--

**事業箇所図**



**道路特定事業**

<b>整備対象</b>	都道 145 号立川国分寺線 (多喜窪通り)	<b>対象事業者名</b>	東京都
-------------	------------------------	---------------	-----

**事業内容・実施時期**


番号	事業内容	延長(m) 箇所数	目標 時期		実施時期												
					短期						長期						
					R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13			
1	視覚障害者誘導用ブロックの改善・設置	200m	継続 検討	実施時期	※検討中												
				備考 進捗状況	・適切な維持管理を継続して実施												
				実施時期	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13			
				備考 進捗状況													
				実施時期	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13			
				備考 進捗状況													
その他				実施時期	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10						
				備考 進捗状況													

**実施済項目**

**その他事項**

**事業箇所図**

**経路 13**

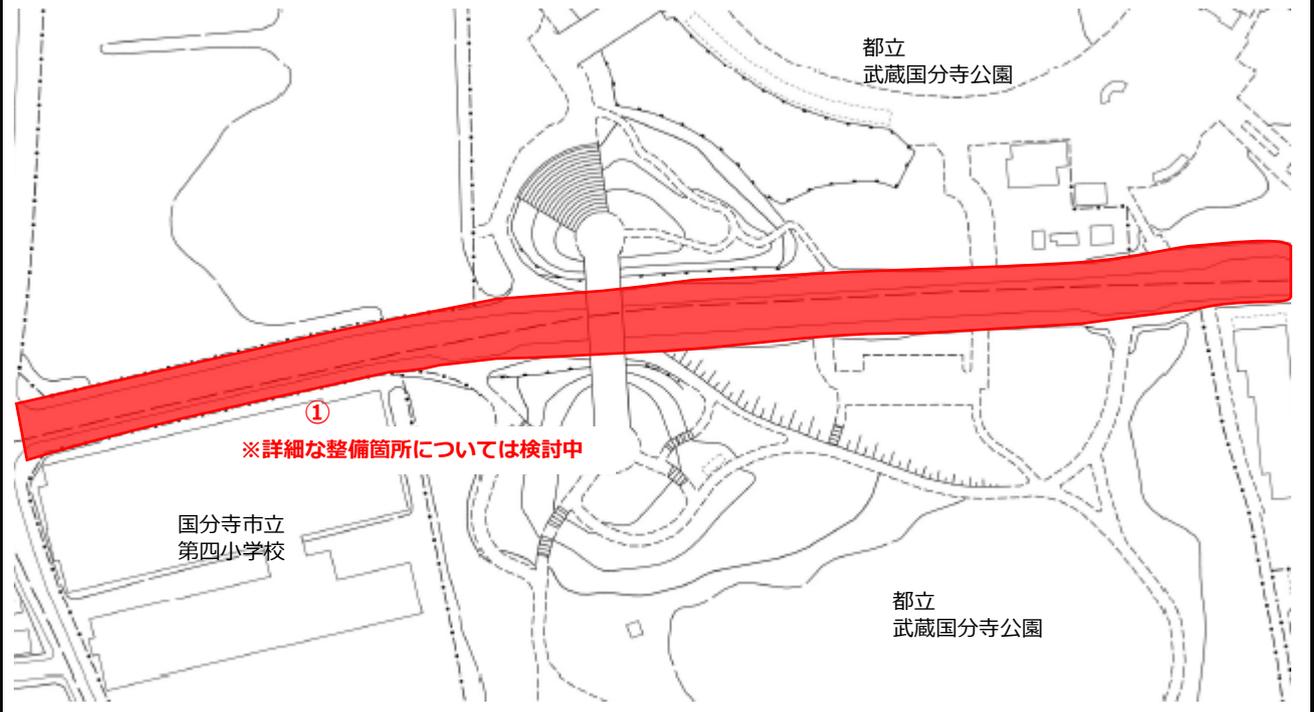

**道路特定事業**

<b>整備対象</b>	<b>市道幹5号線（駅前通り）</b>	<b>対象事業者名</b>	<b>国分寺市</b>
-------------	---------------------	---------------	-------------

**事業内容・実施時期**

番号	事業内容	延長(m) 箇所数	目標 時期		実施時期									
					短期					長期				
					R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
1	安全な歩行空間の整備	約 330 m	長期	実施時期										
				備考 進捗状況	・整備方針の決定及び国3・4・12号線の整備に合わせ、関係部署と調整していく。									
2	歩行者主体の道づくりの検討	約 330 m	長期	実施時期										
				備考 進捗状況	・国3・4・12号線施行の進捗を鑑み、まちづくり協議会の活動に対して必要な支援を行う。									
3				実施時期										
				備考 進捗状況										
その他				実施時期										
				備考 進捗状況										

**実施済項目**

--

**その他事項**

・市まちづくり条例に基づき認定した「北口駅前通り交通安全まちづくり協議会」により、歩行者が安全かつ安心に歩行できる道等の実現について検討中。（R5にまちづくり協議会を1回開催）

**事業箇所図**



**道路特定事業**

<b>整備対象</b>	<b>市道幹7号線（駅前通り以东）</b>	<b>対象事業者名</b>	<b>国分寺市</b>
-------------	-----------------------	---------------	-------------

**事業内容・実施時期**

番号	事業内容	延長(m) 箇所数	目標 時期		実施時期											
					短期					長期						
					R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13		
1	歩車道境界部の段差の改善	1か所	短期	実施時期												
				備考 進捗状況	・計画工事（舗装補修工事等）にあわせて対応する。											
2	歩道の勾配の改善	3か所	継続 検討	実施時期												
				備考 進捗状況	※検討中 ・関係機関、関係部署と調整し、実施時期や整備内容を検討する。											
3	視覚障害者誘導用ブロック の改善・設置	9か所	短期	実施時期												
				備考 進捗状況	・計画工事（舗装補修工事等）にあわせて対応する。 一部維持管理工事にて対応する。											
その他				実施時期												
				備考 進捗状況												


**実施済項目**

--

**その他事項**

--

**事業箇所図**

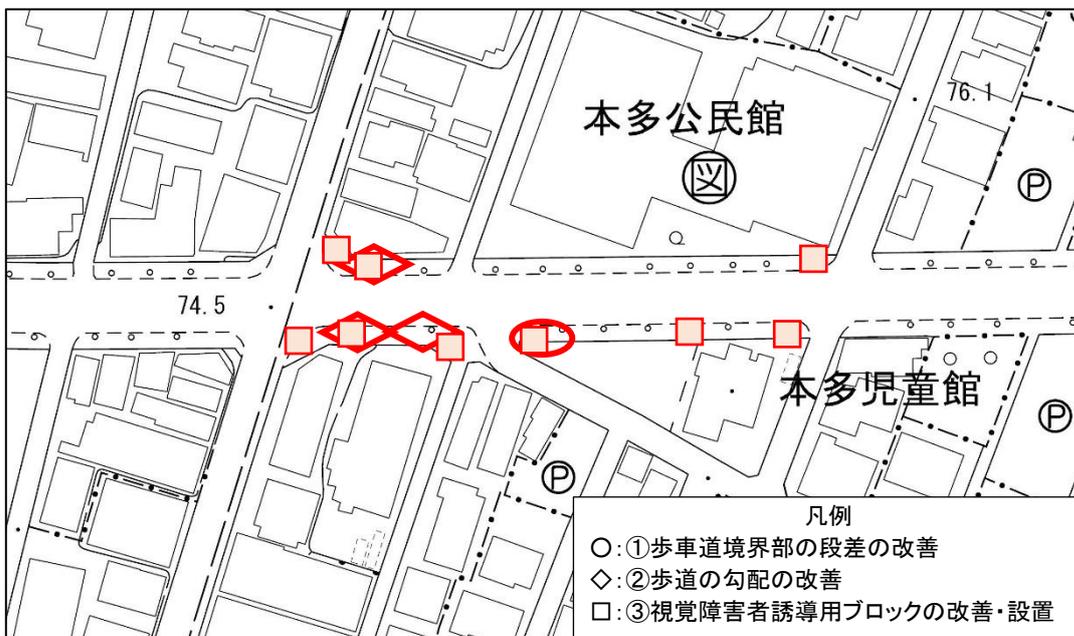

**道路特定事業**

<b>整備対象</b>	<b>市道幹7号線（駅前通り以西）</b>	<b>対象事業者名</b>	<b>国分寺市</b>
-------------	-----------------------	---------------	-------------

**事業内容・実施時期**

番号	事業内容	延長(m) 箇所数	目標 時期		実施時期												
					短期					長期							
					R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13			
1	視覚障害者誘導用ブロック の改善・設置	7か所	長期	実施時期													
				備考 進捗状況	・計画工事（舗装補修工事等）にあわせて対応する。 一部維持管理工事にて対応する。												
2				実施時期													
				備考 進捗状況													
3				実施時期													
				備考 進捗状況													
その他				実施時期													
				備考 進捗状況													


**実施済項目**

--

**その他事項**

--

**事業箇所図**

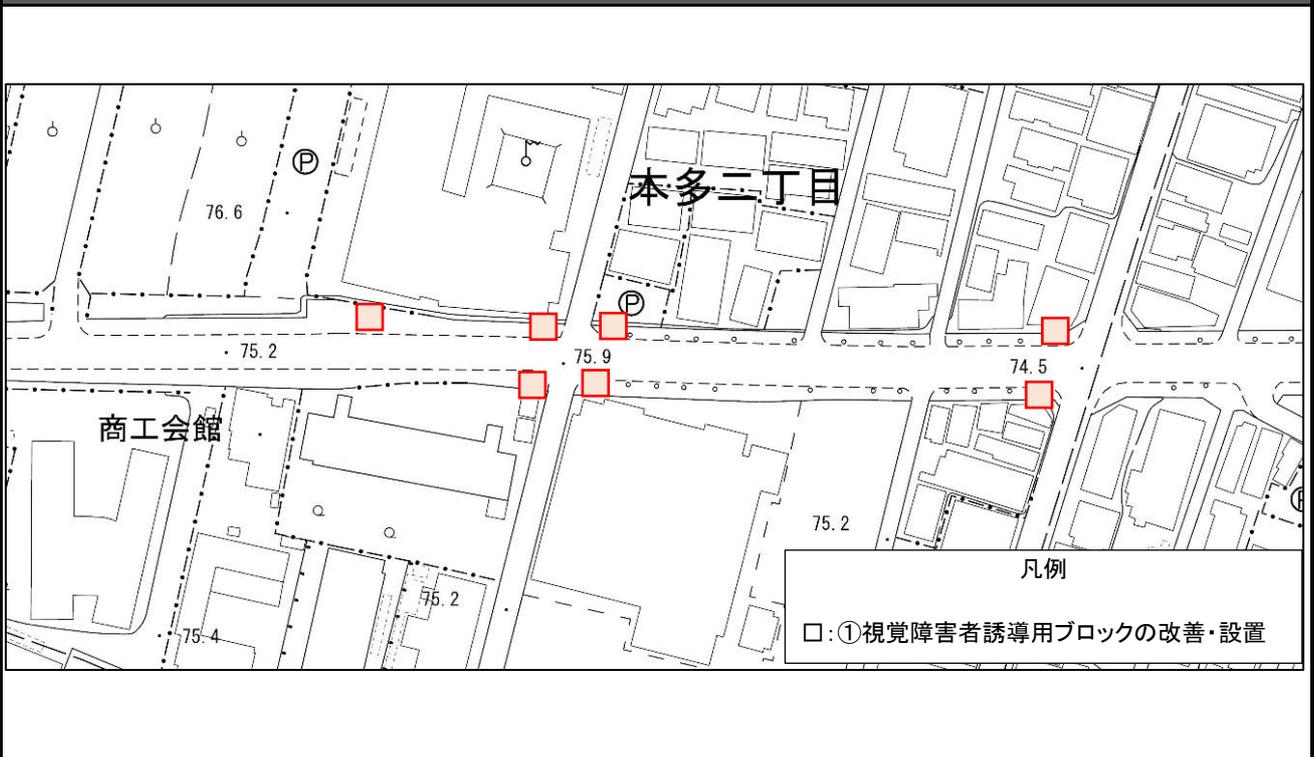

**道路特定事業**

<b>整備対象</b>	市道東1号線 東30号線 東40号線	<b>対象事業者名</b>	国分寺市
-------------	-----------------------	---------------	------

**事業内容・実施時期**

番号	事業内容	延長(m) 箇所数	目標 時期		実施時期									
					短期					長期				
					R4	R5	R6	R7	R8	R4	R5	R6	R7	R8
1	安全な歩行空間の整備	未定	継続 検討	実施時期	※検討中									
				備考 進捗状況	※関係機関、関係部署と調整し、実施時期や整備内容を検討する。 ・令和6年度区画線の引き直し実施済み。									
2				実施時期	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
				備考 進捗状況										
3				実施時期	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
				備考 進捗状況										
その他				実施時期	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
				備考 進捗状況										

**実施済項目**

**その他事項**

**事業箇所図**



**道路特定事業**

<b>整備対象</b>	市道幹4号線	<b>対象事業者名</b>	国分寺市
-------------	--------	---------------	------

**事業内容・実施時期**

番号	事業内容	延長(m) 箇所数	目標 時期		実施時期												
					短期					長期							
					R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13			
1	視覚障害者誘導用ブロックの改善	2か所	短期	実施時期													
				備考 進捗状況	・維持管理工事にて対応。 ・2箇所について、令和6年度実施済み。												
2				実施時期													
				備考 進捗状況													
3				実施時期													
				備考 進捗状況													
その他				実施時期													
				備考 進捗状況													

**実施済項目**

--

**その他事項**

--

**事業箇所図**

本町二丁目  
交差点

①

国分寺駅  
北口広場

②

凡例

□: ①視覚障害者誘導用ブロックの改善・設置

**道路特定事業**

<b>整備対象</b>	<b>市道南 96 号線</b>	<b>対象事業者名</b>	<b>国分寺市</b>
-------------	------------------	---------------	-------------

**事業内容・実施時期**

番号	事業内容	延長(m) 箇所数	目標 時期		実施時期									
					短期					長期				
					R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
1	安全な歩行空間の整備	未定	継続 検討	実施時期	※検討中									
				備考 進捗状況	※関係機関、関係部署と調整し、実施時期や整備内容を検討する。 ・令和6年度区画線の引き直し実施済み。									
2				実施時期	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
				備考 進捗状況										
3				実施時期	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
				備考 進捗状況										
その他				実施時期	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
				備考 進捗状況										


**実施済項目**

--

**その他事項**

--

**事業箇所図**

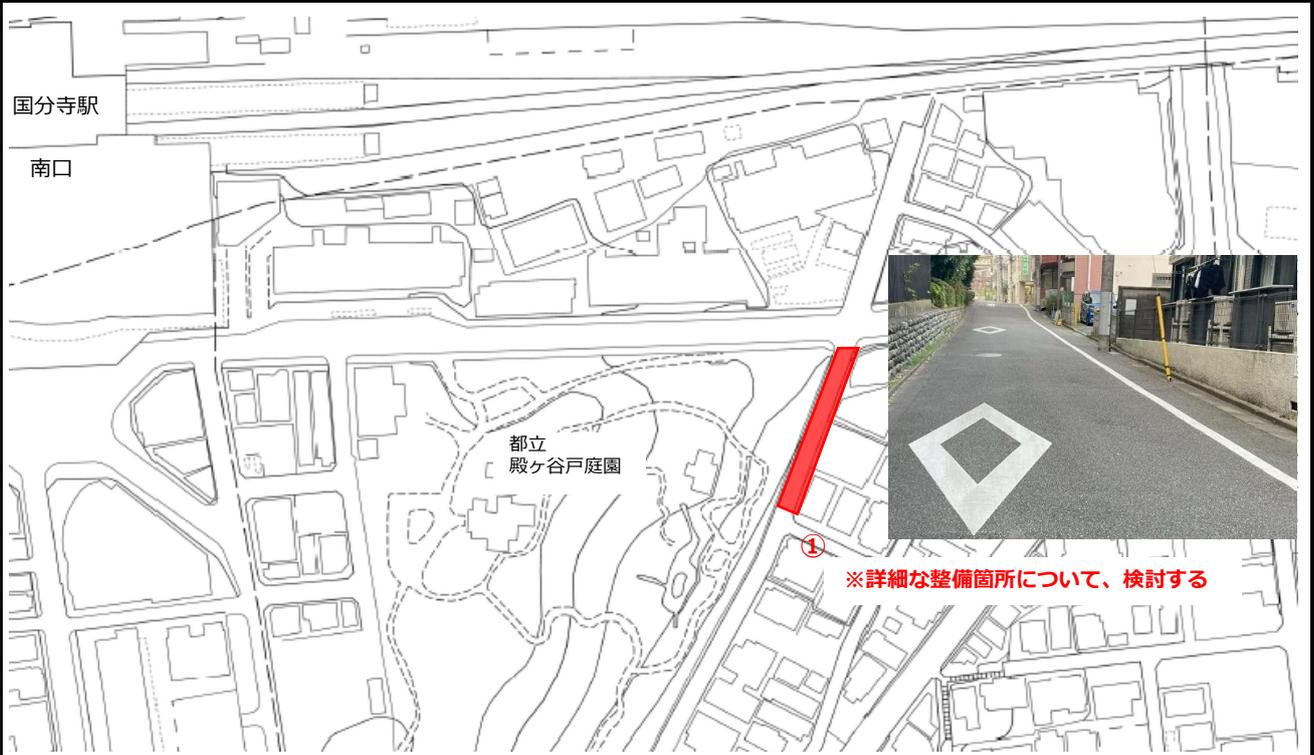

**道路特定事業**

<b>整備対象</b>	市道南 103・106 号線	<b>対象事業者名</b>	国分寺市
-------------	----------------	---------------	------

**事業内容・実施時期**


番号	事業内容	延長(m) 箇所数	目標 時期		実施時期												
					短期					長期							
					R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13			
1	歩車道境界部の段差の改善	2 か所	短期	実施時期	※検討中												
				備考 進捗状況	・R4 維持補修工事にて対応済み（南 103 号線） ・計画工事（舗装補修工事等）にあわせて対応する。（南 106 号線）												
2	視覚障害者用誘導ブロック の改善・設置	7 か所	短期	実施時期	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13			
				備考 進捗状況	・計画工事（舗装補修工事等）にあわせて対応する。												
3	歩行空間の連続性確保の整 備	1 か所	継続 検討	実施時期	※検討中												
				備考 進捗状況	※関係機関、関係部署と調整し、実施時期や整備内容を検討する。												
そ の 他				実施時期	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13			
				備考 進捗状況	・												

**実施済項目**

・歩車道境界部の段差の改善（1 か所）実施済み。

**その他事項**

**事業箇所図**

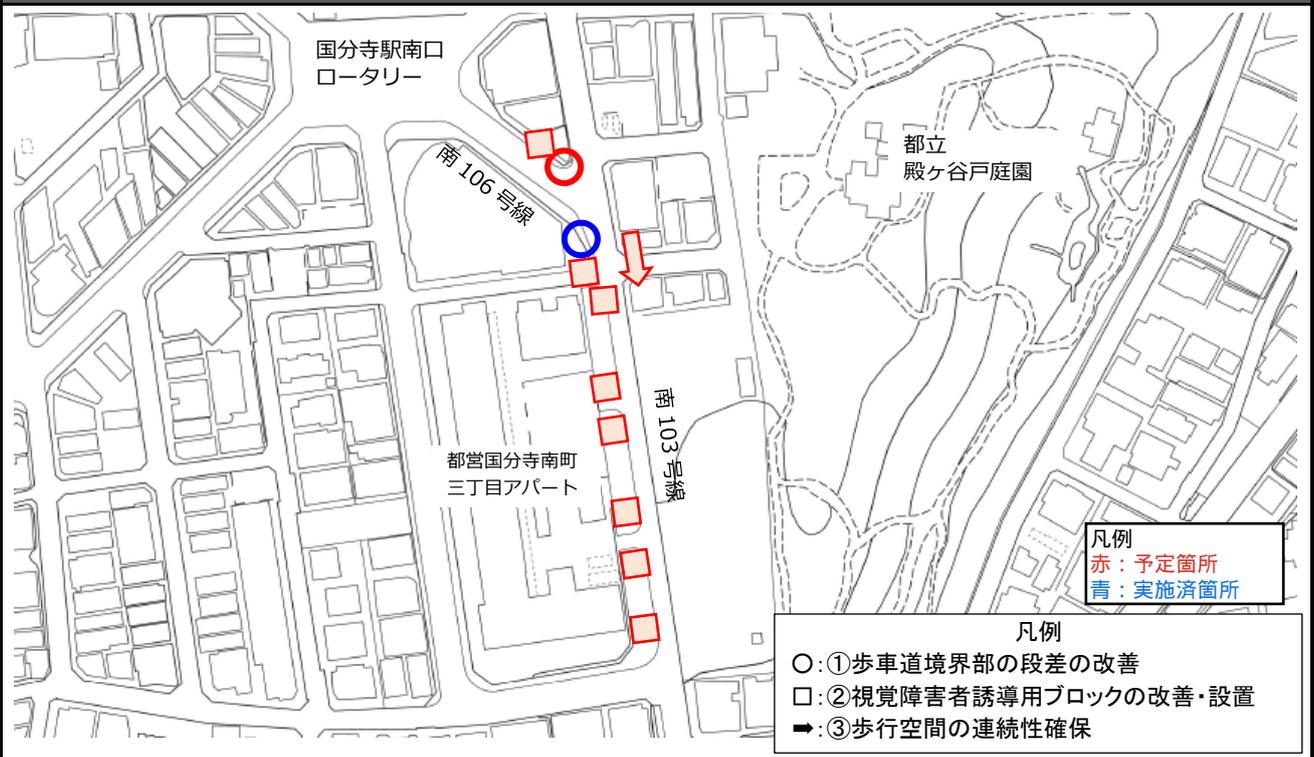

**道路特定事業**

<b>整備対象</b>	市道南 101 号線	<b>対象事業者名</b>	国分寺市
-------------	------------	---------------	------

**事業内容・実施時期**

番号	事業内容	延長(m) 箇所数	目標 時期		実施時期									
					短期					長期				
					R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
1	歩道の勾配の改善	未定	継続 検討	実施時期	※検討中									
				備考 進捗状況	※関係機関、関係部署と調整し、実施時期や整備内容を検討する。									
2	歩道の有効幅員確保	未定	継続 検討	実施時期	※検討中									
				備考 進捗状況	※関係機関、関係部署と調整し、実施時期や整備内容を検討する。									
3				実施時期	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
				備考 進捗状況										
その他				実施時期	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
				備考 進捗状況										

**実施済項目**

--

**その他事項**

--

**事業箇所図**



①② ※詳細な整備箇所については検討中

**道路特定事業**

<b>整備対象</b>	市道南 100・109・113 号線	<b>対象事業者名</b>	国分寺市
-------------	--------------------	---------------	------

**事業内容・実施時期**

番号	事業内容	延長(m) 箇所数	目標 時期		実施時期										
					短期					長期					
					R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	
1	安全な歩行空間の整備	未定	継続 検討	実施時期											
				備考 進捗状況	※関係機関、関係部署と調整し、実施時期や整備内容を検討する。										
2				実施時期											
				備考 進捗状況											
3				実施時期											
				備考 進捗状況											
その他				実施時期											
				備考 進捗状況											

**実施済項目**

--

**その他事項**

--

**事業箇所図**



**道路特定事業**

<b>整備対象</b>	市道南 115・120 号線・295 号線	<b>対象事業者名</b>	国分寺市
-------------	-----------------------	---------------	------

**事業内容・実施時期**


番号	事業内容	延長(m) 箇所数	目標 時期		実施時期												
					短期						長期						
					R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13			
1	歩車道境界部の段差の改善	1 箇所	短期	実施時期													
				備考 進捗状況	実施済み。												
2	歩道の勾配の改善	3 箇所	継続 検討	実施時期													
				備考 進捗状況	※関係機関、関係部署と調整し、実施時期や整備内容を検討する。												
3	視覚障害者誘導用ブロック の改善・設置	2 箇所	短期	実施時期													
				備考 進捗状況	・歩道の勾配の改善と同時対応が必要。												
4	歩道の有効幅員確保	2 箇所	継続 検討	実施時期													
				備考 進捗状況	※関係機関、関係部署と調整し、実施時期や整備内容を検討する。												
5	歩行空間の連続性確保の 整備	未定	継続 検討	実施時期													
				備考 進捗状況	※関係機関、関係部署と調整し、実施時期や整備内容を検討する。												

**実施済項目**

・歩車道境界部の段差の改善について実施済み。

**その他事項**

**事業箇所図**

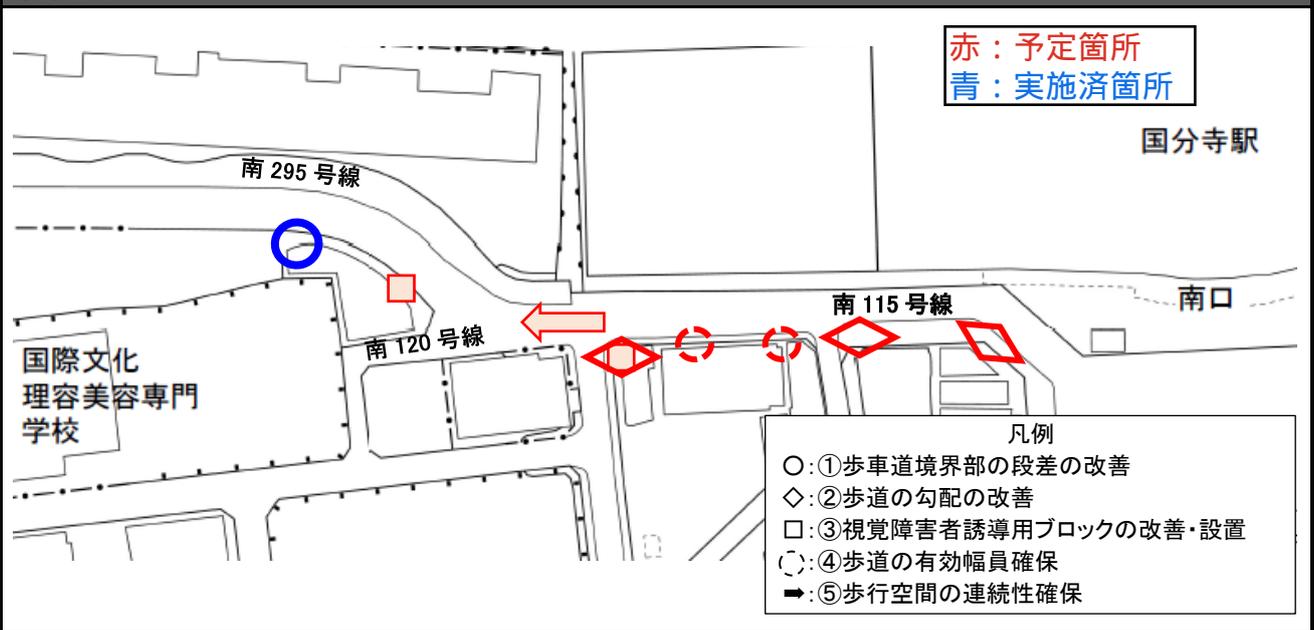

**道路特定事業**

<b>整備対象</b>	市道幹5号線	<b>対象事業者名</b>	国分寺市
-------------	--------	---------------	------

**事業内容・実施時期**

番号	事業内容	延長(m) 箇所数	目標 時期		実施時期												
					短期					長期							
					R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13			
1	歩道の勾配の改善	1か所	継続 検討	実施時期	※検討中												
				備考 進捗状況	※西武多摩湖線跨道橋及び埋設物との位置関係から、勾配の改善にあたっては、技術的検討や関係機関・関係部署との調整を要する。												
2	歩道の有効幅員確保	2か所	継続 検討	実施時期	※検討中												
				備考 進捗状況	※関係機関、関係部署と調整し、実施時期や整備内容を検討する。												
3	安全な歩行空間の整備	未定	継続 検討	実施時期	※検討中												
				備考 進捗状況	※関係機関、関係部署と調整し、実施時期や整備内容を検討する。												
その他				実施時期	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13			
				備考 進捗状況													


**実施済項目**

--

**その他事項**

--

**事業箇所図**

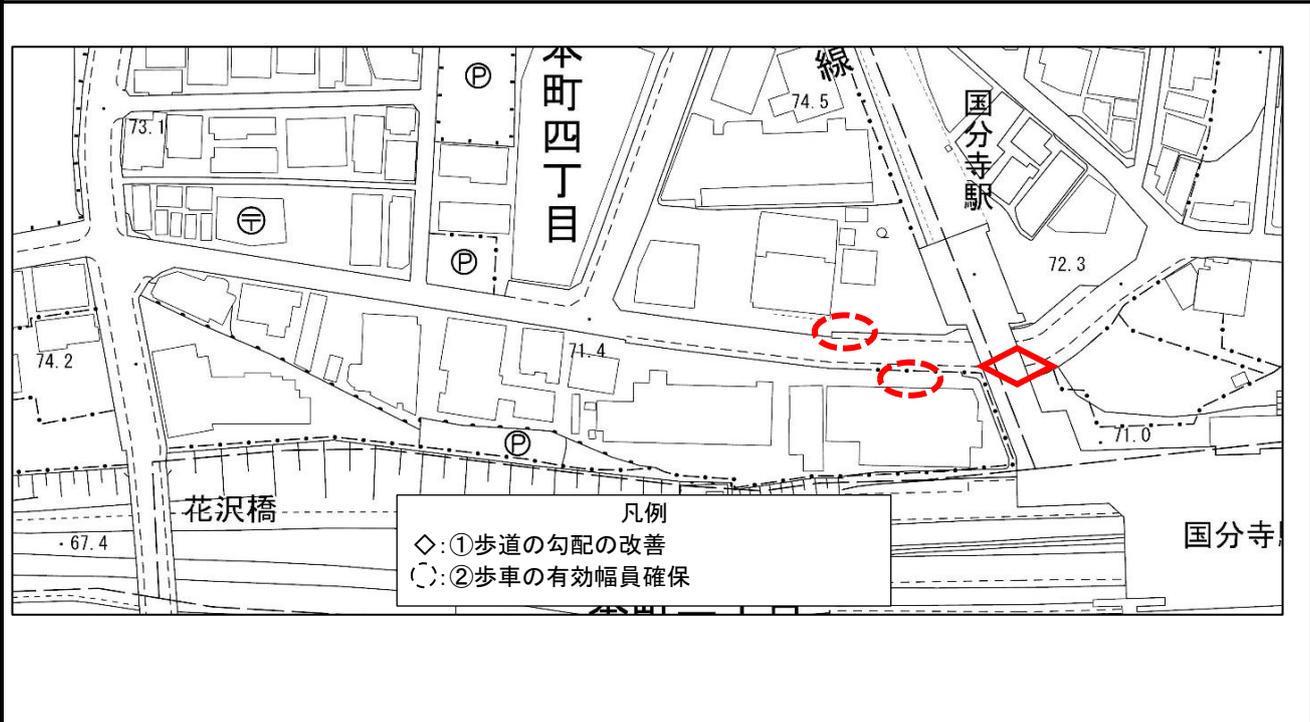

**道路特定事業**

<b>整備対象</b>	市道東3号線	<b>対象事業者名</b>	国分寺市
-------------	--------	---------------	------

**事業内容・実施時期**

番号	事業内容	延長(m) 箇所数	目標 時期		実施時期										
					短期					長期					
					R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	
1	安全な歩行空間の整備	約 70m 5箇所	継続 検討	実施時期											
				備考 進捗状況	・ R5 年度、路面表示を施工。										
2				実施時期											
				備考 進捗状況	・										
3				実施時期											
				備考 進捗状況											
その他				実施時期											
				備考 進捗状況											

**実施済項目**

歩行空間を確保するために、路面上に「ここは歩道です。通行の妨げとなる看板等の物を置かないで下さい」との表示を行った。

**その他事項**

路面表示による効果を鑑みて、今後も安全な歩行空間を創出すべく、対策を検討していく。

**事業箇所図**

**路面表示**

**ここは歩道です**  
通行の妨げとなる看板等の物を置かないで下さい  
国分寺市



**道路特定事業**

<b>整備対象</b>	<b>市道南 307 号線</b>	<b>対象事業者名</b>	<b>国分寺市</b>
-------------	-------------------	---------------	-------------

**事業内容・実施時期**


番号	事業内容	延長(m) 箇所数	目標 時期		実施時期											
					短期						長期					
					R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13		
1	地区計画に合わせた歩行空間の適切な確保	約 260 m	短期	実施時期												
				備考 進捗状況	・新庁舎建設において、既に整備されている歩行空間と連続するよう、担当課と調整のうえ、整備を行った。											
2				実施時期												
				備考 進捗状況												
3				実施時期												
				備考 進捗状況												
その他				実施時期												
				備考 進捗状況												

**実施済項目**

・都立多摩図書館及び都立公文書館については既に整備済であるため、新庁舎の前面道路に沿った箇所についても、国3・4・3号線の歩道まで公開空地（歩行空間）の連続性が確保されるよう整備を行った。

**その他事項**

**事業箇所図**

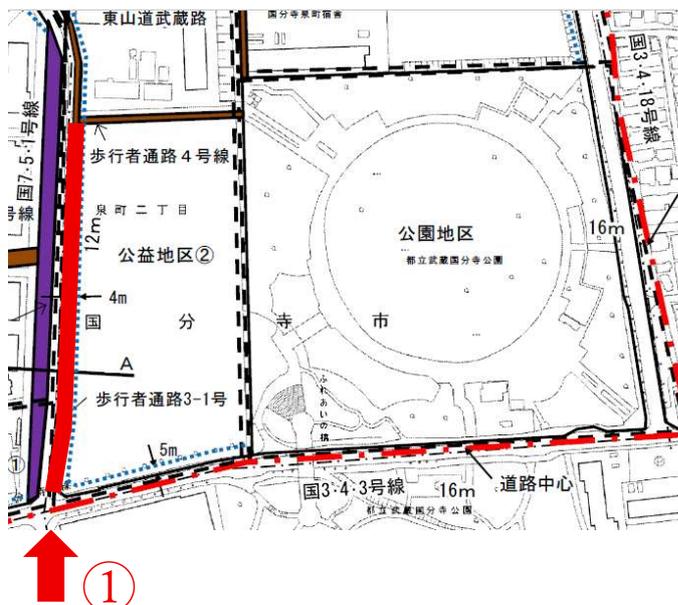

**都市公園特定事業**

<b>整備対象</b>	都立武蔵国分寺公園	<b>対象事業者名</b>	東京都
-------------	-----------	---------------	-----

**事業内容・実施時期**

番号	事業内容	延長(m) 箇所数	目標 時期		実施時期												
					短期						長期						
					R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13			
1	視覚障害者誘導用ブロックの改善	約 600m	長期	実施時期													
				備考 進捗状況	・JIS 規格でない視覚障害者誘導用ブロックの改修を段階的に実施する。												
2	劣化した案内板の改修	未定	済	実施時期													
				備考 進捗状況	・ユニバーサルカラーを採用した案内板へ改修。点字パンフレットの貸し出しや、管理者や利用者による合理的配慮により対応を実施している。												
3	トイレへのオストメイト用設備の設置	未定	継続 検討	実施時期													
				備考 進捗状況	・新たな下水管連結などの整備工事が必要となるため、トイレの改修（築）時に合わせて実施となる（時期未定）。												
4	トイレへのベビーチェアの設置	未定	済	実施時期													
				備考 進捗状況													
5	トイレの音声案内の改善	未定	済	実施時期													
				備考 進捗状況													
6	車いす使用者が利用できる 野外卓の設置	未定	長期	実施時期													
				備考 進捗状況	※検討中 ・野外卓の劣化による更新時に合わせて実施する（現時点で目立った劣化は無いため、時期は未定）。												
その他				実施時期													
				備考 進捗状況													
その他				実施時期													
				備考 進捗状況													


**実施済項目**

- 色覚障がい者の方のために、園内の掲示をユニバーサルカラーデザインに変更した。
- ポールを切断し、車椅子が通れる幅員を確保した。
- トイレへのベビーチェアの設置。  
西トイレ、東トイレ、南トイレの男女個室各 1 基、合計 6 基を設置。
- トイレの音声案内の改善  
西トイレ、東トイレ、南トイレの車椅子使用者用便房内に各 1 基、合計 3 基を設置。

**その他事項**

--

事業箇所図

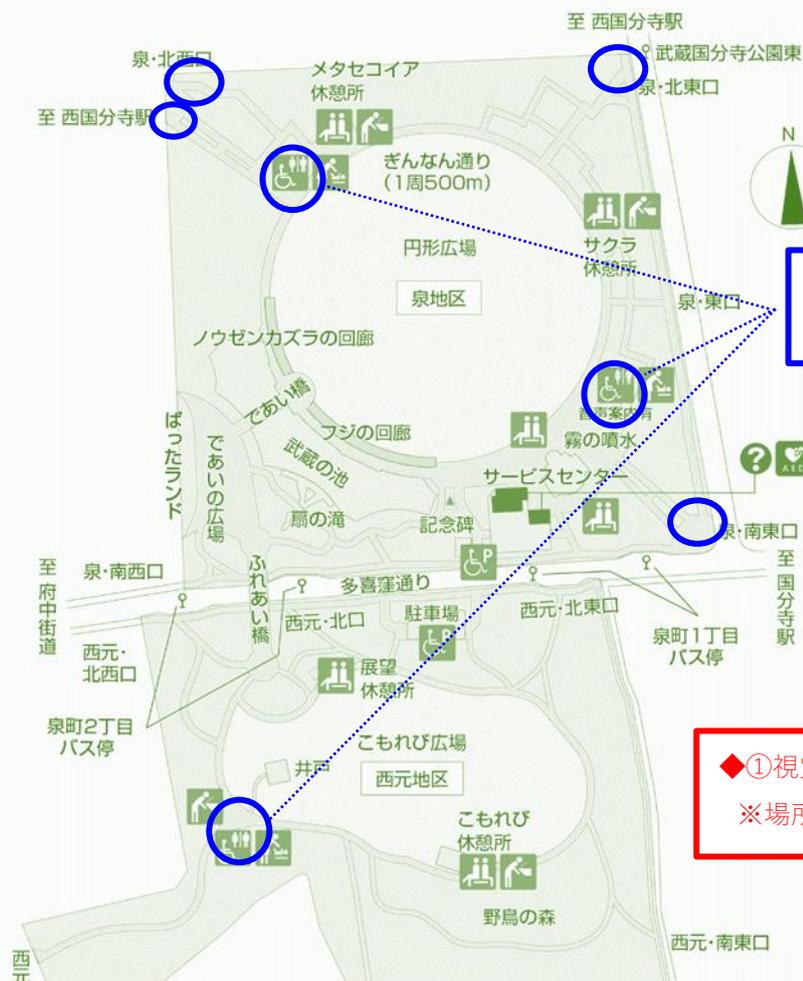

◆④ベビーチェアの設置  
◆⑤音声案内改善

◆①視覚障害者用ブロック  
※場所については検討中

◆②劣化した案内板の改修



◆④ベビーチェアの設置



○：ポール切断  
実施済み箇所

ポール切断 実施済み箇所  
車椅子が通れる幅員の確保

◆⑤音声案内設置



**都市公園特定事業**

<b>整備対象</b>	都立殿ヶ谷戸庭園（開放公園区域）	<b>対象事業者名</b>	東京都
-------------	------------------	---------------	-----

**事業内容・実施時期**

番号	事業内容	延長(m) 箇所数	目標 時期		実施時期									
					短期					長期				
					R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
1	車いす使用者やベビーカー使用者が円滑に出入りできる2つ目の出入口の確保	14.2	短期	実施時期										
				備考 進捗状況	・令和8年度までに、車いす使用者等が出入り可能な2つ目の出入口を確保するため車止めを撤去を検討する。									
2	視覚障害者誘導用ブロックの設置	14.2	短期	実施時期										
				備考 進捗状況	・出入口の確保の検討とあわせて、入口2箇所について、視覚障害者誘導用ブロックを設置を検討する。									
3	園路にある排水溝の蓋を目の細かいものへ交換	6	短期	実施時期										
				備考 進捗状況	・令和7年度、公園南側入り口からの園路上横断側溝蓋（粗目）及び公園内のトイレ出入口前の側溝蓋について交換予定。									
4	トイレへのオストメイト用設備の設置	未定	継続 検討	実施時期										
				備考 進捗状況	※検討中 ・トイレ改修（築）時に合わせて実施する。 （改修時期は現時点で未定）									
5	トイレへのベビージェアの設置	未定	継続 検討	実施時期										
				備考 進捗状況	※検討中 ・トイレ改修（築）時に合わせて実施する。 （改修時期は現時点で未定）									
6	トイレへのベビーベッドの設置	未定	継続 検討	実施時期										
				備考 進捗状況	※検討中 ・トイレ改修（築）時に合わせて実施する。 （改修時期は現時点で未定）									
その他	園路の段差解消		R5年 2月	実施時期										
				備考 進捗状況	実施済み。									
その他				実施時期										
				備考 進捗状況										

**実施済項目**


・平成30年度に、女子便所の段差解消工事を行った。  
 ・令和4年度に、公園各所で園路の段差解消を行った。  
 （側溝と砂地面との間にあった2～3cmの段差を解消するため、該当箇所をアスファルトですりつける舗装を行った。また、植樹付近のインターロッキング舗装について、樹木の根の影響で段差ができていた箇所があったため、それを解消するための補修を行った。）

**その他事項**

・令和5年度に、車いす使用者やベビーカー使用者の2つ目の出入口となる箇所を現地にて検討した。車止め撤去や視覚障害者誘導用ブロックの設置も合わせて検討した。

殿ヶ谷戸庭園

実施済み箇所  
女子便所の段差解消

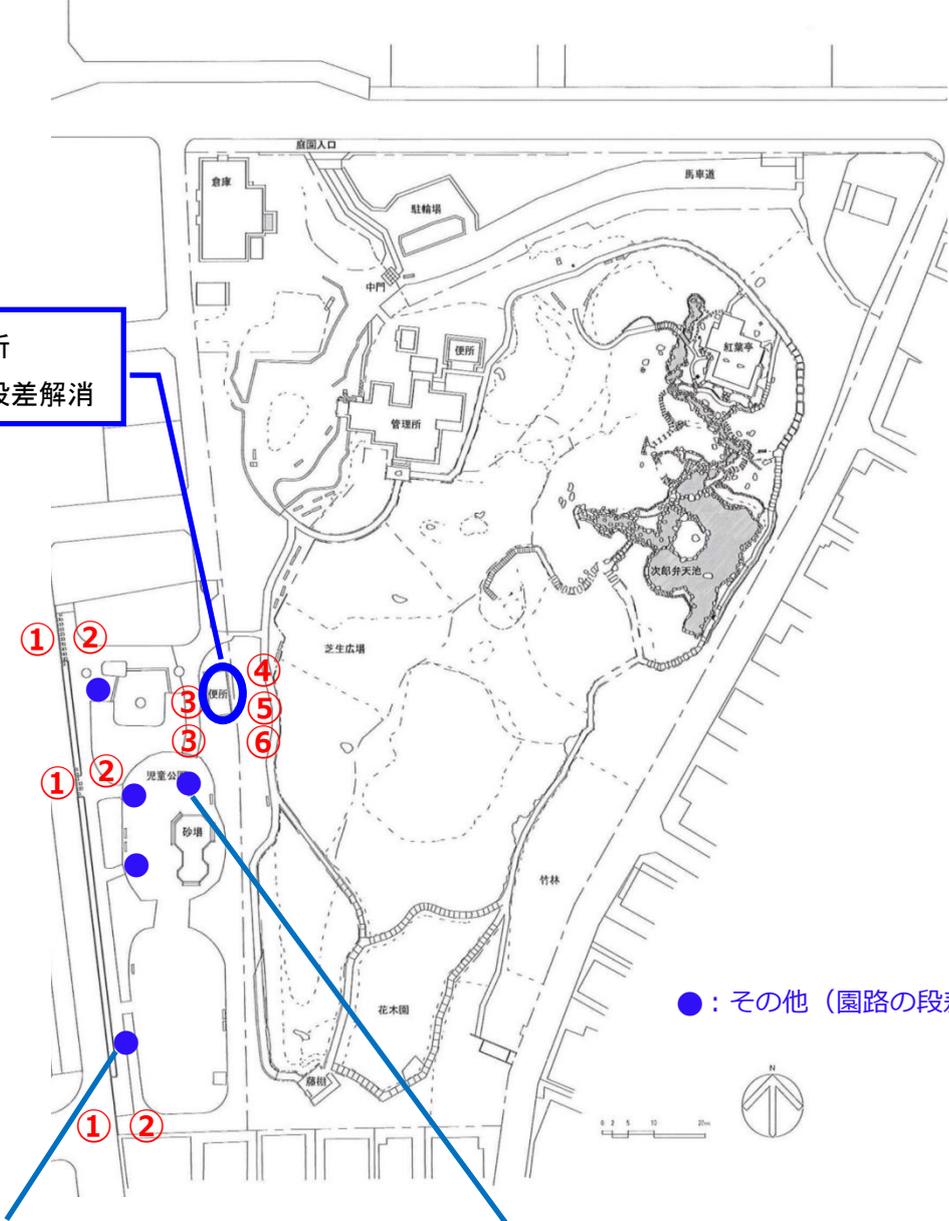

**建築物特定事業**

<b>整備対象</b>	<b>国分寺市案内所</b>	<b>対象事業者名</b>	<b>国分寺市</b>
-------------	----------------	---------------	-------------

**事業内容・実施時期**

番号	事業内容	延長(m) 箇所数	目標 時期		実施時期												
					短期					長期							
					R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13			
1	出入口の有効幅の確保	1か所	短期	実施時期													
				備考 進捗状況													
2	視覚障害者に配慮した出入口までの誘導案内の設置	約4m	短期・ 長期	実施時期													
				備考 進捗状況	管理組合等と調整し、検討する。												
3	筆談ツールの準備とその表示の設置	1か所	短期	実施時期													
				備考 進捗状況	実施済み。												
その他				実施時期													
				備考 進捗状況													

**実施に必要な資金額及び調達方法**

・番号1及び2については、該当箇所に共用部が含まれるため、事業実施に必要な経費等は施設の管理組合と協議の上、決定していく。

**実施済項目**

・番号3については、実施済み。

**その他事項**

**事業箇所図**

**国分寺市案内所**

③ 筆談ツールの準備とその表示の設置

② 出入口まで誘導案内の設置

① 出入口の有効幅の確保

国分寺市案内所

cocobunji WEST

(下り) エスカレーター (上り)

エレベーター

cocobunji WEST

国分寺駅

① 出入口の有効幅の確保

**建築物特定事業**

<b>整備対象</b>	cocobunji プラザ	<b>対象事業者名</b>	国分寺市
-------------	---------------	---------------	------

**事業内容・実施時期**

番号	事業内容	延長(m) 箇所数	目標 時期	実施時期										
				短期					長期					
				実施時期	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
1	筆談対応を示す表示の設置	1か所	短期	実施時期	■									
				備考 進捗状況	実施済み。									
2				実施時期										
				備考 進捗状況										
3				実施時期										
				備考 進捗状況										
その他				実施時期										
				備考 進捗状況										

**実施に必要な資金額及び調達方法**

・実施に必要な経費はなし。


**実施済項目**

・番号1については、実施済み。


**その他事項**

**事業箇所図**

<ミーツ国分寺 5階>

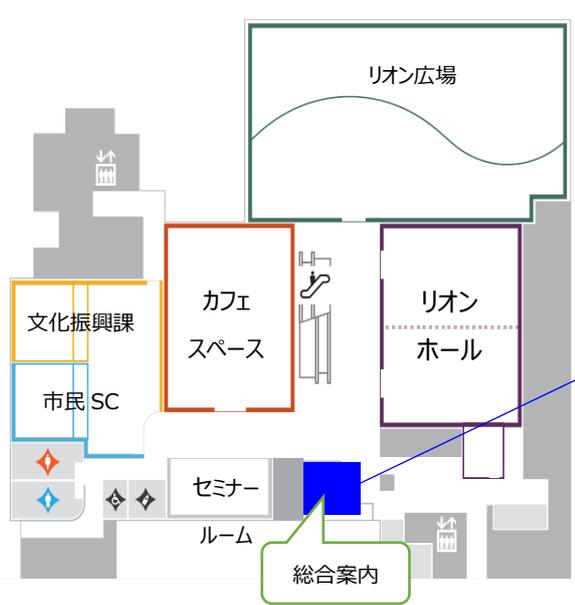

↑①筆談対応を示す表示  
設置箇所実施済み

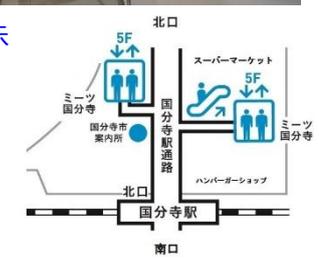

**建築物特定事業**

<b>整備対象</b>	アクティ・ココブンジ	<b>対象事業者名</b>	国分寺市
-------------	------------	---------------	------

**事業内容・実施時期**

番号	事業内容	延長(m) 箇所数	目標 時期		実施時期												
					短期					長期							
					R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13			
1	筆談対応を示す表示の設置	1 か所	短期	実施時期													
				備考 進捗状況	設置済み。												
2				実施時期													
				備考 進捗状況													
3				実施時期													
				備考 進捗状況													
その他				実施時期													
				備考 進捗状況													

**実施に必要な資金額及び調達方法**

・表示の設置に関わる費用は不要。


**実施済項目**

・筆談対応を示す表示及び筆談ツールを設置済み。

**その他事項**

**事業箇所図**

筆談対応を示す表示及び筆談ツールを設置

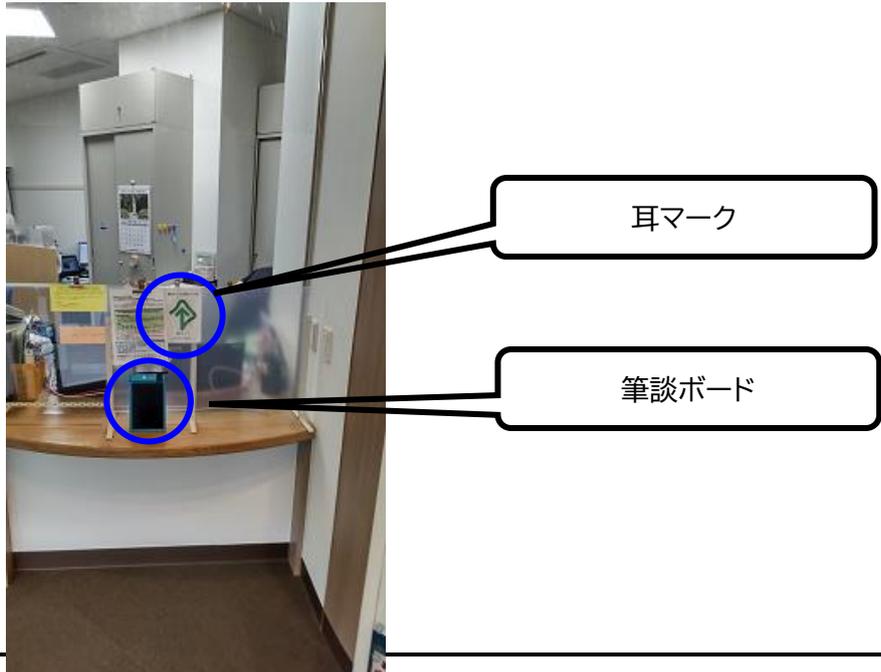

**建築物特定事業**

<b>整備対象</b>	本多公民館	<b>対象事業者名</b>	国分寺市
-------------	-------	---------------	------

**事業内容・実施時期**

番号	事業内容	延長(m) 箇所数	目標 時期		実施時期											
					短期					長期						
					R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13		
1	車いす使用者に対応したカウンター の設置	1 箇所	短期	実施時期												
				備考 進捗状況	・令和5年度設置済み。											
2	トイレへの大型ベッドの設 置	1 箇所	短期	実施時期												
				備考 進捗状況	・令和3年度バリアフリートイレ改修時に設置済み。											
3				実施時期												
				備考 進捗状況												
その他				実施時期												
				備考 進捗状況												

**実施に必要な資金額及び調達方法**

--

**実施済項目**

・車いす使用者に対応したカウンターの設置 ・トイレへの大型ベッドの設置。
--------------------------------------

**その他事項**

・トイレへの大型ベッドの設置にあわせ、トイレの適正利用について利用者への広報を実施する。
--

**事業箇所図**

1階

倉庫  
職員休憩室  
集会展示室  
EV  
ロビー  
正面玄関  
道路

倉庫  
音楽室  
印刷室  
男子トイレ  
女子トイレ  
トイレ  
公民館事務室  
保育室  
会議室C  
通用口

①車いす使用者に  
対応したカウンター  
設置済み

②大型ベッド  
設置済み

←図書館へ

## 建築物特定事業

整備対象	本多図書館	対象事業者名	国分寺市
------	-------	--------	------

### 事業内容・実施時期

番号	事業内容	延長(m) 箇所数	目標 時期	実施時期											
				短期						長期					
				R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13		
1	視覚障害者に配慮した主要な出入口から受付までの誘導案内の設置（視覚障害者誘導用ブロックの付け替え）	1か所	短期	実施時期	■										
				備考 進捗状況	・実施済み。										
2	階段・スロープへの手すりの設置	1か所	継続 検討	実施時期	※検討中										
				備考 進捗状況											
3				実施時期											
				備考 進捗状況											
その他				実施時期											
				備考 進捗状況											

### 実施に必要な資金額及び調達方法


- ・必要な経費等は、事業の具体化にあわせて決定していく。
- ・現状の使用状況を確認しながら、設置可能か等を検討していく。

### 実施済項目


- ・視覚障害者誘導用ブロック付け替え済み。

### その他事項

### 事業箇所図

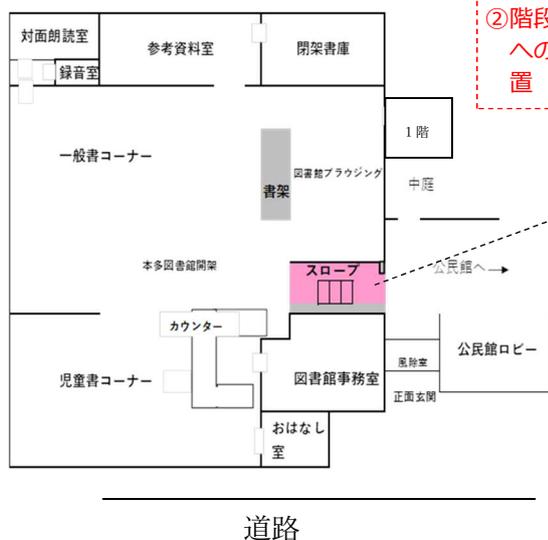

②階段・スロープへの手すりの設置



①視覚障害者誘導用ブロックの付け替え実施済み



**建築物特定事業**

<b>整備対象</b>	<b>本町・南町地域センター</b>	<b>対象事業者名</b>	<b>国分寺市</b>
-------------	--------------------	---------------	-------------

**事業内容・実施時期**

番号	事業内容	延長(m) 箇所数	目標 時期		実施時期									
					短期					長期				
					R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
1	視覚障害者に配慮した道路から出入口までの誘導案内の設置	1 箇所	長期	実施時期										
				備考 進捗状況	・公共施設個別施設計画実施に合わせて設置予定。 ・マンション管理組合の所有地であるため、協議を要する。									
2	筆談ツールの準備とその表示の設置	1 箇所	短期	実施時期										
				備考 進捗状況	・筆談ツール設置済み。									
3	トイレへのオストメイト用設備の設置	1 箇所	短期	実施時期										
				備考 進捗状況	・公共施設個別施設計画実施に合わせて設置予定。									
4	トイレへのベビーチェアの設置	1 箇所	短期	実施時期										
				備考 進捗状況	・公共施設個別施設計画実施に合わせて設置予定。									

**実施に必要な資金額及び調達方法**

・公共施設個別施設計画実施に合わせて適宜実施する。


**実施済項目**

・筆談ツールの設置。

**その他事項**

・番号1については、マンション管理組合の所有地に設置する必要があるため、協議を要する。

**事業箇所図**

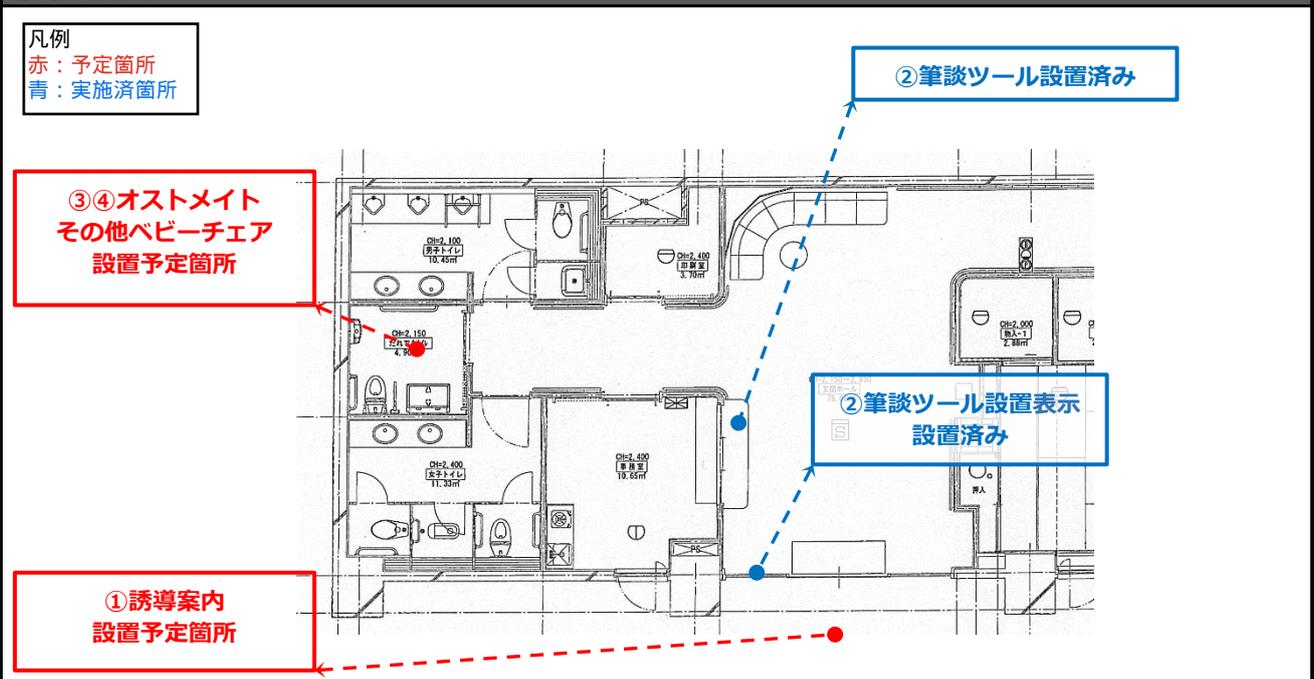

**建築物特定事業**

<b>整備対象</b>	第七小学校	<b>対象事業者名</b>	国分寺市
-------------	-------	---------------	------

**事業内容・実施時期**

番号	事業内容	延長(m) 箇所数	目標 時期		実施時期												
					短期					長期							
					R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13			
1	道路から主要な出入口までの経路の段差解消	1 箇所	短期	実施時期													
				備考 進捗状況	・令和5年度に実施した校舎増築工事において、増築棟までの経路について段差処理対応済み。												
2	排水溝の蓋を目の細かいものへ交換	1 箇所	短期	実施時期													
				備考 進捗状況	・令和5年度に実施した校舎増築工事において、増築棟までの経路上の排水溝の蓋について交換済み。												
3	主要な出入口から受付までの経路の段差解消	未定	継続 検討	実施時期	※検討中												
				備考 進捗状況	・市全体の学校施設に係るバリアフリー化計画や学校施設更新時に対応を検討。												
4	エレベーターの設置	1 箇所	短期	実施時期													
				備考 進捗状況	・令和5年度に実施した校舎増築工事において、増築校舎内に設置済み。												
5	階段上端部への点状ブロックの設置	4 箇所	短期	実施時期													
				備考 進捗状況	・令和5年度に実施した校舎増築工事において、増築校舎内に設置済み。												
6	視覚障害者に配慮した道路から受付までの誘導案内の設置	未定	継続 検討	実施時期	※検討中												
				備考 進捗状況	・市全体の学校施設に係るバリアフリー化計画や学校施設更新時に対応を検討。												
7	筆談ツールの準備	1 箇所	短期	実施時期													
				備考 進捗状況	・実施済み。												
その他	バリアフリースイールの設置	1 箇所	継続 検討	実施時期													
				備考 進捗状況	・令和5年度に実施した校舎増築工事において、増築校舎内に設置済み。												

**実施に必要な資金額及び調達方法**

・事業実施に必要な経費等は、庁内で協議していく。

**実施済項目**

・筆談ツールの設置済み。  
・令和5年度に実施した校舎増築工事において、項目1、2、4、5について対応済み。

**その他事項**

事業箇所図



②排水溝の蓋を目の細かいものへ交換



④エレベーターの設置



⑤階段上端部への点状ブロックの設置



⑦筆談ツールの設置



その他 バリアフリースイールの設置

**建築物特定事業**

<b>整備対象</b>	第二中学校	<b>対象事業者名</b>	国分寺市
-------------	-------	---------------	------

**事業内容・実施時期**

番号	事業内容	延長(m) 箇所数	目標 時期		実施時期									
					短期					長期				
					R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
1	道路から主要な出入口までの経路の段差解消	未定	継続 検討	実施時期	※検討中									
				備考 進捗状況	・市全体の学校施設に係るバリアフリー化計画や学校施設更新時に 対応を検討。									
2	排水溝の蓋を目の細かいものへ交換	未定	短期	実施時期	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
				備考 進捗状況	・修繕実施の緊急度等を勘案し、対応を検討。									
3	視覚障害者に配慮した道路から受付までの誘導案内の設置	未定	継続 検討	実施時期	※検討中									
				備考 進捗状況	・市全体の学校施設に係るバリアフリー化計画や学校施設更新時に 対応を検討。									
4	エレベーターの設置	1か所	継続 検討	実施時期	※検討中									
				備考 進捗状況	・市全体の学校施設に係るバリアフリー化計画や学校施設更新時に 対応を検討。									
5	筆談ツールの準備	1か所	短期	実施時期	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
				備考 進捗状況	・実施済み。									
その他				実施時期	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
				備考 進捗状況										

**実施に必要な資金額及び調達方法**

・事業実施に必要な経費等は、庁内で協議していく。

**実施済項目**

・筆談ツール設置済み

**その他事項**

**事業箇所図**



①道路から主要な出入口までの経路の段差箇所



⑤筆談ツールの設置箇所

**建築物特定事業**

<b>整備対象</b>	第四小学校	<b>対象事業者名</b>	国分寺市
-------------	-------	---------------	------

**事業内容・実施時期**

番号	事業内容	延長(m) 箇所数	目標 時期		実施時期									
					短期					長期				
					R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
1	筆談ツールの準備とその表示の設置	1箇所	短期	実施時期										
				備考 進捗状況	・実施済み。									
2	トイレへのオストメイト用設備の設置	1箇所	長期	実施時期										
				備考 進捗状況	・令和11年度、大規模改造工事の設計において設置検討。									
3	トイレへのベビーチェアの設置	1箇所	長期	実施時期										
				備考 進捗状況	・令和11年度、大規模改造工事の設計において設置検討。									
4	トイレへのベビーベッドの設置	1箇所	長期	実施時期										
				備考 進捗状況	・令和11年度、大規模改造工事の設計において設置検討。									
その他				実施時期										
				備考 進捗状況										

**実施に必要な資金額及び調達方法**

・事業実施に必要な経費等は、庁内で協議していく。

**実施済項目**

- ・道路から主要な出入口までの段差解消済み（スロープあり）。
- ・視覚障害者誘導用ブロック設置済み。
- ・エレベーター設置済み。
- ・筆談ツール及びその表示について、設置済み。

**その他事項**

**事業箇所図**



道路から主要な出入口までの経路の段差解消済み



視覚障害者誘導用ブロック設置済み



筆談ツール及びその表示について、設置済み

**建築物特定事業**

<b>整備対象</b>	<b>本多児童館</b>	<b>対象事業者名</b>	<b>国分寺市</b>
-------------	--------------	---------------	-------------

**事業内容・実施時期**

番号	事業内容	延長(m) 箇所数	目標 時期		実施時期												
					短期						長期						
					R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13			
1	視覚障害者に配慮した道路から出入口までの誘導案内の設置	1ヶ所	継続 検討	実施時期	※検討中												
				備考 進捗状況	・本多児童館長寿命化大規模修繕の具体化にあわせて決定していく。												
2	階段上端部への点状ブロックの設置	1ヶ所	短期	実施時期	※検討中												
				備考 進捗状況	・本多児童館長寿命化大規模修繕の具体化にあわせて決定していく。												
3	筆談対応を示す表示の設置	1ヶ所	短期	実施時期	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13			
				備考 進捗状況	実施済み。												
4	車いす使用者用トイレの改修	1ヶ所	継続 検討	実施時期	※検討中												
				備考 進捗状況	・本多児童館長寿命化大規模修繕の具体化にあわせて決定していく。												
その他				実施時期	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13			
				備考 進捗状況													

**実施に必要な資金額及び調達方法**


・本多児童館長寿命化大規模修繕の具体化にあわせて決定していく。

**実施済項目**

・筆談対応を示す表示の設置。

**その他事項**

**事業箇所図**

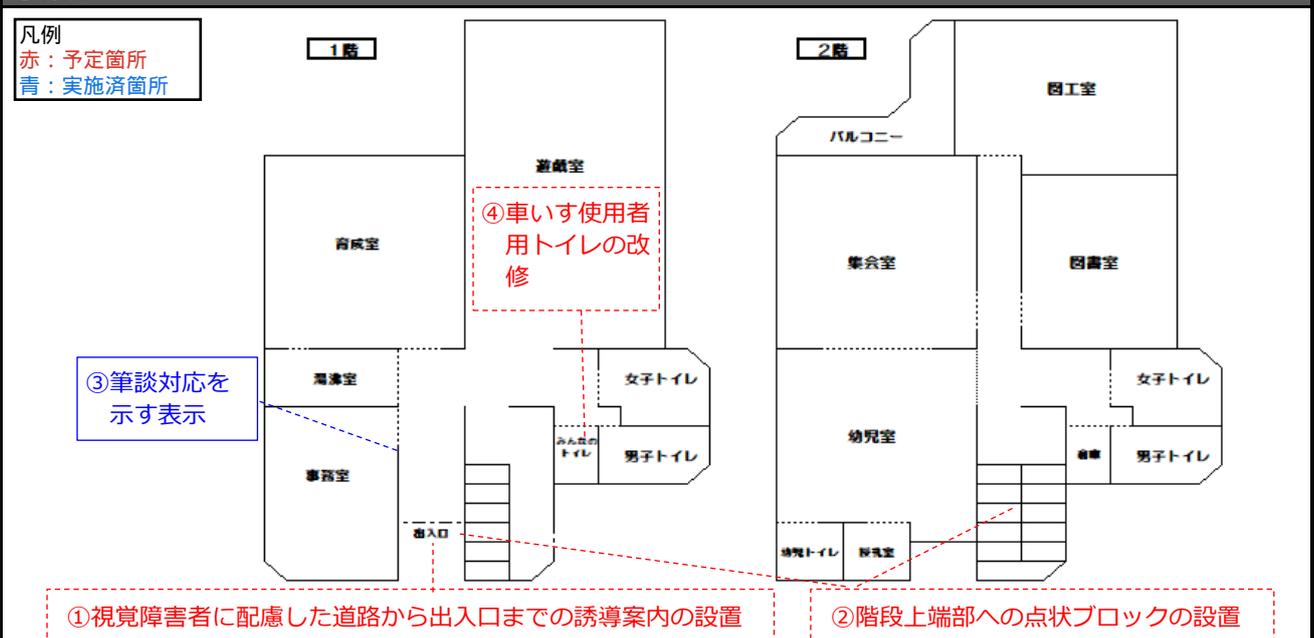

**建築物特定事業**

<b>整備対象</b>	<b>地域包括支援センターほんだ</b>	<b>対象事業者名</b>	<b>国分寺市</b>
-------------	----------------------	---------------	-------------

**事業内容・実施時期**

番号	事業内容	延長(m) 箇所数	目標 時期		実施時期										
					短期					長期					
					R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	
1	視覚障害者に配慮した出入口から受付までの誘導案内の設置	未定	継続 検討	実施時期											
				備考 進捗状況	※検討中 ・関係団体等と調整し検討する。										
2	筆談対応を示す表示の設置	1か所	短期	実施時期											
				備考 進捗状況	・筆談対応を示す表示を窓口カウンターに設置した。										
				実施時期											
				備考 進捗状況											
その他				実施時期											
				備考 進捗状況											

**実施に必要な資金額及び調達方法**

・実施内容を含め、必要な経費等は関係団体等と調整のうえ事業の具体化にあわせて決定していく。

**実施済項目**

・建物入り口部分及び階段の視覚障害者誘導用ブロック設置、車いす対応エレベーター設置（音声案内有り）、建物内の段差解消、車いす使用者用トイレ設置、車いす使用者用駐車場設置、筆談用具設置、筆談対応を示す表示の設置。

**その他事項**

**事業箇所図**

②筆談対応を示す表示の設置箇所



**建築物特定事業**

<b>整備対象</b>	<b>地域生活支援センタープラッツ</b>	<b>対象事業者名</b>	<b>社会福祉法人はらからの家福祉会</b>
-------------	-----------------------	---------------	------------------------

**事業内容・実施時期**

番号	事業内容	延長(m) 箇所数	目標 時期		実施時期												
					短期					長期							
					R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13			
1	道路から出入口までの経路の段差解消	5m	継続 検討	実施時期													
				備考 進捗状況	※検討中												
2	筆談ツールの準備とその表示の設置	1 か所	短期	実施時期													
				備考 進捗状況	・令和4年度内に設置を行った。												
3				実施時期													
				備考 進捗状況													
その他				実施時期													
				備考 進捗状況													

**実施に必要な資金額及び調達方法**

・必要な経費等は事業の具体化にあわせて決定していく。


**実施済項目**

・出入口の幅は確保済、階段に手すりを設置済み。  
・筆談ツールを設置済み。

**その他事項**

・歩道の勾配の改善は、周辺設備等の修繕との調整を行いながら進める。

**事業箇所図**

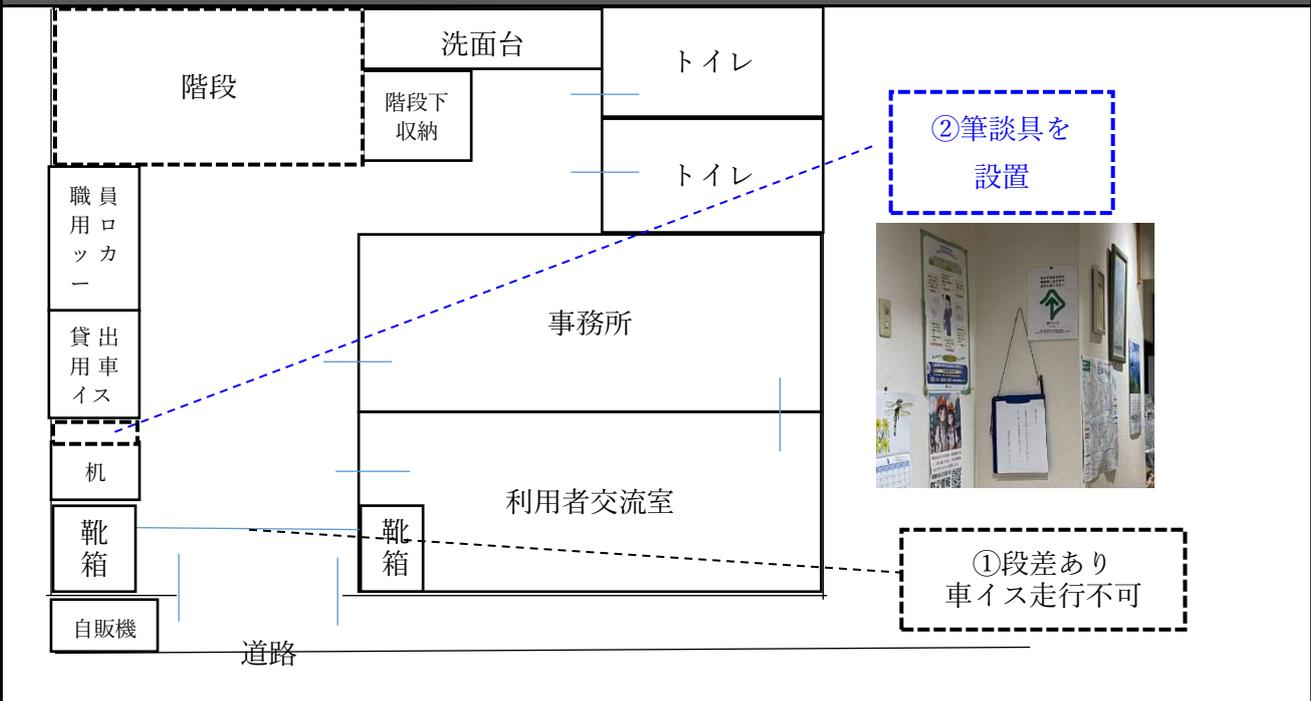

**建築物特定事業**

<b>整備対象</b>	東部拠点地区親子ひろば	<b>対象事業者名</b>	国分寺市
-------------	-------------	---------------	------

**事業内容・実施時期**

番号	事業内容	延長(m) 箇所数	目標 時期		実施時期												
					短期						長期						
					R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13			
1	出入口の有効幅の確保	1 箇所	継続 検討	実施時期	※検討中												
				備考 進捗状況	・施設改修等の機会を捉え、実施を検討（建物所有者との調整が必要）。												
2	視覚障害者に配慮した道路から出入口までの誘導案内の設置	1 箇所	継続 検討	実施時期	※検討中												
				備考 進捗状況	・施設改修等の機会を捉え、実施を検討（建物所有者との調整が必要）。												
3	筆談ツールの準備とその表示の設置	1 箇所	短期	実施時期	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13			
				備考 進捗状況	実施済み。												
その他				実施時期	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13			
				備考 進捗状況													

**実施に必要な資金額及び調達方法**

・番号1および番号2に係る必要な経費等は、事業の状況にあわせて決定予定。

**実施済項目**

令和4年度に、3筆談ツールの準備とその表示の設置を実施済み。  
親子ひろば出入口口に筆談ノートを設置した。また、外から見える位置に、筆談マークを表示した。

**その他事項**

**実施内容**

③筆談ボードを配備するとともに、ひろば出入口付近に筆談マークを表示した。

③筆談マーク表示箇所



**建築物特定事業**

<b>整備対象</b>	国分寺南町診療所	<b>対象事業者名</b>	医療法人社団 福仁会
-------------	----------	---------------	------------

**事業内容・実施時期**

番号	事業内容	延長(m) 箇所数	目標 時期		実施時期												
					短期					長期							
					R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13			
1	道路からの出入口までの経路の 段差解消	1 箇所	継続 検討	実施時期	※継続検討中												
				備考 進捗状況	・大規模な改修を伴うことから時期については引き続き検討する。 整備までの間は人的対応により補完する。												
2	視覚障害者に配慮した道路から 受付までの誘導案内の設置	1 箇所	継続 検討	実施時期	※継続検討中												
				備考 進捗状況	・大規模な改修を伴うことから時期については引き続き検討する。 整備までの間は人的対応により補完する。												
3	車いす使用者に対応したカウ ンターの設置	1 箇所	継続 検討	実施時期	※継続検討中												
				備考 進捗状況	・大規模な改修を伴うことから時期については引き続き検討する。 整備までの間は人的対応により補完する。												
4	筆談ツールの準備とその表示 の設置	1 箇所	短期	実施時期	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13			
				備考 進捗状況	・人的対応している												
5	トイレへのオストメイト用設 備の設置	1 箇所	継続 検討	実施時期	※車いす対応の改装見積もり中												
				備考 進捗状況	・大規模な改修を伴うことから時期については引き続き検討する。 整備までの間は人的対応により補完する。												
6	トイレへのベビーチェアの設 置	1 箇所	継続 検討	実施時期	※検討中												
				備考 進捗状況	・大規模な改修を伴うことから時期については引き続き検討する。 整備までの間は人的対応により補完する。												
7	トイレへのベビーベッドの設 置	1 箇所	継続 検討	実施時期	※検討中												
				備考 進捗状況	・大規模な改修を伴うことから時期については引き続き検討する。 整備までの間は人的対応により補完する。												
8	階段上端部への点状ブロック の設置	1 箇所	継続 検討	実施時期	※検討中												
				備考 進捗状況	・整備までの間は人的対応により補完する。												
そ の 他				実施時期	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13			
				備考 進捗状況													

**実施に必要な資金額及び調達方法**

--

**実施済項目**

--

**その他事項**

--

事業箇所図

④筆談ツールの準備とその表示の設置予定箇所



**建築物特定事業**

<b>整備対象</b>	セレオ国分寺	<b>対象事業者名</b>	株式会社 JR 中央線コミュニティデザイン
-------------	--------	---------------	-----------------------

**事業内容・実施時期**

番号	事業内容	延長(m) 箇所数	目標 時期		実施時期										
					短期					長期					
					R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	
1	視覚障害者に配慮した誘導案内の設置	2~4 か所	継続 検討	実施時期	※検討中										
				備考 進捗状況	<ul style="list-style-type: none"> <li>将来的な大規模改修工事などに合わせ、誘導ブロックを設置する場合の誘導先や、音声案内については今後検討していきます。</li> <li>セレオ国分寺に面した駅コンコースの床は、一部を除き JR 様の財産である為、誘導用ブロック等を設置する場合は別途協議が必要となります。</li> <li>西側エリアは貸付範囲となり床仕上が丸井様財産である為、別途協議が必要となります。</li> </ul>										
2	階段上端部への点状ブロックの設置	2か所	継続 検討	実施時期	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	
				備考 進捗状況	※検討中										
3				実施時期	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	
				備考 進捗状況	・										
その他				実施時期	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	
				備考 進捗状況	・										

**実施に必要な資金額及び調達方法**

・実施に必要な経費等は、社内において協議及び調整を行いながら進める。


**実施済項目**

- ・バリアフリートイレ、8F オスメトイレ、介助用ベットの設置。
- ・ベビーシート、ベビーチェア、授乳室の設置。
- ・貸出用ベビーカーの設置。
- ・子供用トイレの設置。
- ・社員のサービス介助士取得。
- ・手話でのあいさつを社員が勉強。

**その他事項**

・視覚障害者誘導用ブロックの設置は周辺施設・設備所有者との調整を行いながら進める。


事業箇所図

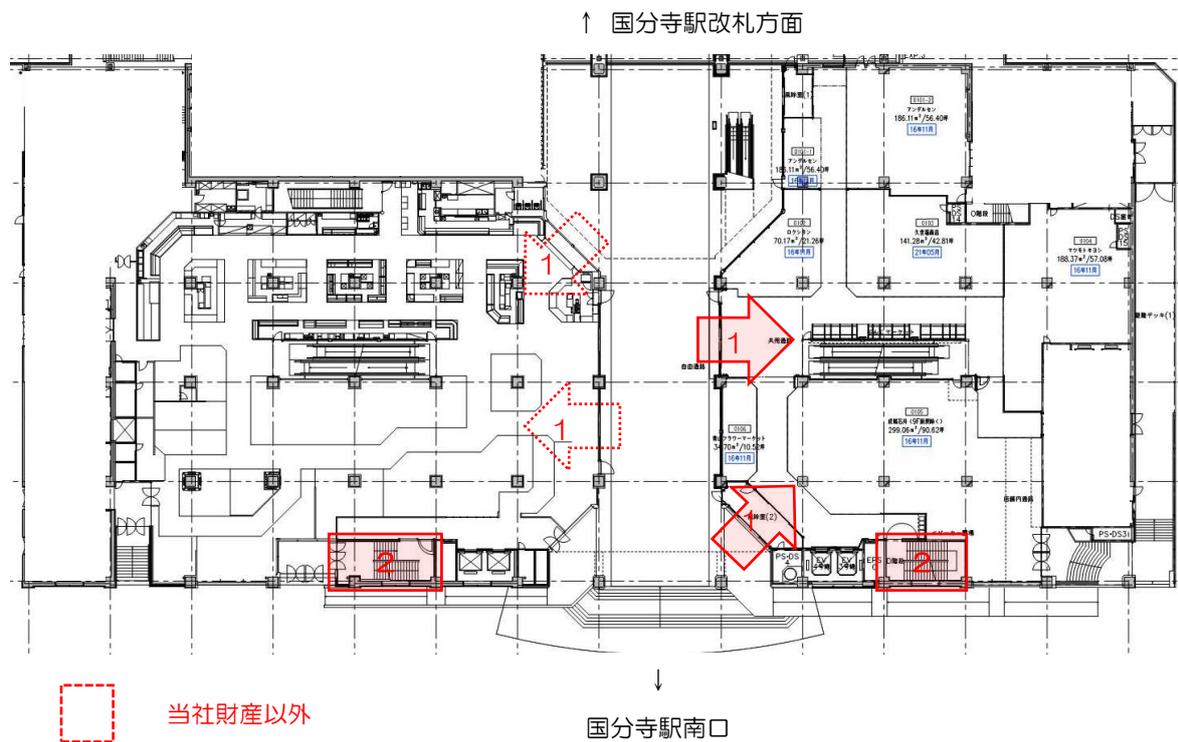

① 視覚障害者誘導用ブロックの設置位置の例



② 点状ブロック設置の設置位置の例

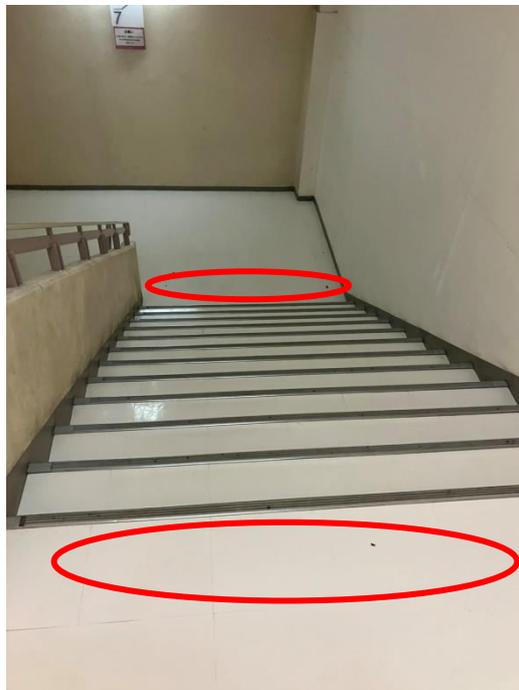

**建築物特定事業**

<b>整備対象</b>	西友国分寺店	<b>対象事業者名</b>	株式会社西友
-------------	--------	---------------	--------

**事業内容・実施時期**

番号	事業内容	延長(m) 箇所数	目標 時期		実施時期										
					短期					長期					
					R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	
1	視覚障害者に配慮した道路からサービスカウンターまでの誘導案内の設置	未定	継続 検討	実施時期	※検討中										
				備考 進捗状況	・社内本部や関係者と調整し、実施時期を調整していく。										
2	車いす使用者に対応したカウンターの設置	未定	継続 検討	実施時期	※検討中										
				備考 進捗状況	・社内本部や関係者と調整し、実施時期を調整していく。										
3	筆談ツールの準備とその表示の設置	1箇所	短期	実施時期	※検討中										
				備考 進捗状況	・社内本部や関係者と調整し、実施時期を調整していく。										
4	階段上端部への点状ブロックの設置	未定	継続 検討	実施時期	※検討中										
				備考 進捗状況	・社内本部や関係者と調整し、実施時期を調整していく。										
5	車いす使用者用トイレの設置	未定	継続 検討	実施時期	※検討中										
				備考 進捗状況	・社内本部や関係者と調整し、実施時期を調整していく。										
6	トイレへのオストメイト用設備の設置	未定	継続 検討	実施時期	※検討中										
				備考 進捗状況	・社内本部や関係者と調整し、実施時期を調整していく。										
7	トイレへのベビーベッドの設置	未定	継続 検討	実施時期	※検討中										
				備考 進捗状況	・3階女子トイレに設置済み。その他については、社内本部や関係者と調整し、実施時期を調整していく。										
その他				実施時期	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	
				備考 進捗状況											

**実施に必要な資金額及び調達方法**

・事業実施に必要な経費等は、社内において協議をしていく。

**実施済項目**

- ・主要な出入口や店内通路の幅は確保されている。
- ・施設全体を案内する案内板設置済み。

**その他事項**

--

事業箇所図

③サービスカウンターにホワイトボードを常時用意予定



⑦トイレへのベビーベッド設置済み



**建築物特定事業**

<b>整備対象</b>	<b>みずほ銀行国分寺支店</b>	<b>対象事業者名</b>	<b>株式会社みずほ銀行</b>
-------------	-------------------	---------------	------------------

**事業内容・実施時期**

番号	事業内容	延長(m) 箇所数	目標 時期		実施時期												
					短期					長期							
					R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13			
1	階段上端部への点状ブロックの設置	2か所	短期	実施時期													
				備考 進捗状況	・設置済み。												
2				実施時期													
				備考 進捗状況													
3				実施時期													
				備考 進捗状況													
その他				実施時期													
				備考 進捗状況													

**実施に必要な資金額及び調達方法**


・事業実施に必要な経費は社内経費で完了。

**実施済項目**

・支店入店口にスロープの設置 ・営業フロアへのエレベータ設置。  
・支店入口から営業フロアへの階段に点状ブロック設置。

**その他事項**

**事業箇所図**

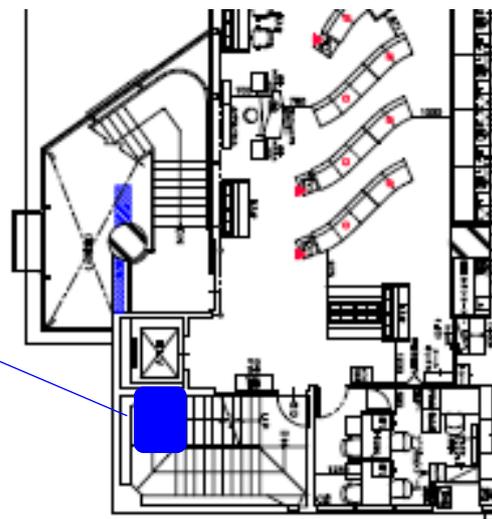

①階段上端部への点状ブロック設置済み

**建築物特定事業**

<b>整備対象</b>	多摩信用金庫 国分寺支店	<b>対象事業者名</b>	多摩信用金庫
-------------	--------------	---------------	--------

**事業内容・実施時期**

番号	事業内容	延長(m) 箇所数	目標 時期		実施時期										
					短期						長期				
					R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	
1	視覚障害者に配慮した道路から受付案内までの誘導案内の実施	1か所	継続 検討	実施時期	※検討中										
				備考 進捗状況											
2				実施時期	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	
				備考 進捗状況											
3				実施時期	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	
				備考 進捗状況											
その他				実施時期	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	
				備考 進捗状況											

**実施に必要な資金額及び調達方法**

--

**実施済項目**

--

**その他事項**

出入口から受付（ロビーフロア）のフロアにロビー担当者を配置しています。ATMの操作方法や受付までのご案内等を行っており、障がい者も安心してご利用いただけるよう、配慮しております。

**事業箇所図**

①視覚障害者に配慮した誘導案内の設置予定箇所



**建築物特定事業**

<b>整備対象</b>	多摩信用金庫 国分寺南口支店	<b>対象事業者名</b>	多摩信用金庫
-------------	----------------	---------------	--------

**事業内容・実施時期**

番号	事業内容	延長(m) 箇所数	目標 時期		実施時期									
					短期					長期				
					R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
1	視覚障害者に配慮した道路から受付までの誘導案内の設置	未定	継続 検討	実施時期	※検討中									
				備考 進捗状況	・検討中。									
2				実施時期	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
				備考 進捗状況										
3				実施時期	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
				備考 進捗状況										
その他				実施時期	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
				備考 進捗状況										

**実施に必要な資金額及び調達方法**

--

**実施済項目**

--

**その他事項**

出入口から受付（ロビーフロア）のフロアにロビー担当者を配置しています。ATMの操作方法や受付までのご案内等を行っており、障がい者も安心してご利用いただけるよう、配慮しております。

**事業箇所図**



**建築物特定事業**

<b>整備対象</b>	<b>国分寺本町郵便局</b>	<b>対象事業者名</b>	<b>日本郵便株式会社</b>
-------------	-----------------	---------------	-----------------

**事業内容・実施時期**

番号	事業内容	延長(m) 箇所数	目標 時期		実施時期										
					短期					長期					
					R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	
1	道路から出入口までの経路の 段差解消	1か所	継続 検討	実施時期	※検討中										
				備考 進捗状況	・関係各所と早期実現に向けて鋭意調整中。										
2	筆談ツールの準備とその表 示の設置	2台	短期	実施時期	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	
				備考 進捗状況	・令和4年4月、準備完了。										
3				実施時期	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	
				備考 進捗状況											
その他				実施時期	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	
				備考 進捗状況											

**実施に必要な資金額及び調達方法**

--

**実施済項目**

・自動ドアの設置。点字ブロックの設置。窓口ローカウンター設置。段差解消の為、簡易スロープ設置。
---

**その他事項**


--

**事業箇所図**

**②筆談表示設置済み**



**窓口ローカウンター設置**

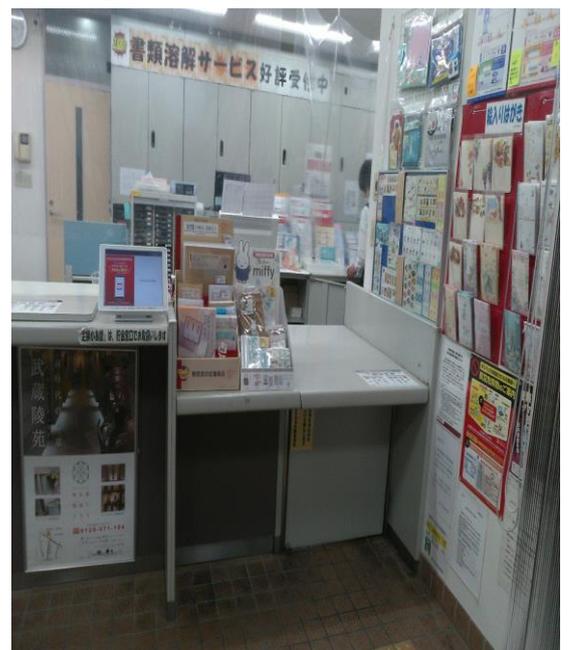

**建築物特定事業**

<b>整備対象</b>	国分寺南郵便局	<b>対象事業者名</b>	日本郵便株式会社
-------------	---------	---------------	----------

**事業内容・実施時期**

番号	事業内容	延長(m) 箇所数	目標 時期		実施時期									
					短期					長期				
					R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
1	視覚障害者に配慮した道路から受付までの誘導案内の設置	1 箇所	継続 検討	実施時期	※ 検討中									
				備考 進捗状況	関係各所と早期実現に向けて鋭意調整中。									
2	出入口の有効幅の確保	1 箇所	継続 検討	実施時期	※ 検討中									
				備考 進捗状況	関係各所と早期実現に向けて鋭意調整中。									
3	車いすの使用者に対応したカウンターの設置	1 箇所	継続 検討	実施時期	※ 検討中									
				備考 進捗状況	関係各所と早期実現に向けて鋭意調整中。									
4	筆談ツールの準備とその表示の設置	1 箇所	短期	実施時期	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
				備考 進捗状況	実施済み。									
5	階段上端部への点状ブロックの設置	1 箇所	継続 検討	実施時期	※ 検討中									
				備考 進捗状況	関係各所と早期実現に向けて鋭意調整中。									
その他				実施時期	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
				備考 進捗状況										

**実施に必要な資金額及び調達方法**

- ・事業実施に必要な経費等は、社内において協議をしていく。

**実施済項目**

- ・筆談ツールとその表示の設置済み。

**その他事項**

--

## 事業箇所図


②出入口の有効幅の確保



④筆談ツールとその表示の設置  
済み




⑤階段上端部への点状ブロック  
の設置

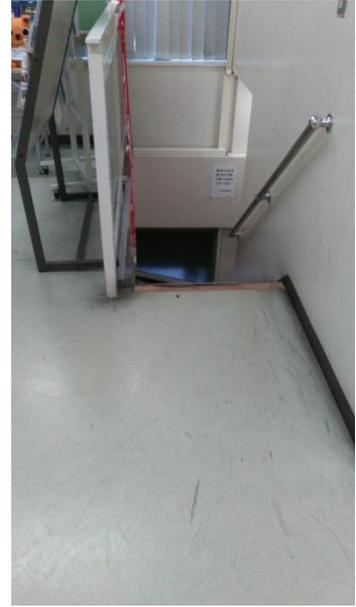

建築物特定事業														
整備対象		J R東日本ホテルメッツ国分寺			対象事業者名		株式会社 J R中央線コミュニティデザイン 日本ホテル株式会社							
事業内容・実施時期														
番号	事業内容	延長(m) 箇所数	目標 時期		実施時期									
					短期					長期				
					R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
1	視覚障害者に配慮した道路から受付までの誘導案内の設置	未定	継続 検討	実施時期	※検討中									
				備考 進捗状況	※権利者等と調整し、検討する。									
2	階段上端部への点状ブロックの設置	未定	継続 検討	実施時期	※検討中									
				備考 進捗状況	※権利者等と調整し、検討する。									
3	車いす使用者に対応したカウンターの設置	1	継続 検討	実施時期	※検討中									
				備考 進捗状況	※改修のタイミングに合わせて、検討する。									
4	筆談対応を示す表示の設置	1	短期	実施時期	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
				備考 進捗状況	・案内表示を掲示。iPad 筆談アプリで対応。									
5	車いす使用者用トイレの設置	1	継続 検討	実施時期	※検討中									
				備考 進捗状況	※改修のタイミングに合わせて、検討する。									
6	トイレへのオストメイト用設備の設置	1	継続 検討	実施時期	※検討中									
				備考 進捗状況	※改修のタイミングに合わせて、検討する。									
7	トイレへのベビーチェアの設置	1	継続 検討	実施時期	※検討中									
				備考 進捗状況	※改修のタイミングに合わせて、検討する。									
8	トイレへのベビーベッドの設置	1	継続 検討	実施時期	※検討中									
				備考 進捗状況	※改修のタイミングに合わせて、検討する。									
その他				実施時期	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
				備考 進捗状況										
実施に必要な資金額及び調達方法														
・事業実施時に検討する。														
実施済項目														
・筆談対応を示す表示の設置。														
その他事項														

④筆談表示設置箇所設置済み

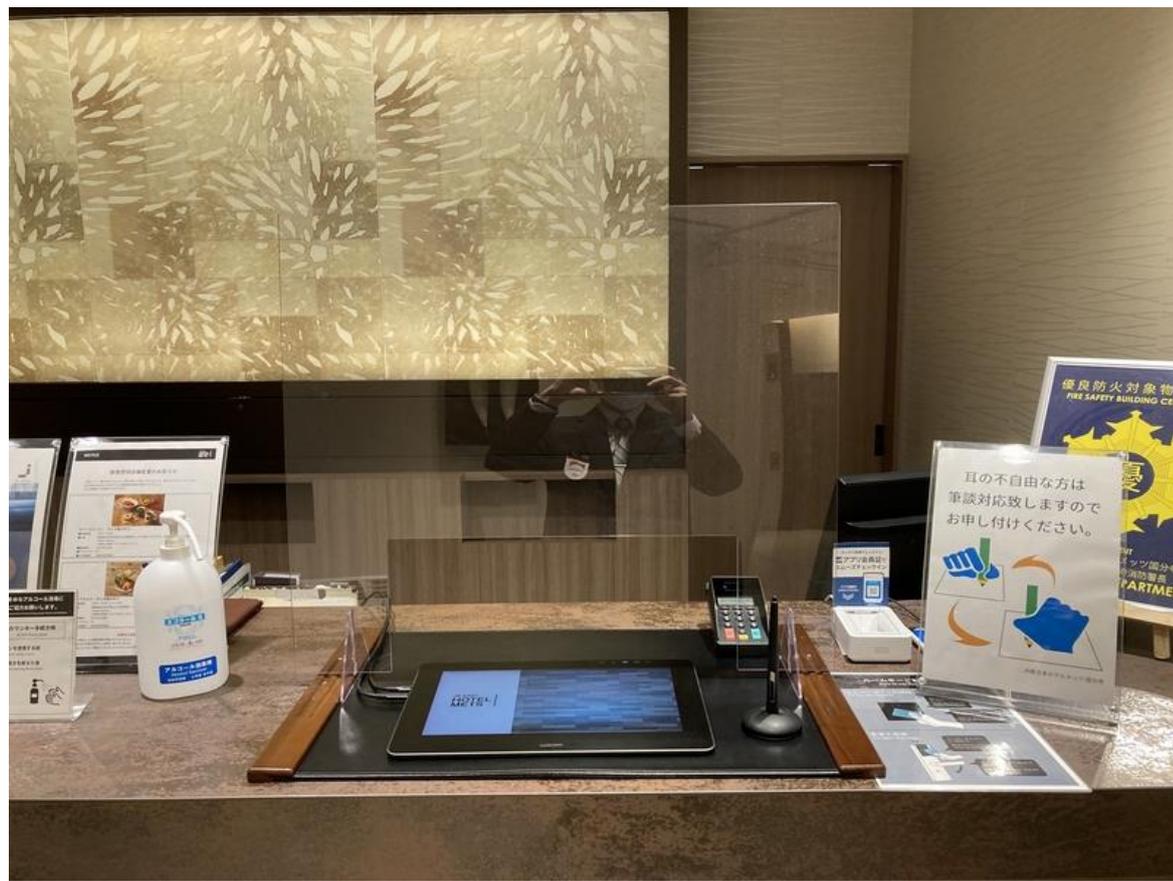

**交通安全特定事業**

<b>事業対象</b>	<b>生活関連経路</b>	<b>対象事業者名</b>	<b>東京都公安委員会</b>
-------------	---------------	---------------	-----------------

**事業内容・実施時期**

番号	事業内容	延長(m) 箇所数	目標 時期		実施時期												
					短期					長期							
					R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13			
1	バリアフリー対応型信号機（音響式、経過時間表示付き等）の整備	未定	短期・長期	実施時期													
				備考 進捗状況	・順次実施予定（整備済み箇所所有、実施済み項目欄及び実施内容欄参照）。												
2	エスコートゾーンの整備	未定	短期・長期	実施時期													
				備考 進捗状況	・順次実施予定。												
3	道路標識及び道路標示の高輝度化	未定	短期・長期	実施時期													
				備考 進捗状況	・適切な補修等を継続的に実施（高輝度化は実施済）。												
4	違法駐車車両の指導取締り等	—	短期・長期	実施時期													
				備考 進捗状況	・継続的に実施。												
その他	「交通安全特定事業計画国分寺駅周辺地区」を策定	—	短期	実施時期													
				備考 進捗状況	「交通安全特定事業を実施する道路の区間」や「特定事業の実施に際し配慮すべき重要事項」等、より詳細な特定事業計画を策定した。												

**実施済項目**

- ・別紙1-③（南町二丁目交差点）のバリアフリー対応型信号機について、実施済み箇所所有。
- ・別紙1バリアフリー対応型信号機の設置予定箇所図の3箇所について、バリアフリー対応型信号機の設置済み。



**その他事項**


**実施内容、写真、参考資料等**

※実施内容は別紙に示す。


別紙

1. バリアフリー対応型信号機（音響式、経過時間表示付き等）の整備


バリアフリー対応型信号機の設置予定箇所図

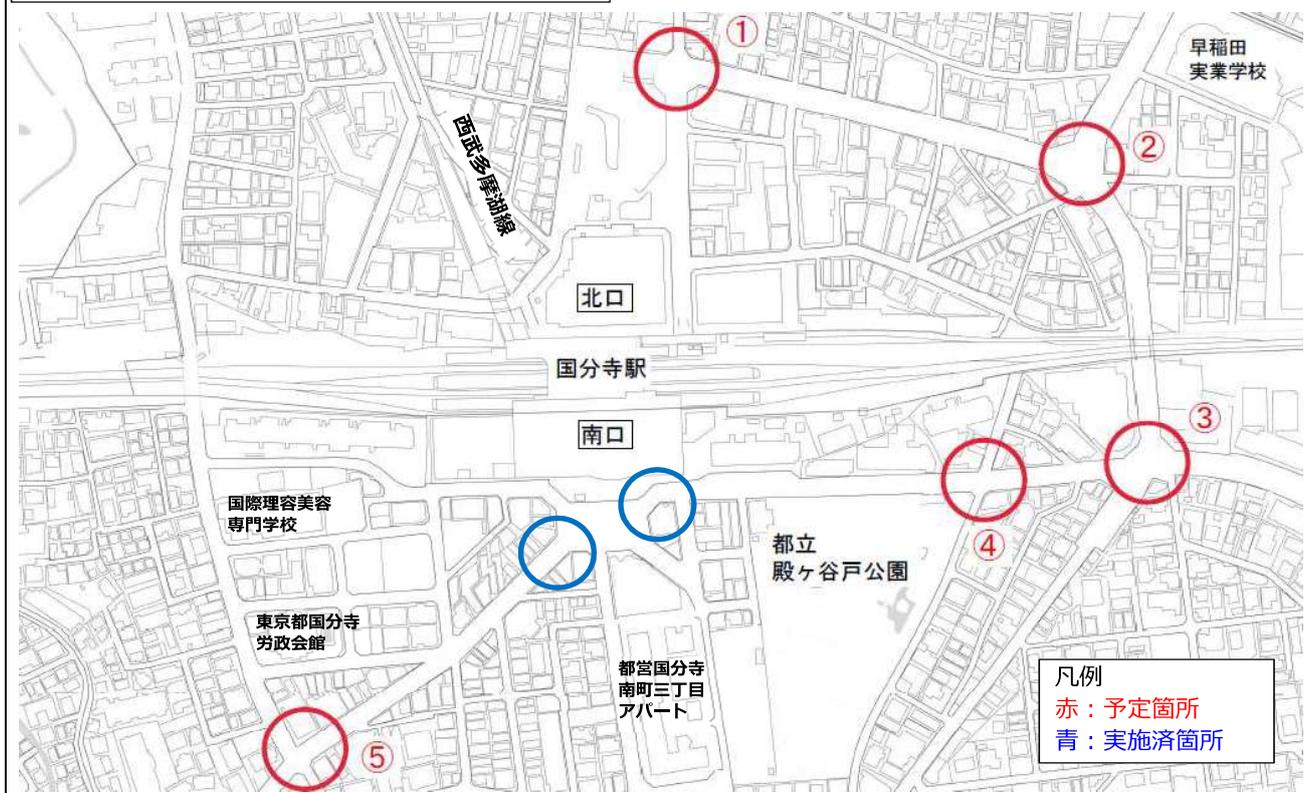


①本町二丁目交差点

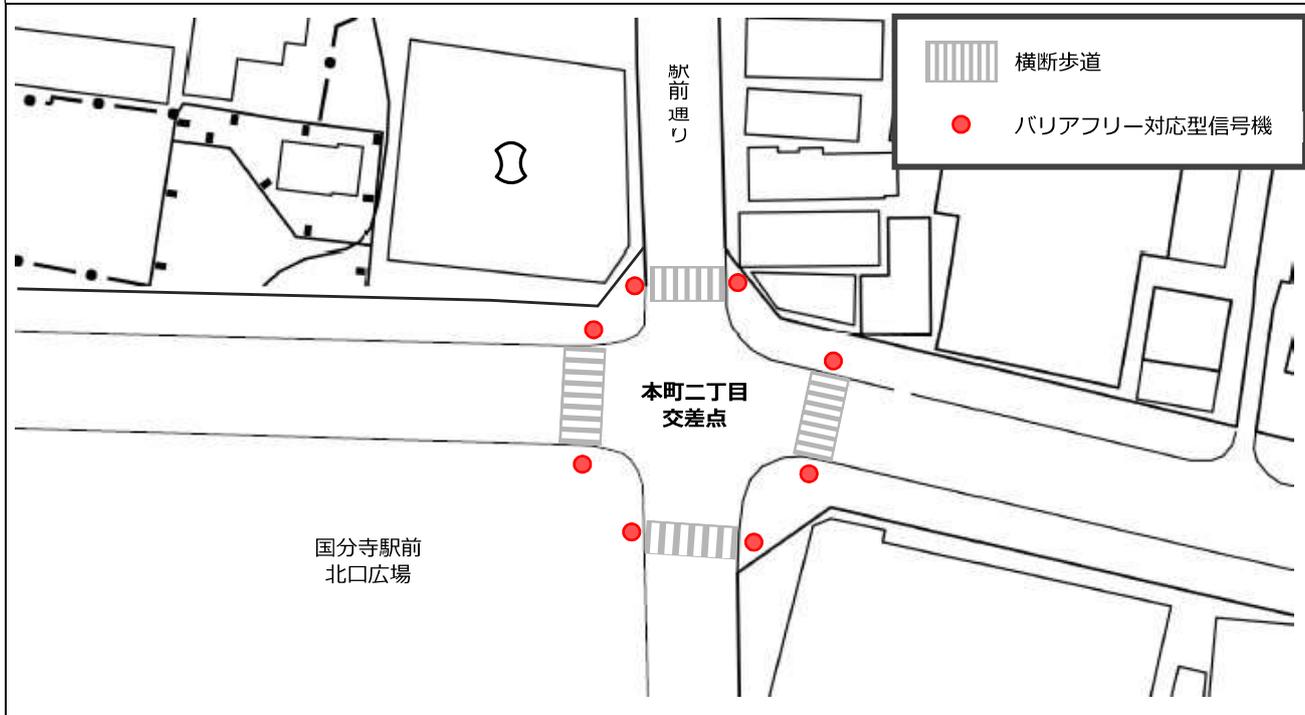


②国分寺本町一丁目交差点

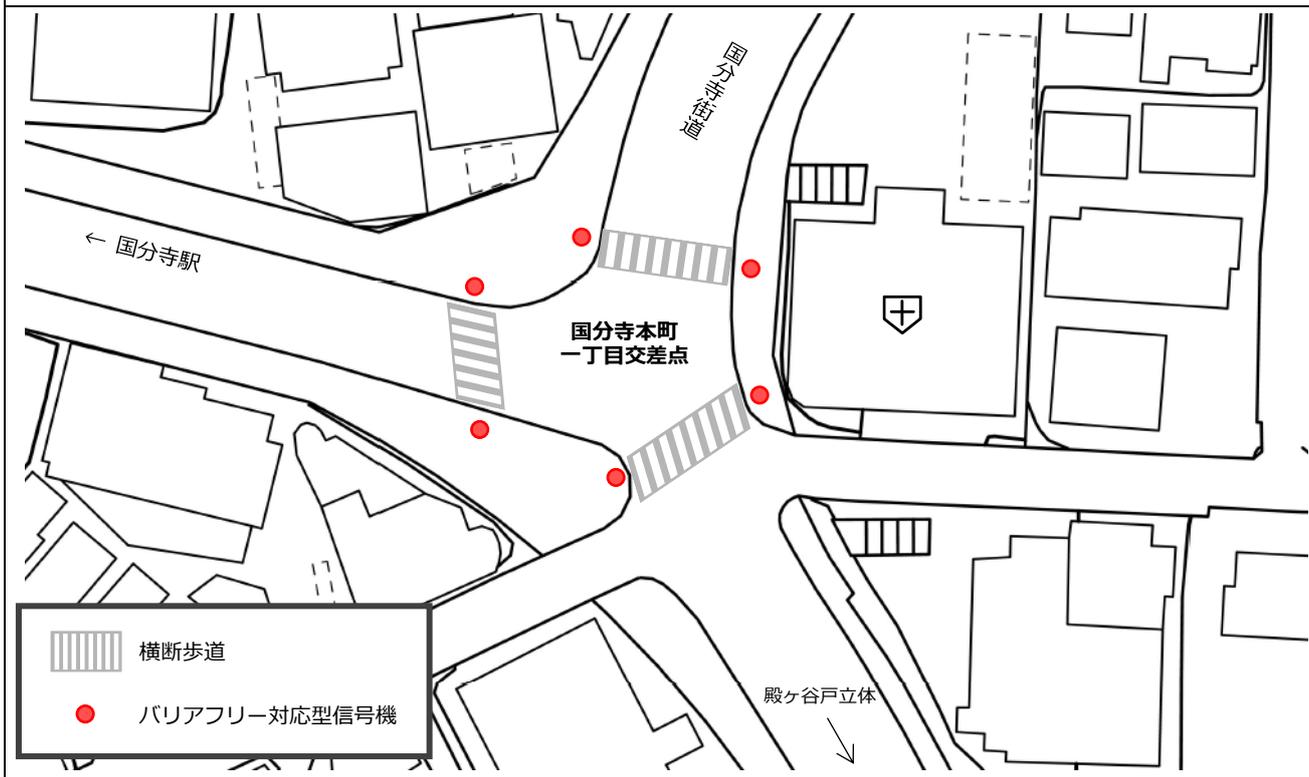


③南町二丁目交差点

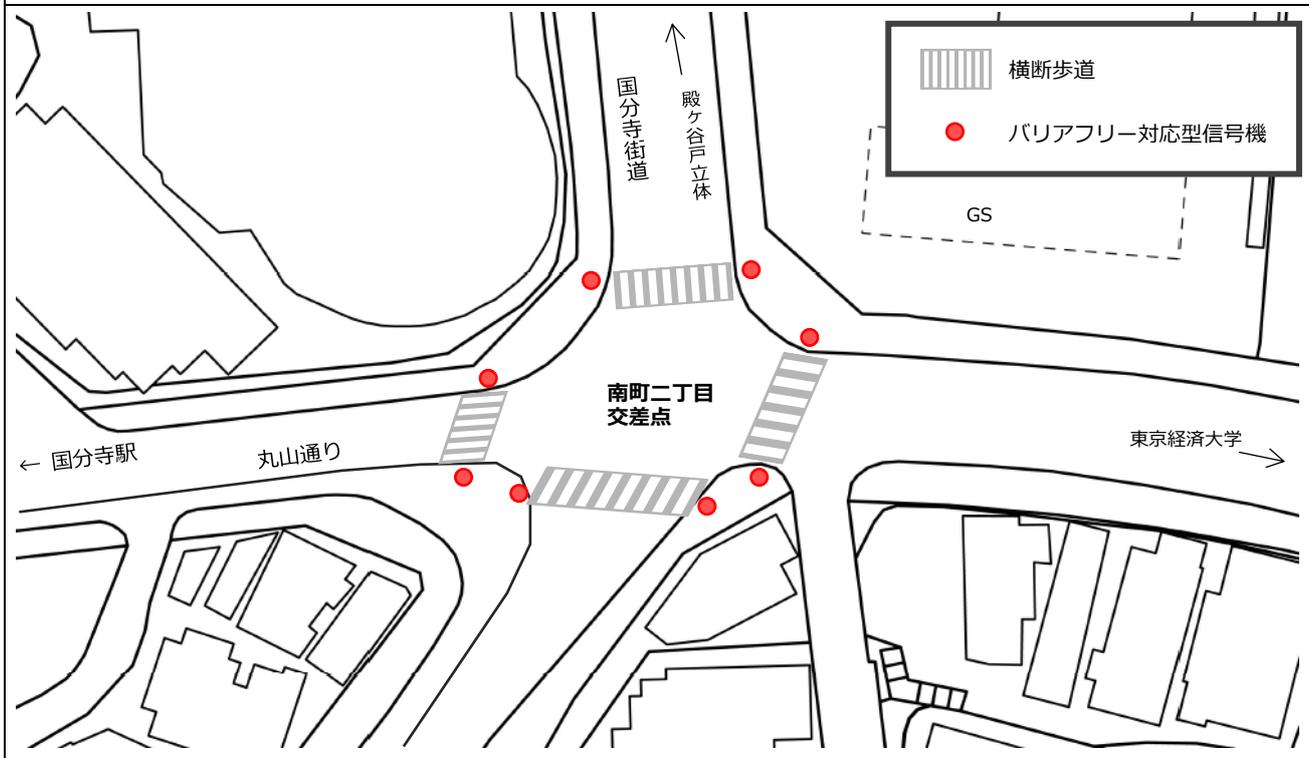

④丸山通り

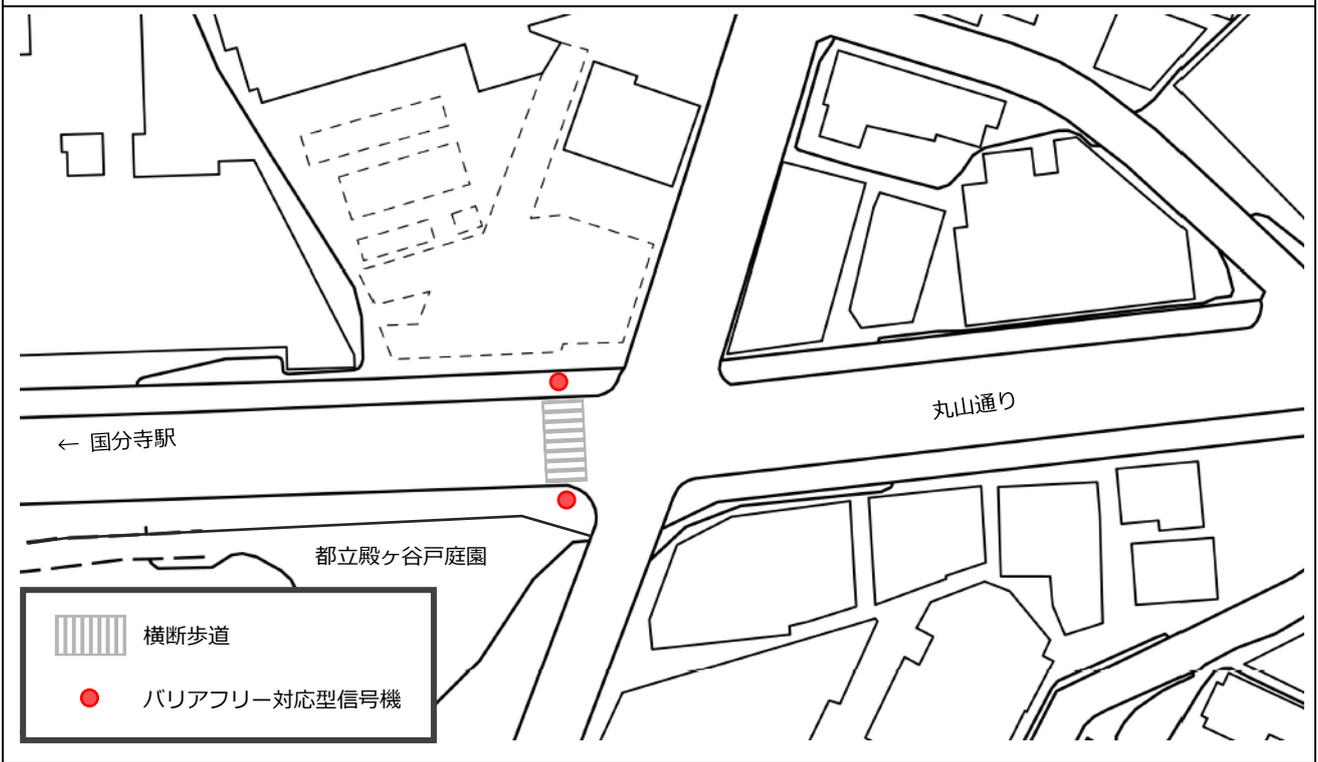

⑤南町三丁目交差点

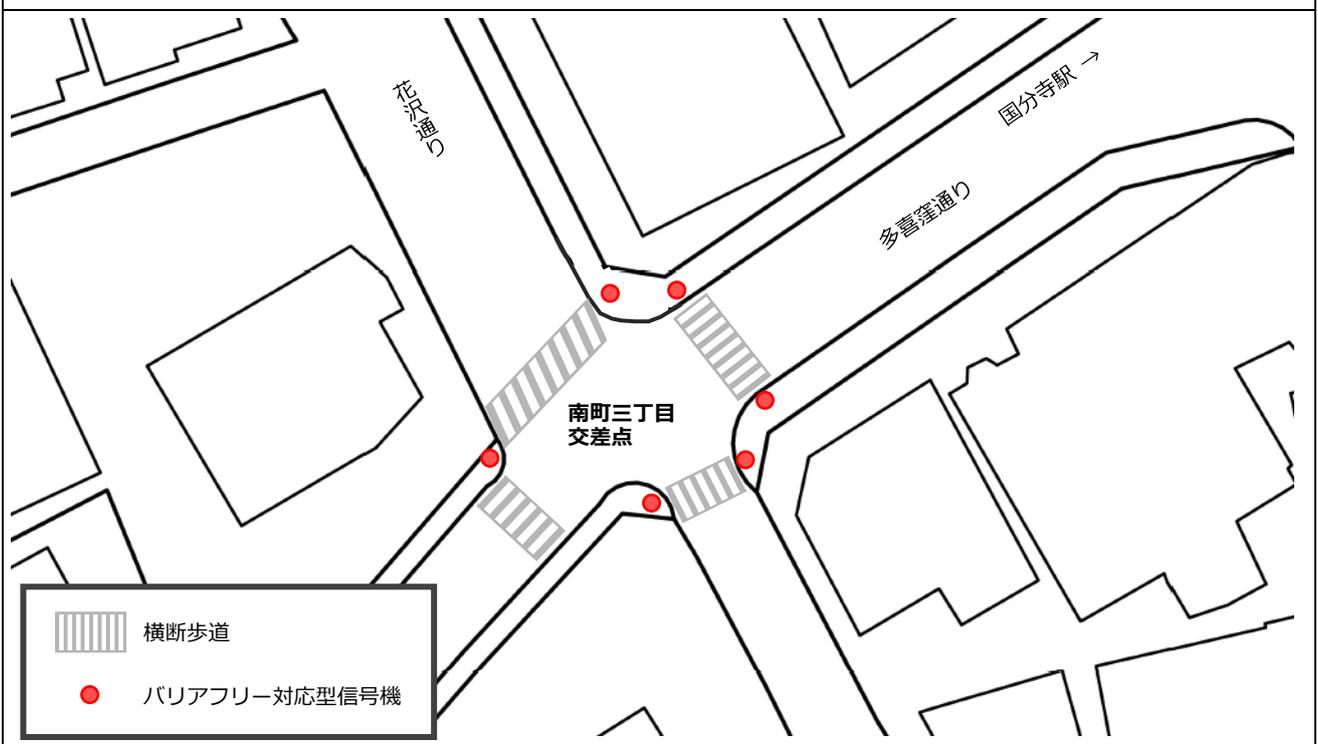

## 2. エスコートゾーンの整備



①	主要地方道	所沢府中線	国分寺市泉町 2 丁目 4 番 1 号～国分寺東恋ヶ窪 4 丁目 23 番地 8
②	一般都道府県道	恋ヶ窪新田三鷹線	国分寺東恋ヶ窪 4 丁目 23 番地 8～国分寺市本多 1 丁目 14 番 11 号
③	一般都道府県道	小川山府中線	国分寺市本多 1 丁目 14 番 11 号～国分寺市南町 2 丁目 17 番 1 号
④	一般都道府県道	立川国分寺線	国分寺市南町 2 丁目 17 番 1 号～国分寺市泉町 2 丁目 4 番 1 号

**教育啓発特定事業**

<b>事業対象</b>	<b>市立小・中学校の児童・生徒</b>	<b>対象事業者名</b>	<b>国分寺市・国分寺市教育委員会</b>
-------------	----------------------	---------------	-----------------------

**事業内容・実施時期**

番号	事業内容	目標 時期		実施時期													
				短期					長期								
				R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13				
1	高齢者、障害のある人々などとの交流や対話の機会の設定	短期・長期	実施時期														
			備考 進捗状況	継続的に実施。													
2			実施時期														
			備考 進捗状況														
3			実施時期														
			備考 進捗状況														
その他			実施時期														
			備考 進捗状況														

**実施済項目**

・各市立小・中学校が年間指導計画に基づき実施済み。

**その他事項**

**実施内容、写真、参考資料等**

・市立小・中学校においては、各学校の年間指導計画に基づき、以下に示す「車いす体験」のような活動を通して、「心のバリアフリー」に関する理解を深めるための指導を計画的に行っている。



**教育啓発特定事業**

<b>事業対象</b>	<b>市職員</b>	<b>対象事業者名</b>	<b>国分寺市</b>
-------------	------------	---------------	-------------

**事業内容・実施時期**

番号	事業内容	目標時期		実施時期									
				短期					長期				
				R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
1	待遇等の職員研修の実施	短期・長期	実施時期										
			備考 進捗状況	継続的に実施									
2	心のバリアフリーに関する学習会の実施	短期・長期	実施時期										
			備考 進捗状況	継続的に実施									
3			実施時期										
			備考 進捗状況										
その他			実施時期										
			備考 進捗状況										

**実施済項目**

- ・公務員として市民と接する際の心構えを習得するため、新任研修「待遇研修」を年1回実施。
- ・心のバリアフリーに関する学習会を年一回実施

**その他事項**

**実施内容、写真、参考資料等**

1. 「待遇研修」の主な内容（バリアフリーに関する内容）

- ・国分寺市職員の障害を理由とする差別解消推進対応要綱について
- ・東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例について
- ・障害種別ごとの主な特徴について
- ・障害者差別解消法による「合理的配慮」について

2. 心のバリアフリーに関する学習会  
 (開催日：令和7年3月 講師：まちづくり計画課・職員課職員 参加人数 12人)

- ・年一回実施
- ・様々な心身の特性や考え方を持つすべての人々が、相互に理解を深めようとコミュニケーションをとり支えあう心のバリアフリーに関する内容の学習会を実施した。受講者からは、「社会的障壁への理解とその解消方法を考えるうえで有意義な会であった。」「街のバリアの事例から、自分がその場にいた時に、何ができるか考えるきっかけになった。」等の意見があった。



**教育啓発特定事業**

<b>事業対象</b>	<b>市民</b>	<b>対象事業者名</b>	<b>国分寺市</b>
-------------	-----------	---------------	-------------

**事業内容・実施時期**

番号	事業内容	目標時期		実施時期									
				短期					長期				
				R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
1	ヘルプマーク等の配布	短期・長期	実施時期										
			備考 進捗状況	継続的に実施。									
2	理解促進啓発活動の実施	短期・長期	実施時期										
			備考 進捗状況	継続的に実施。									
3			実施時期										
			備考 進捗状況										
その他			実施時期										
			備考 進捗状況										

**実施済項目**

- ・ヘルプマーク・ヘルプカード及び災害時等障害者支援バンダナの配布、普及啓発グッズの作成・配布（継続して実施）
- ・障害者週間（毎年12月3日～9日）に合わせた障害者週間行事の実施（継続して実施）
- ・障害者差別解消法理解促進のための研修会・講演会の実施（H28～29）
- ・障害理解促進のための映画上映会の実施（H30～31、R6）

**その他事項**

**実施内容、写真、参考資料等**

**① ヘルプマーク等の配布（継続して実施）**

- ・高齢者、障害者等、支援が必要な方のためのマーク等（ヘルプカード、ヘルプマーク及び災害時等障害者支援バンダナ）を配布。
- ・市民に対し、マーク等への理解を促進するための啓発活動を実施。

**② 理解促進啓発活動の実施（継続して実施）**

- ・毎年、障害者週間（12月3日～9日）に合わせて障害者週間行事を企画し、広く市民に向けて、障害理解促進に向けたイベント、展示会、体験型ワークショップ等を実施。

**【R6年の実施概要】**

- ① ヘルプマーク、ヘルプカード普及啓発グッズとして、付箋を作成し、市内小学校や庁内窓口にて配布した。
- ② 障害者週間行事として、「映画上映会」を実施、市内障害者施設によるワークショップ及び物品販売会、障害のある方々による絵画等作品展示会を実施した。



あなたの支援が必要です。  
**ヘルプカード**

国分寺市



令和6年度障害者週間行事  
「最高の人生の見つけ方」「不安の正体」  
「バリアフルライフ」の3本の映画上映会を実施

**教育啓発特定事業**

<b>事業対象</b>	<b>JR 国分寺駅</b>	<b>対象事業者名</b>	<b>JR 東日本</b>
-------------	----------------	---------------	---------------

**事業内容・実施時期**

番号	事業内容	目標 時期		実施時期												
				短期					長期							
				R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13			
1	高齢者・障害者等に対する適切な接遇・ 介助の方法に関する駅係員への継続的な 教育訓練の実施	短期 ・ 長期	実施時期													
			備考 進捗状況	・継続的に実施する。												
2			実施時期													
			備考 進捗状況	・												
3			実施時期													
			備考 進捗状況	・												
その他			実施時期													
			備考 進捗状況	・												

**実施済項目**

- ・実車を使用した救出訓練等の社員教育を継続して実施。
- ・「声かけ・サポート」運動を継続して実施。

**その他事項**

**実施内容、写真、参考資料等**

① 社員教育の実施（継続して実施）

- 駅間長時間停車中の車内に、白杖・車いすお客さま・高齢者・障害者がいる想定での実車を使用した救出訓練を実施した。（2024（R6）年6月17日～20日 三鷹車両センターにて実施）



- 当社・他社問わず、鉄道業において発生した情報は発生の都度、朝礼・駅報にて社員周知するとともに、社員教育として「他山の石」の活用を行っている。

② 「声かけ・サポート」運動の実施（継続して実施）

- ポスターの掲出・駅構内放送の実施を行うとともに、社員からお客さまに対して、お客さまと双方向でコミュニケーションをとりながら、鉄道サービス業として適切な声かけを実施した。

**教育啓発特定事業**

<b>事業対象</b>	西武国分寺駅	<b>対象事業者名</b>	西武鉄道株式会社
-------------	--------	---------------	----------

**事業内容・実施時期**

番号	事業内容	目標 時期		実施時期										
				短期					長期					
				R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	
1	高齢者、障害者等に対する適切な接遇・ 介助の方法に関する駅係員への継続的な 教育訓練の実施	短期 ・ 長期	実施時期											
			備考 進捗状況											
2			実施時期											
			備考 進捗状況											
3			実施時期											
			備考 進捗状況											
その他			実施時期											
			備考 進捗状況											

**実施済項目**

- ・机上及び実技による社員教育を継続して実施。
- ・「声かけ・サポート」運動強化キャンペーンを継続して実施。

**その他事項**

**実施内容、写真、参考資料等**

- ① **社員教育の実施（継続して実施）**  
 お客さまにより安心感をもって西武鉄道をご利用いただくため、机上及び実技による社内教育を実施し対応スキル向上に努めている。
- ② **「声かけ・サポート」運動 強化キャンペーン（継続して実施）**  
 お客さまが安全かつ安心して施設をご利用いただけるよう、お困りのお客さまに対して駅係員から積極的にお声かけを行うとともに、周囲のお客さまからもお声かけにご協力いただく。  
 （交通事業者 83 社局、障害者団体を含む 10 団体で実施。2024（R6）年 8 月 20 日 ニュースリリース）

**教育啓発特定事業**

<b>事業対象</b>	<b>路線バス（西武）</b>	<b>対象事業者名</b>	<b>西武バス株式会社</b>
-------------	-----------------	---------------	-----------------

**事業内容・実施時期**

番号	事業内容	目標 時期		実施時期													
				短期					長期								
				R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13				
1	高齢者、障害者等に対する適切な接遇・ 介助の方法に関する乗務員への継続的な 教育訓練の実施	短期 ・ 長期	実施時期														
			備考 進捗状況	毎年継続的に実施。													
2			実施時期														
			備考 進捗状況														
3			実施時期														
			備考 進捗状況														
その他			実施時期														
			備考 進捗状況														

**実施済項目**

・全乗務員に対して各営業所で3ヶ月に1回開催している定期研修のうち、年1回は車いすを使用した実地研修を実施。

**その他事項**

・一般的な接遇教育として最低年6回、覆面添乗員が営業車両に乗り込み接遇状況を確認、接遇が不適切な者については各営業所管理者から指導を実施。その他定期的に研修所での集合教育等を実施。

**実施内容、写真、参考資料等**



**教育啓発特定事業**

<b>事業対象</b>	<b>路線バス（立川）</b>	<b>対象事業者名</b>	<b>立川バス株式会社</b>
-------------	-----------------	---------------	-----------------

**事業内容・実施時期**

番号	事業内容	目標時期		実施時期													
				短期					長期								
				R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13				
1	乗務員へ、高齢者・障害者等に対する適切な接遇・介助の方法を小集団教育を通して継続的に周知。	短期・長期	実施時期														
			備考 進捗状況														
2			実施時期														
			備考 進捗状況														
3			実施時期														
			備考 進捗状況														
その他	バス車内へ筆談具を設置。乗務員への周知を実施	短期・長期	実施時期														
			備考 進捗状況														

**実施済項目**

・全乗務員対象に小集団教育を実施（年間6回開催）。

**その他事項**

**実施内容、写真、参考資料等**

小集団教育→



↓全車両に筆談メモを設置



**教育啓発特定事業**

<b>事業対象</b>	<b>路線バス（京王）</b>	<b>対象事業者名</b>	<b>京王電鉄バス株式会社</b>
-------------	-----------------	---------------	-------------------

**事業内容・実施時期**

番号	事業内容	目標時期		実施時期									
				短期					長期				
				R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
1	高齢者、障害者等に対する適切な接遇・介助の方法に関する乗務員への継続的な教育訓練の実施	短期・長期	実施時期										
			備考進捗状況										
2			実施時期										
			備考進捗状況										
3			実施時期										
			備考進捗状況										
その他			実施時期										
			備考進捗状況										

**実施済項目**

・全乗務員に対して3年に1度の頻度で受講させている定期研修（開催は毎年）において、本物の車いすを用いた介助訓練、手足におもりやギブス等で関節を固定してバスに乗り降りする高齢者疑似体験を実施。

**その他事項**

・一般的な接遇教育として全乗務員に対して年2回以上、覆面添乗員が営業車両に乗車してチェックを行い、各営業所の管理者から指導を実施。また必要に応じて集合教育形式のCS研修も実施。

**実施内容、写真、参考資料等**



**その他の特定事業**

<b>整備対象</b>	<b>国分寺駅北口駅前広場</b>	<b>対象事業者名</b>	<b>国分寺市</b>
-------------	-------------------	---------------	-------------

**事業内容・実施時期**

番号	事業内容	延長(m) 箇所数	目標 時期		実施時期										
					短期					長期					
					R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	
1	北口階段中央部への手すりの設置	1箇所	短期	実施時期											
				備考 進捗状況	・実施済み。										
2	北口階段踊り場への点状ブロックの設置	1箇所	短期	実施時期											
				備考 進捗状況	・実施済み。										
3				実施時期											
				備考 進捗状況											
その他	方向定位ブロックの設置	14箇所 (54基)	短期	実施時期											
				備考 進捗状況	・実施済み (R5 事後検証完了)。										

**実施済項目**

・全て実施済み。

**その他事項**

**事業箇所図**

①手すり

②点状ブロック

国分寺駅北口駅前  
広場方面

②点状ブロック  
実施済み

階段部分

3m

新設手すり(階段上) (a)

新設点字ブロック (b)  
境界北側

国分寺市(甲)  
cocobunji WEST管理組合  
敷地境界 [Z]

新設点字ブロック (c)  
境界南側

新設手すり(壁沿い) (d)

①手すり実施済み

cocobunji WEST 方面



**その他の特定事業**

<b>整備対象</b>	南口広場	<b>対象事業者名</b>	権利者等と調整の上、決定。
-------------	------	---------------	---------------

**事業内容・実施時期**

番号	事業内容	延長(m) 箇所数	目標 時期		実施時期												
					短期					長期							
					R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13			
1	南口広場の整備	1箇所	継続 検討	実施時期													
				備考 進捗状況	※検討中 検討委託発注 R10工事着手予定 ・【R6】交通量調査等を元に広場再整備案のたたき台の作成、関係機関等協議等の実施。R7～9にかけて工事発注のための整備検討委託を発注予定。												
2				実施時期													
				備考 進捗状況													
3				実施時期													
				備考 進捗状況													
その他	南口広場の修繕			実施時期													
				備考 進捗状況	・【R6】植栽マス（3箇所）の修繕 ・【R7】タクシー乗降場の段差修繕（予定）												

**実施済項目**

--

**その他事項**

- ・土地所有者との協議、市民意向の把握等を経て具体的な整備内容を決定していく。
- ・駅前広場の本格的な再整備に先立ち、安全・安心な歩行空間を保つため、通行の妨げとなっている植栽マス（3箇所）の撤去、周辺の高さに合わせた復旧を令和6年度に行った。
- ・令和7年度は、タクシー乗降場においてロータリーと広場の間に段差があることからスロープを設置する予定。

**事業箇所図**



その他の特定事業 南口広場 R6 植栽マス（3箇所）修繕箇所



**その他の事業**

<b>整備対象</b>	泉町二丁目バス停	<b>対象事業者名</b>	京王電鉄バス株式会社
-------------	----------	---------------	------------

**事業内容・実施時期**

番号	事業内容	延長(m) 箇所数	目標 時期	実施時期												
				短期						長期						
				R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13			
1	バス停留所への上屋の設置	2 箇所	継続 検討	実施時期												
				備考 進捗状況	※検討中 ・収支状況も勘案しながら検討する											
2				実施時期												
				備考 進捗状況												
3				実施時期												
				備考 進捗状況												
その他				実施時期												
				備考 進捗状況												

**実施に必要な資金額及び調達方法**

・基礎を深く埋める必要があるため、埋設物の状況によって設置費用は大きく変化する。

**実施済項目**

**その他事項**

・上屋設置後も十分な歩行空間が確保されていることを確認する必要がある。

**事業箇所図**



**国分寺市バリアフリー特定事業の進捗状況  
(令和6年度実績)**

**令和8年1月**

発行：国分寺市

編集：まちづくり部まちづくり計画課

〒185-8501

東京都国分寺市泉町2丁目2番18

電話 042-325-0111 (代表)
