

国分寺市バリアフリー特定事業の進捗状況


(令和4年度実績)

令和6年1月
国分寺市

目 次

1. 国分寺駅周辺地区の重点整備地区の区域図	1
1-1. 国分寺駅周辺地区の重点整備地区の区域, 生活関連施設, 生活関連経路図	1
2. 特定事業計画	3
2-1. 公共交通特定事業.....	3
2-2. 道路特定事業	5
2-3. 都市公園特定事業.....	21
2-4. 建築物特定事業	25
2-5. 交通安全特定事業.....	56
2-6. 教育啓発特定事業.....	61
2-7. その他の事業	69

図 国分寺駅周辺地区の重点整備地区の区域、生活関連施設、生活関連経路

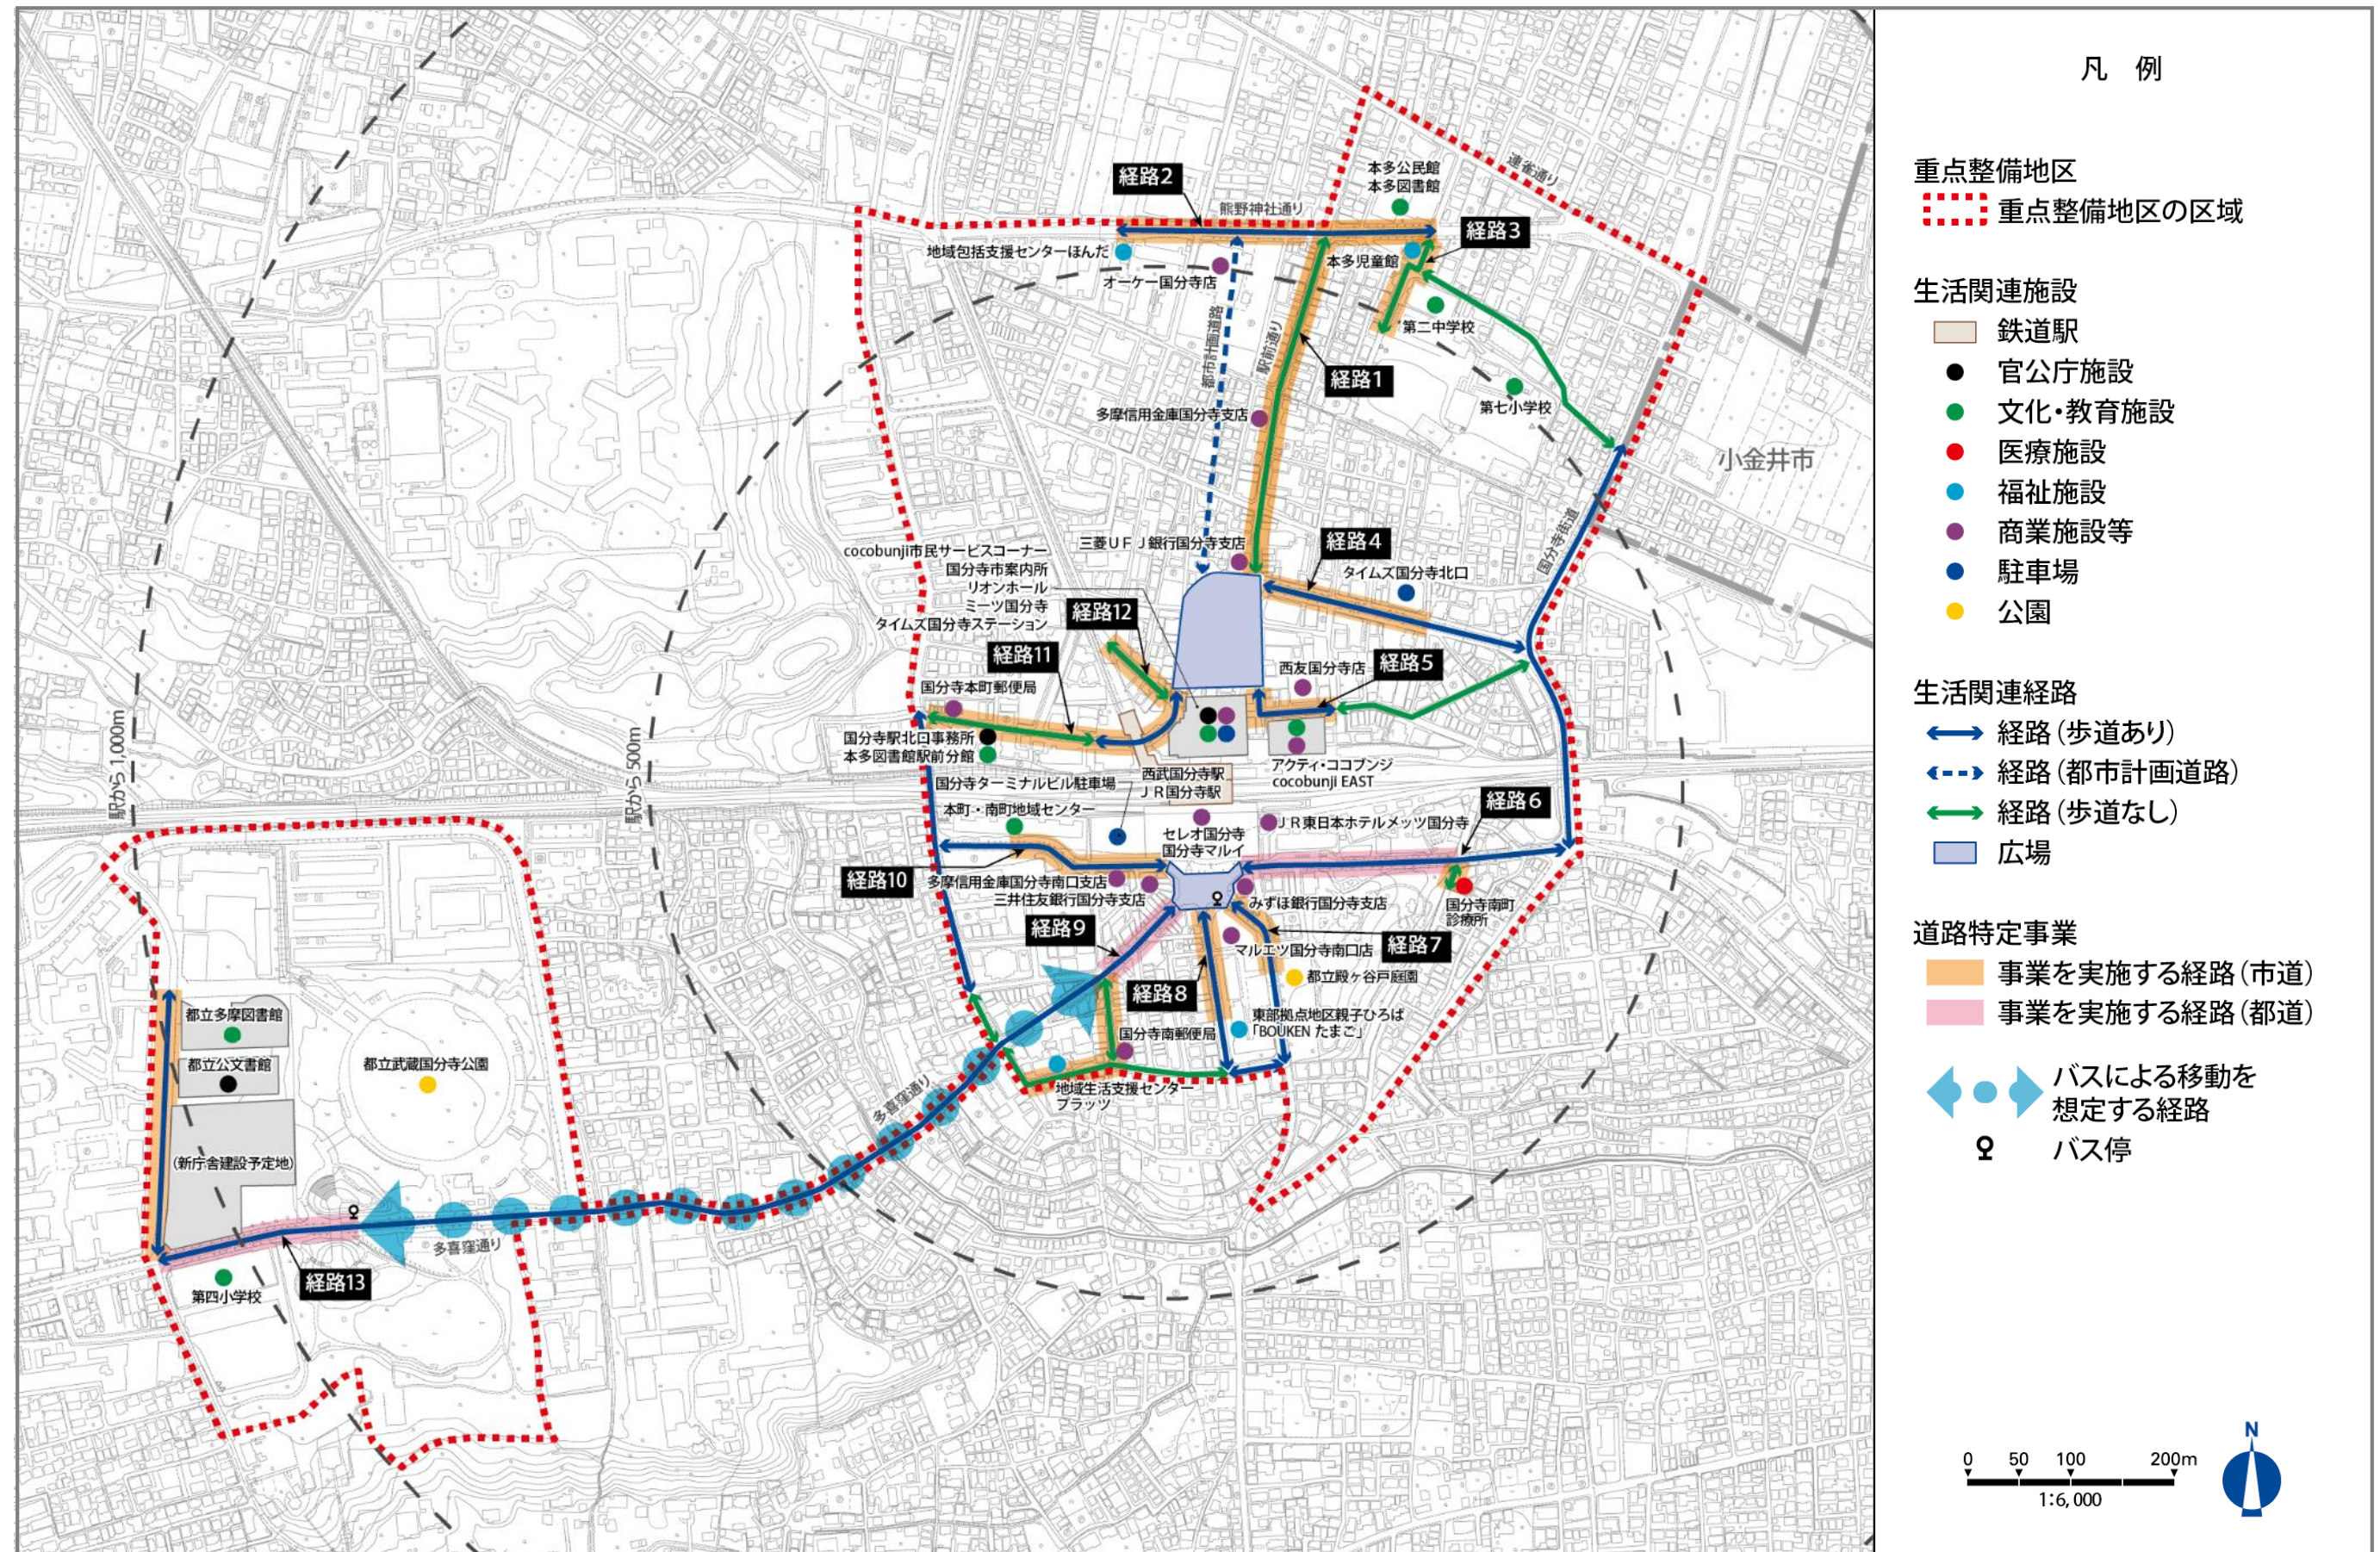

公共交通特定事業

整備対象	JR 国分寺駅	対象事業者名	JR 東日本
------	---------	--------	--------

事業内容・実施時期

番号	事業内容	延長(m) 箇所数	目標 時期		実施時期									
					短期					長期				
					R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
1	有人改札口に車いす使用者 に対応したカウンターを設 置	1 箇所	継続 検討	実施時期										
				備考 進捗状況	大規模改修に併せ改修を検討 ※検討中									
2	有人改札口における筆談ツ ールの準備とその表示の設 置	1 箇所	短期	実施時期										
				備考 進捗状況	実施済									
3	ホーム階段下への侵入防止 のための柵等の設置	3 箇所	継続 検討	実施時期										
				備考 進捗状況	2 箇所（上りホーム）は実施済、 1 箇所（下りホーム）は侵入防止設備の整備を検討中、R5 現在は 緩衝材設置による暫定対処済。今後侵入防止設備整備を検討。									
4	ホームドアの設置	2 ホー ム 4 列	長期	実施時期										
				備考 進捗状況	2031 年度までの整備に向け検討中									
そ の 他				実施時期										
				備考 進捗状況										

実施に必要な資金額及び調達方法

・自己資金及び鉄道駅バリアフリー料金制度により調達予定

実施済項目

- ・各ホームエレベーター整備済
- ・駅ホーム内方線整備済

その他事項

事業箇所図



公共交通特定事業

整備対象	西武国分寺駅	対象事業者名	西武鉄道株式会社
------	--------	--------	----------

事業内容・実施時期


番号	事業内容	延長(m) 箇所数	目標 時期		実施時期									
					短期					長期				
					R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
1	有人改札口の筆談対応の表示の改善	1 力所	短期	実施時期										
				備考 進捗状況										
2				実施時期										
				備考 進捗状況										
3				実施時期										
				備考 進捗状況										
その他				実施時期										
				備考 進捗状況										

実施に必要な資金額及び調達方法

実施済項目

その他事項

事業箇所図

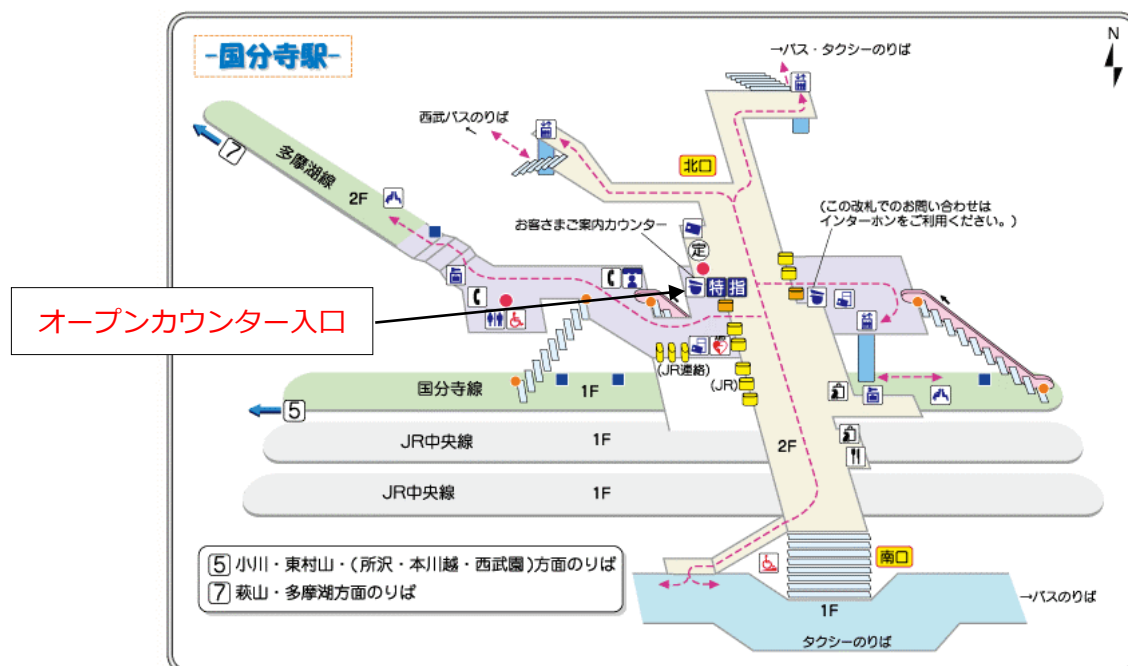

2-2. 道路特定事業

道路特定事業

整備対象	都道 145 号立川国分寺線（多喜窪通り・丸山通り）	対象事業者名	東京都
------	----------------------------	--------	-----

事業内容・実施時期


番号	事業内容	延長(m) 箇所数	目標 時期		実施時期									
					短期					長期				
					R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
1	視覚障害者誘導用ブロック の改善・設置	200m	継続 検討	実施時期										
				備考 進捗状況	※検討中 ・適切な維持管理を継続して実施									
2	歩道の勾配の改善	200m	継続 検討	実施時期										
				備考 進捗状況	※検討中 ・継続検討									
3	歩道の有効幅員確保	200m	継続 検討	実施時期										
				備考 進捗状況	※検討中 ・未定									
その他				実施時期										
				備考 進捗状況										

実施済項目

その他事項

事業箇所図

経路 6

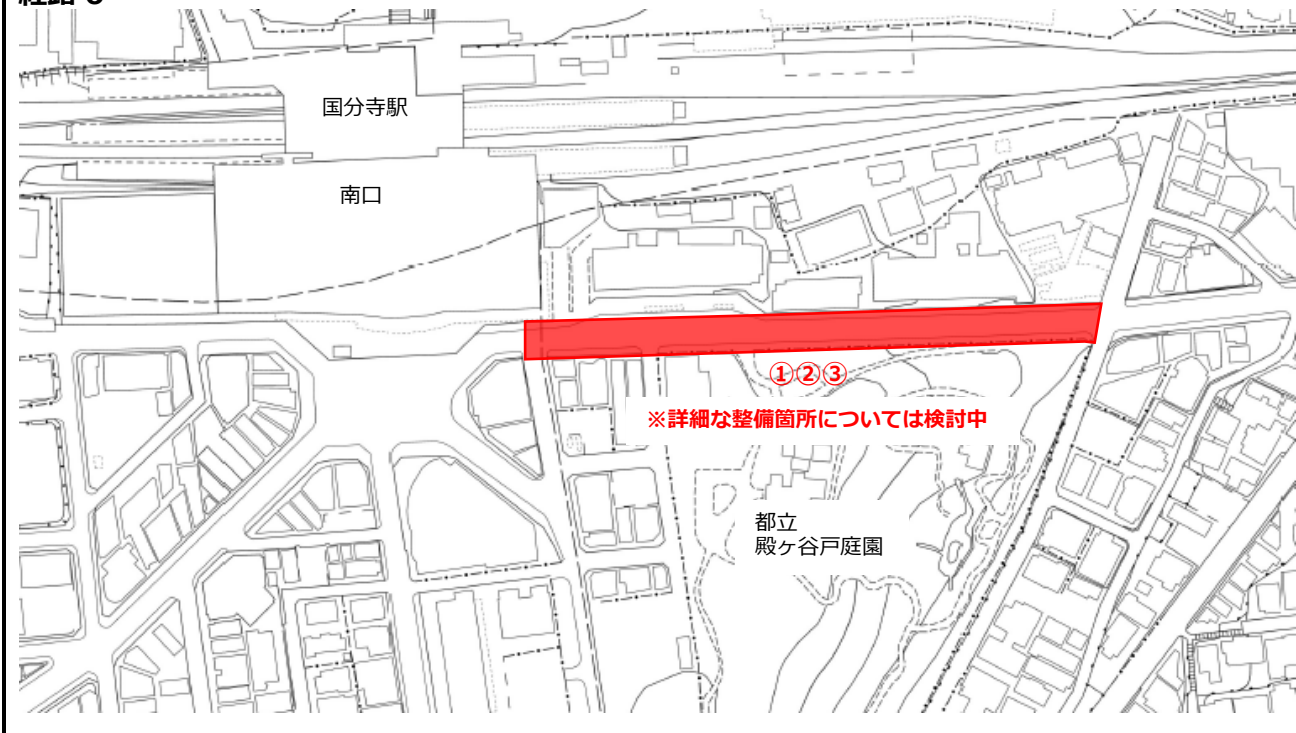

道路特定事業														
整備対象		都道 145 号立川国分寺線（多喜窪通り）			対象事業者名		東京都							
事業内容・実施時期														
番号	事業内容	延長(m) 箇所数	目標 時期		実施時期									
					短期					長期				
					R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
1	視覚障害者誘導用ブロック の改善・設置	100m	継続 検討	実施時期	※検討中									
				備考 進捗状況	・適切な維持管理を継続して実施									
2	歩道の勾配の改善	100m	継続 検討	実施時期	※検討中									
				備考 進捗状況	・継続検討									
3	歩車道境界部の段差の改善	100m	継続 検討	実施時期	※検討中									
				備考 進捗状況	・適切な維持管理を継続して実施									
そ の 他				実施時期	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
				備考 進捗状況										
実施済項目														
その他事項														
事業箇所図														
経路 9 国分寺駅 南口 ①②③ ※詳細な整備箇所については検討中 都立 殿ヶ谷戸庭園														

道路特定事業														
整備対象		都道 145 号立川国分寺線（多喜窪通り）			対象事業者名		東京都							
事業内容・実施時期														
番号	事業内容	延長(m) 箇所数	目標 時期		実施時期									
					短期					長期				
					R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
1	視覚障害者誘導用ブロック の改善・設置	200m	継続 検討	実施時期	※検討中									
				備考 進捗状況	・適切な維持管理を継続して実施									
				実施時期	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
				備考 進捗状況										
				実施時期	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
				備考 進捗状況										
そ の 他				実施時期	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10			
				備考 進捗状況										
実施済項目														
その他事項														
事業箇所図														
経路 13 														

道路特定事業

整備対象	市道幹5号線（駅前通り）				対象事業者名	国分寺市									
事業内容・実施時期															
番号	事業内容	延長(m) 箇所数	目標 時期		実施時期										
					短期					長期					
1	安全な歩行空間の整備	約 330 m	長期	実施時期	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	
				備考 進捗状況	・整備方針の決定及び国3・4・12号線の整備に合わせ、関係部署と調整していく。										
2	歩行者主体の道づくりの検討	約 330 m	長期	実施時期	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	
				備考 進捗状況	・国3・4・12号線施行の進捗を鑑み、まちづくり協議会の活動に対して必要な支援を行う。										
3				実施時期	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	
				備考 進捗状況											
その他				実施時期	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	
				備考 進捗状況											
実施済項目															
その他事項															
・市まちづくり条例に基づき認定した「北口駅前通り交通安全まちづくり協議会」により、歩行者が安全かつ安心に歩行できる道等の実現について検討中。															
事業箇所図															

道路特定事業

整備対象	市道幹7号線（駅前通り以东）	対象事業者名	国分寺市
------	----------------	--------	------


事業内容・実施時期

番号	事業内容	延長(m) 箇所数	目標 時期		実施時期									
					短期					長期				
					R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
1	歩車道境界部の段差の改善	1 か所	短期	実施時期										
				備考 進捗状況	・計画工事（舗装補修工事等）にあわせて対応する。									
2	歩道の勾配の改善	3 か所	継続 検討	実施時期										
				備考 進捗状況	※検討中 ・関係機関、関係部署と調整し、実施時期や整備内容を検討する。									
3	視覚障害者誘導用ブロックの改善・設置	9 か所	短期	実施時期										
				備考 進捗状況	・計画工事（舗装補修工事等）にあわせて対応する。 一部維持管理工事にて対応する。									
その他				実施時期										
				備考 進捗状況										

実施済項目

その他事項

事業箇所図

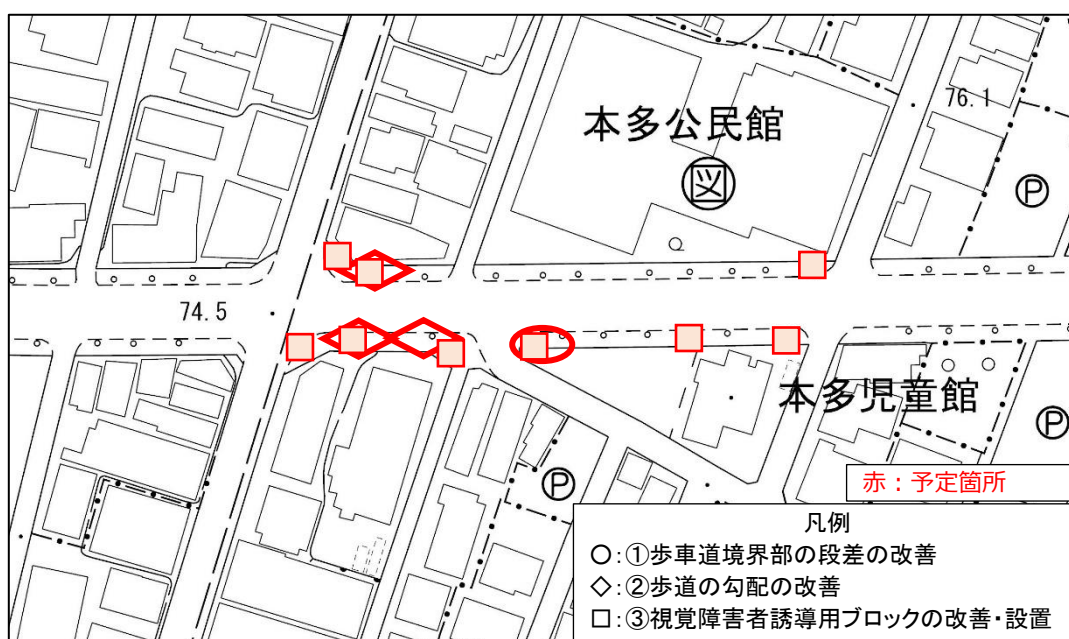

道路特定事業														
整備対象		市道幹7号線（駅前通り以西）			対象事業者名		国分寺市							
事業内容・実施時期														
番号	事業内容	延長(m) 箇所数	目標 時期		実施時期									
					短期					長期				
					R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
1	視覚障害者誘導用ブロック の改善・設置	7か所	長期	実施時期										
				備考 進捗状況	・計画工事（舗装補修工事等）にあわせて対応する。 一部維持管理工事にて対応する。									
2				実施時期										
				備考 進捗状況										
3				実施時期										
				備考 進捗状況										
その他				実施時期										
				備考 進捗状況										
実施済項目														
その他事項														
事業箇所図														
本多二丁目 商工会館 76.6 75.2 75.9 74.5 75.2 75.4 赤：予定箇所 凡例 □：①視覚障害者誘導用ブロックの改善・設置														

道路特定事業														
整備対象		市道東1号線 東30号線 東40号線			対象事業者名		国分寺市							
事業内容・実施時期														
番号	事業内容	延長(m) 箇所数	目標 時期		実施時期									
					短期					長期				
					R4	R5	R6	R7	R8	R4	R5	R6	R7	R8
1	安全な歩行空間の整備	未定	継続 検討	実施時期	※検討中									
				備考 進捗状況	※関係機関、関係部署と調整し、実施時期や整備内容を検討する。									
2				実施時期	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
				備考 進捗状況										
3				実施時期	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
				備考 進捗状況										
その他				実施時期	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
				備考 進捗状況										
実施済項目														
その他事項														
事業箇所図														

道路特定事業														
整備対象		市道幹4号線		対象事業者名		国分寺市								
事業内容・実施時期														
番号	事業内容	延長(m) 箇所数	目標 時期		実施時期									
					短期					長期				
					R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
1	視覚障害者誘導用ブロック の改善	2 か所	短期	実施時期										
				備考 進捗状況	・維持管理工事にて対応 ・1箇所について、令和5、6年度対応予定									
2				実施時期										
				備考 進捗状況										
3				実施時期										
				備考 進捗状況										
その他				実施時期										
				備考 進捗状況										
実施済項目														
その他事項														
事業箇所図														
本町二丁目 交差点 国分寺駅 北口広場 令和5、6年度対応予定 赤：予定箇所 凡例 □：①視覚障害者誘導用ブロックの改善・設置														

道路特定事業														
整備対象		市道南 96 号線		対象事業者名		国分寺市								
事業内容・実施時期														
番号	事業内容	延長(m) 箇所数	目標 時期		実施時期									
					短期					長期				
					R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
1	安全な歩行空間の整備	未定	継続 検討	実施時期	※検討中									
				備考 進捗状況	※関係機関、関係部署と調整し、実施時期や整備内容を検討する。									
2				実施時期	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
				備考 進捗状況										
3				実施時期	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
				備考 進捗状況										
その他				実施時期	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
				備考 進捗状況										
実施済項目														
その他事項														
事業箇所図														

道路特定事業														
整備対象		市道南 103・106 号線			対象事業者名		国分寺市							
事業内容・実施時期														
番号	事業内容	延長(m) 箇所数	目標 時期		実施時期									
					短期					長期				
					R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
1	歩車道境界部の段差の改善	2 か所	短期	実施時期	※検討中									
				備考 進捗状況	・ R4 維持補修工事にて対応済み（南 103 号線） ・ 計画工事（舗装補修工事等）にあわせて対応する。（南 106 号線）									
2	視覚障害者用誘導ブロック の改善・設置	7 か所	短期	実施時期	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
				備考 進捗状況	・ 計画工事（舗装補修工事等）にあわせて対応する。									
3	歩行空間の連続性確保の整備	1 か所	継続 検討	実施時期	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
				備考 進捗状況	※関係機関、関係部署と調整し、実施時期や整備内容を検討する。									
その他				実施時期	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
				備考 進捗状況	・									
実施済項目														
・ 歩車道境界部の段差の改善（1 か所）実施済み。														
その他事項														
事業箇所図														
国分寺駅南口 ロータリー 都立 殿ヶ谷戸庭園 都営国分寺南町 三丁目アパート 南 106 号線 南 103 号線 赤：予定箇所 青：実施済箇所 凡例 ○：①歩車道境界部の段差の改善 □：②視覚障害者誘導用ブロックの改善・設置 ➡：③歩行空間の連続性確保														



道路特定事業														
整備対象		市道南 101 号線			対象事業者名		国分寺市							
事業内容・実施時期														
番号	事業内容	延長(m) 箇所数	目標 時期		実施時期									
					短期					長期				
					R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
1	歩道の勾配の改善	未定	継続 検討	実施時期	※検討中									
				備考 進捗状況	※関係機関、関係部署と調整し、実施時期や整備内容を検討する。									
2	歩道の有効幅員確保	未定	継続 検討	実施時期	※検討中									
				備考 進捗状況	※関係機関、関係部署と調整し、実施時期や整備内容を検討する。									
3				実施時期	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
				備考 進捗状況										
その他				実施時期	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
				備考 進捗状況										
実施済項目														
その他事項														
事業箇所図														

道路特定事業														
整備対象		市道南 100・109・113 号線			対象事業者名		国分寺市							
事業内容・実施時期														
番号	事業内容	延長(m) 箇所数	目標 時期		実施時期									
					短期					長期				
					R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
1	安全な歩行空間の整備	未定	継続 検討	実施時期										
				備考 進捗状況	※関係機関、関係部署と調整し、実施時期や整備内容を検討する。									
2				実施時期										
				備考 進捗状況										
3				実施時期										
				備考 進捗状況										
その他				実施時期										
				備考 進捗状況										
実施済項目														
その他事項														
事業箇所図														

道路特定事業														
整備対象		市道南 115・120 号線・295 号線			対象事業者名		国分寺市							
事業内容・実施時期														
番号	事業内容	延長(m) 箇所数	目標 時期		実施時期									
					短期					長期				
					R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
1	歩車道境界部の段差の改善	1 箇所	短期	実施時期										
				備考 進捗状況	実施済み									
2	歩道の勾配の改善	3 箇所	継続 検討	実施時期										
				備考 進捗状況	※検討中									
3	視覚障害者誘導用ブロック の改善・設置	2 箇所	短期	実施時期										
				備考 進捗状況	・歩道の勾配の改善と同時対応が必要									
4	歩道の有効幅員確保	2 箇所	継続 検討	実施時期										
				備考 進捗状況	※関係機関、関係部署と調整し、実施時期や整備内容を検討する。									
5	歩行空間の連続性確保の整備	未定	継続 検討	実施時期										
				備考 進捗状況	※関係機関、関係部署と調整し、実施時期や整備内容を検討する。									
実施済項目														
・歩車道境界部の段差の改善について実施済み。														
その他事項														
事業箇所図														
赤：予定箇所 青：実施済箇所 国分寺駅 南 295 号線 南 120 号線 南 115 号線 南口 国際文化 理容美容専門 学校 凡例 ○：①歩車道境界部の段差の改善 ◇：②歩道の勾配の改善 □：③視覚障害者誘導用ブロックの改善・設置 ⋯：④歩道の有効幅員確保 ➡：⑤歩行空間の連続性確保														

道路特定事業														
整備対象		市道幹5号線			対象事業者名		国分寺市							
事業内容・実施時期														
番号	事業内容	延長(m) 箇所数	目標 時期		実施時期									
					短期					長期				
					R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
1	歩道の勾配の改善	1 箇所	継続 検討	実施時期	※検討中									
				備考 進捗状況	※西武多摩湖線跨道橋及び埋設物との位置関係から、勾配の改善にあたっては、技術的検討や関係機関・関係部署との調整を要する。									
2	歩道の有効幅員確保	2 箇所	継続 検討	実施時期	※検討中									
				備考 進捗状況	※関係機関、関係部署と調整し、実施時期や整備内容を検討する。									
3	安全な歩行空間の整備	未定	継続 検討	実施時期	※検討中									
				備考 進捗状況	※関係機関、関係部署と調整し、実施時期や整備内容を検討する。									
その他				実施時期	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
				備考 進捗状況										
実施済項目														
その他事項														
事業箇所図														
赤：予定箇所 凡例 ◇：①歩道の勾配の改善 (○)：②歩車の有効幅員確保														


道路特定事業														
整備対象		市道東3号線		対象事業者名		国分寺市								
事業内容・実施時期														
番号	事業内容	延長(m) 箇所数	目標 時期		実施時期									
					短期					長期				
					R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
1	安全な歩行空間の整備	未定	継続 検討	実施時期	※検討中									
				備考 進捗状況	※関係機関、関係部署と調整し、実施時期や整備内容を検討する。									
2				実施時期	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
				備考 進捗状況	・									
3				実施時期	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
				備考 進捗状況	・									
その他				実施時期	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
				備考 進捗状況	・									
実施済項目														
・歩行空間を確保するために、「ここは歩道です。通行の妨げとなる看板等の物を置かないで下さい」との表示を令和5年度に行う予定														
その他事項														
事業箇所図														
① ※詳細な整備箇所については検討中														

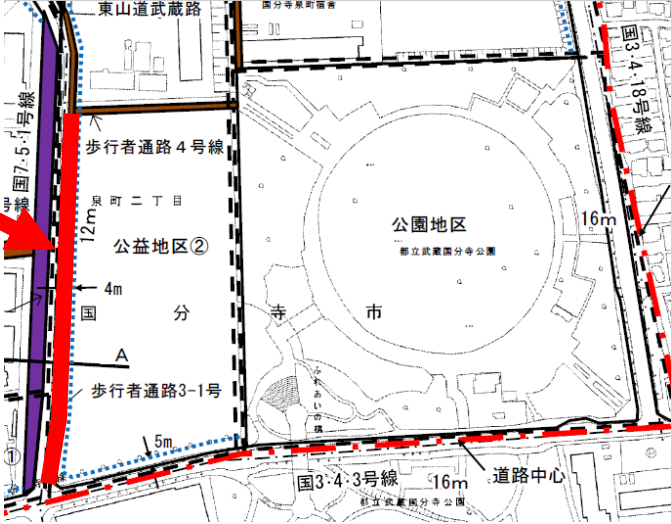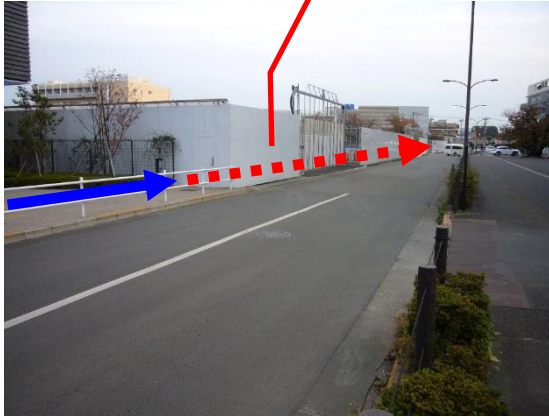道路特定事業														
整備対象		市道南 307 号線		対象事業者名		国分寺市								
事業内容・実施時期														
番号	事業内容	延長(m) 箇所数	目標 時期		実施時期									
					短期					長期				
					R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
1	地区計画に合わせた歩行空間の適切な確保	約 260 m	短期	実施時期										
				備考 進捗状況	・新庁舎建設に当たっては、既に整備されている歩行空間と一帯となるように調整を図りながら検討する。									
2				実施時期										
				備考 進捗状況										
3				実施時期										
				備考 進捗状況										
その他				実施時期										
				備考 進捗状況										
実施済項目														
・都立多摩図書館及び都立公文書館については既に整備済のため、当該施設の接する箇所については、歩行空間が確保されている。														
その他事項														
事業箇所図														
 新庁舎建設に合わせ、連続した公開空地（歩行空間）を整備する。 														

都市公園特定事業														
整備対象		都立武蔵国分寺公園			対象事業者名		東京都							
事業内容・実施時期														
番号	事業内容	延長(m) 箇所数	目標 時期		実施時期									
					短期					長期				
1	視覚障害者誘導用ブロック の改善	約 600m	継続 検討	実施時期	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
					※検討中									
	備考 進捗状況	・ 園内全域で 600mと延長が長いので、事業化（予算措置等）につ いて現時点では未定。												
		2	劣化した案内板の改修	未定	継続 検討	実施時期	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11
	※検討中													
	備考 進捗状況	・ 2 年前に触知版としての改修が予算的に困難だったため、今の形 に改修し、点字パンフレットの貸し出し（ソフト面）により対応 している。												
		3	トイレへのオストメイト用 設備の設置	未定	継続 検討	実施時期	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11
	※検討中													
	備考 進捗状況	・ 新たな下水管連結などの整備工事が必要となるため、トイレの改 修（築）時にあわせての実施となる。（改築時期未定）												
		4	トイレへのベビーチェアの 設置	未定	短期	実施時期	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11
	備考 進捗状況	・ 男女トイレの個室ブースがいずれも狭いため、多機能トイレへの 設置となる。（令和 5 年度実施に向けて計画中）												
		5	トイレの音声案内の改善	未定	短期	実施時期	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11
	備考 進捗状況													
		6	車いす使用者が利用できる 野外卓の設置	未定	長期	実施時期	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11
	※検討中													
	備考 進捗状況	・ 野外卓の劣化による更新時に合わせて実施する。（現時点で目立 った劣化は無いので、時期については今後状況を見ながらの判断 となる）												
		そ の 他				実施時期	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11
	備考 進捗状況	・												
		そ の 他				実施時期	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11
	備考 進捗状況	・												
		実施済項目												
○公園入口の車椅子が通るスペースについて、幅員の基準を満たすため車椅子ゲート中央のポールを切断し、切断面のモ ルタル仕上げを実施した。														
○色覚障がいの方のために、園内の掲示をユニバーサルカラーデザインに変更した。														
その他事項														


事業箇所図

- ◆ベビーチェアの設置
- ◆音声案内改善

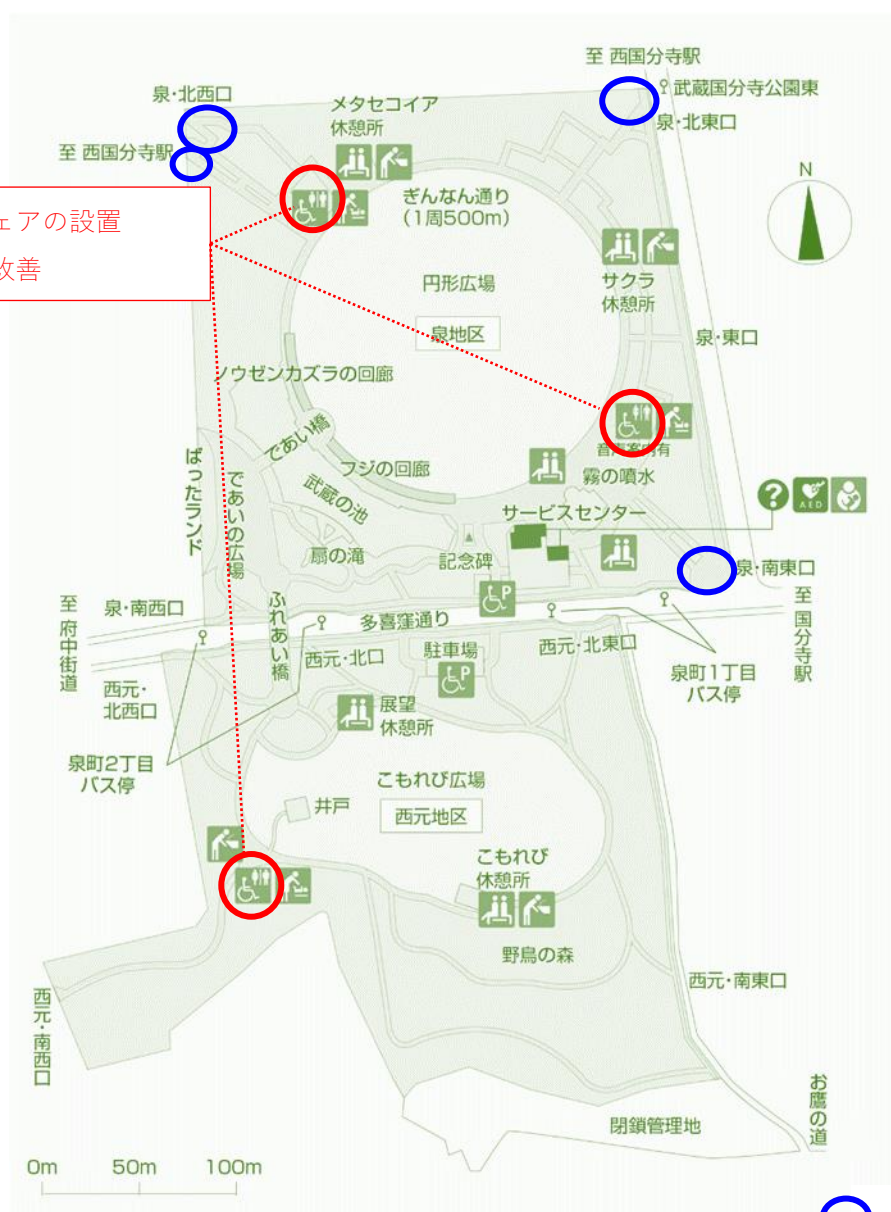

○：実施済箇所


ポール切断 実施済箇所
車椅子が通れる幅員の確保

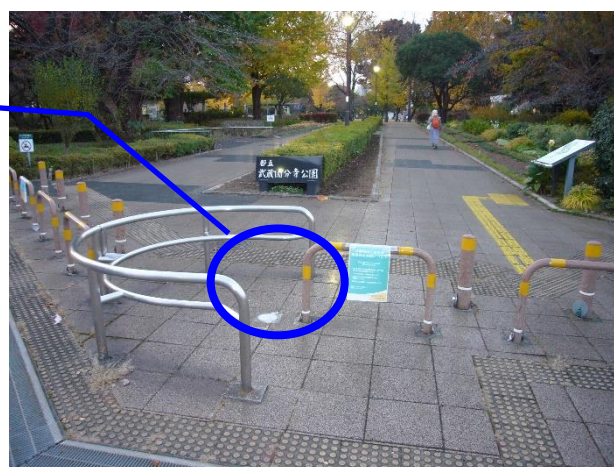

都市公園特定事業														
整備対象		都立殿ヶ谷戸庭園（開放公園区域）				対象事業者名		東京都						
事業内容・実施時期														
番号	事業内容	延長(m) 箇所数	目標 時期		実施時期									
					短期					長期				
					R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
1	車いす使用者やベビーカー 使用者が円滑に出入りできる 2 つ目の出入口の確保	14.2	短期	実施時期										
				備考 進捗状況										
2	視覚障害者誘導用ブロック の設置	14.2	短期	実施時期										
				備考 進捗状況										
3	園路にある排水溝の蓋を目 の細かいものへ交換	6	短期	実施時期										
				備考 進捗状況										
4	トイレへのオストメイト用 設備の設置	未定	継続 検討	実施時期										
				備考 進捗状況	※検討中									
5	トイレへのベビーチェアの 設置	未定	継続 検討	実施時期										
				備考 進捗状況	※検討中									
6	トイレへのベビーベッドの 設置	未定	継続 検討	実施時期										
				備考 進捗状況	※検討中									
その他	園路の段差解消		R5 年 2 月	実施時期										
				備考 進捗状況	実施済									
その他				実施時期										
				備考 進捗状況										
実施済項目														
・平成 30 年度に、女子便所の段差解消工事を行った。 ・令和 4 年度に、公園各所で園路の段差解消を行った。 （側溝と砂地面との間にあった 2 ～ 3 cm の段差を解消するため、該当箇所をアスファルトですりつける舗装を行った。また、植樹付近のインターロッキング舗装について、樹木の根の影響で段差ができていた箇所があったため、それを解消するための補修を行った。）														
その他事項														

殿ヶ谷戸庭園

実施済箇所
女子便所の段差解消

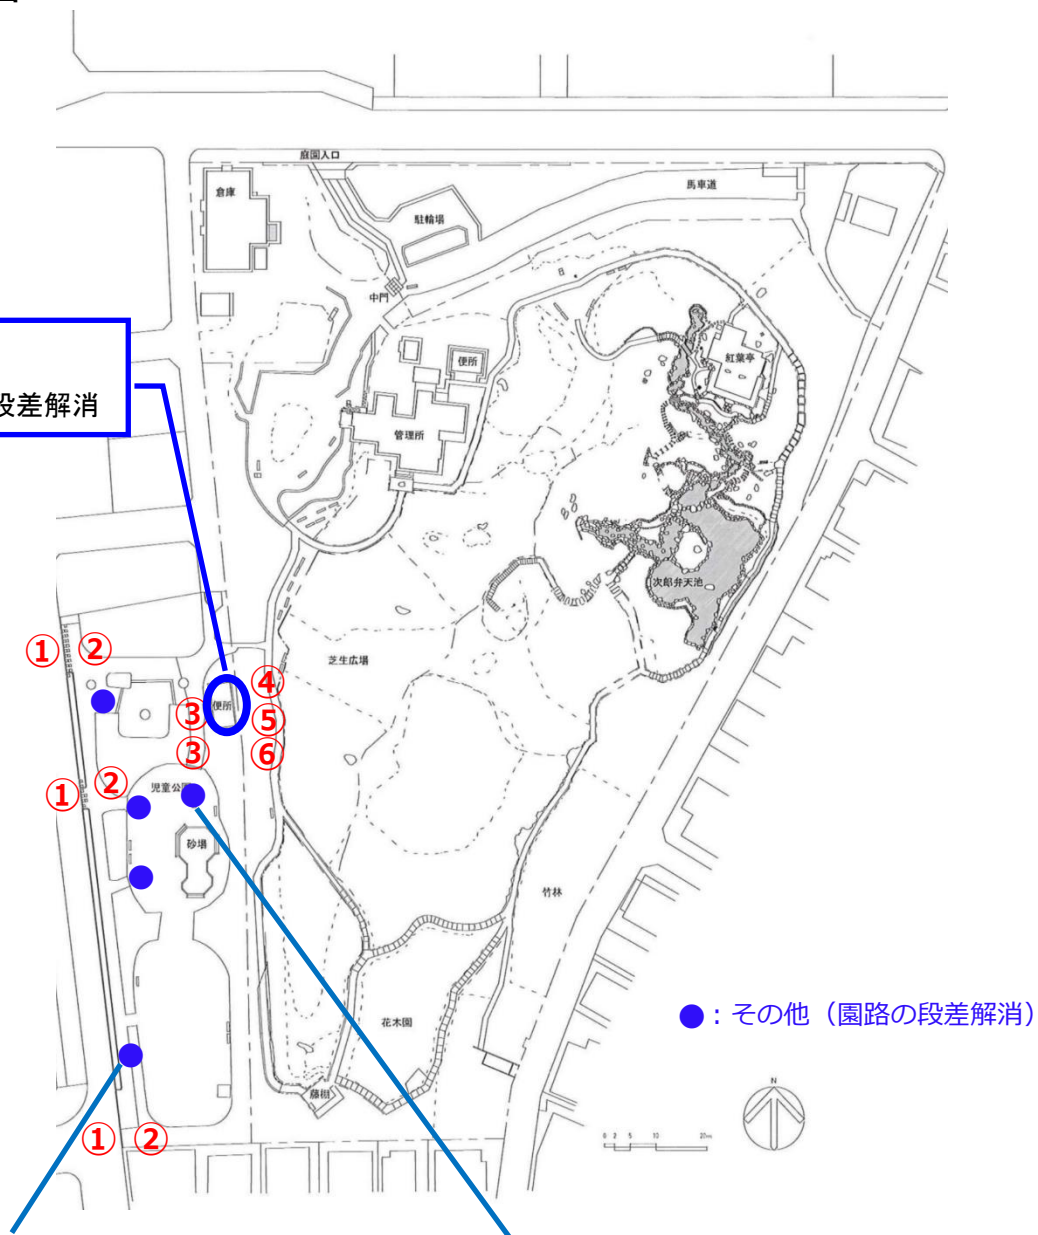

建築物特定事業														
整備対象		国分寺市案内所			対象事業者名		国分寺市							
事業内容・実施時期														
番号	事業内容	延長(m) 箇所数	目標 時期		実施時期									
					短期					長期				
					R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
1	出入口の有効幅の確保	1 か所	短期	実施時期										
				備考 進捗状況										
2	視覚障害者に配慮した出入口までの誘導案内の設置	約 4 m	短期・ 長期	実施時期										
				備考 進捗状況	管理組合等と調整し、検討する。									
3	筆談ツールの準備とその表示の設置	1 か所	短期	実施時期										
				備考 進捗状況	実施済									
その他				実施時期										
				備考 進捗状況										
実施に必要な資金額及び調達方法														
・番号 1 及び 2 については、該当箇所に共用部が含まれるため、事業実施に必要な経費等は施設の管理組合と協議の上、決定していく。														
実施済項目														
・番号 3 については、実施済み。														
その他事項														
事業箇所図														
国分寺市案内所 ③ 筆談ツールの準備とその表示の設置 ② 出入口まで誘導案内の設置 ① 出入口の有効幅の確保 国分寺駅 cocobunji WEST エレベーター エスカレーター (下り/上り) ① 出入口の有効幅の確保														

建築物特定事業														
整備対象		cocobunji プラザ			対象事業者名		国分寺市							
事業内容・実施時期														
番号	事業内容	延長(m) 箇所数	目標 時期		実施時期									
					短期					長期				
					R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
1	筆談対応を示す表示の設置	1 箇所	短期	実施時期										
				備考 進捗状況	実施済									
2				実施時期										
				備考 進捗状況										
3				実施時期										
				備考 進捗状況										
その他				実施時期										
				備考 進捗状況										
実施に必要な資金額及び調達方法														
・実施に必要な経費はなし														
実施済項目														
・番号 1 については、実施済み。														
その他事項														
事業箇所図														
<ミーツ国分寺 5階> ↑①筆談対応を示す表示 設置箇所（実施済）														

建築物特定事業														
整備対象		アクティ・ココブンジ			対象事業者名		国分寺市							
事業内容・実施時期														
番号	事業内容	延長(m) 箇所数	目標 時期		実施時期									
					短期					長期				
					R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
1	筆談対応を示す表示の設置	1 か所	短期	実施時期										
				備考 進捗状況	設置済み。									
2				実施時期										
				備考 進捗状況										
3				実施時期										
				備考 進捗状況										
その他				実施時期										
				備考 進捗状況										
実施に必要な資金額及び調達方法														
・表示の設置に関わる費用は不要。														
実施済項目														
・筆談対応を示す表示及び筆談ツールを設置済み。														
その他事項														
事業箇所図														
筆談対応を示す表示及び筆談ツールを設置  耳マーク 筆談ボード														

建築物特定事業														
整備対象		本多公民館			対象事業者名		国分寺市							
事業内容・実施時期														
番号	事業内容	延長(m) 箇所数	目標 時期		実施時期									
					短期					長期				
					R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
1	車いす使用者に対応したカウンターの設置	1 箇所	短期	実施時期										
				備考 進捗状況	カウンター設置のため、令和5年度予算へ計上									
2	トイレへの大型ベッドの設置	1 箇所	短期	実施時期										
				備考 進捗状況	・令和3年度バリアフリートイレ改修時に設置済									
3				実施時期										
				備考 進捗状況										
その他				実施時期										
				備考 進捗状況										
実施に必要な資金額及び調達方法														
・番号1について、令和5年度予算計上														
実施済項目														
・トイレへの大型ベッドの設置														
その他事項														
・トイレへの大型ベッドの設置にあわせ、トイレの適正利用について利用者への広報を実施する。														
事業箇所図														
凡例 赤：予定箇所 青：実施済箇所 ①車いす使用者に対応したカウンター設置予定箇所 ②大型ベッド設置済														

建築物特定事業														
整備対象		本多図書館			対象事業者名		国分寺市							
事業内容・実施時期														
番号	事業内容	延長(m) 箇所数	目標 時期		実施時期									
					短期					長期				
					R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
1	視覚障害者に配慮した主要な出入口から受付までの誘導案内の設置（視覚障害者誘導用ブロックの付け替え）	1 か所	短期	実施時期										
				備考 進捗状況	・実施済									
2	階段・スロープへの手すりの設置	1 か所	継続 検討	実施時期										
				備考 進捗状況	※検討中									
3				実施時期										
				備考 進捗状況										
その他				実施時期										
				備考 進捗状況										
実施に必要な資金額及び調達方法														
・必要な経費等は、事業の具体化にあわせて決定していく。 ・現状の使用状況を確認しながら、設置可能か等を検討していく。														
実施済項目														
・視覚障害者誘導用ブロック付け替え済み														
その他事項														
事業箇所図														
対面朗読室 参考資料室 閉架書庫 録音室 一般書コーナー 図書閲覧ラウンジ 中庭 本多図書館開架 カウンター 児童書コーナー 図書館事務室 おはなし室 公民館ロビー 正面玄関 風除室 おはなし室 道路 ②階段・スロープへの手すりの設置 スロープ 手すり カウンター 展示コーナー ①視覚障害者誘導用ブロックの付け替え（実施済）														

建築物特定事業														
整備対象		本多図書館駅前分館			対象事業者名		国分寺市							
事業内容・実施時期														
番号	事業内容	延長(m) 箇所数	目標 時期		実施時期									
					短期					長期				
					R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
1	筆談ツールの準備とその表示の設置	1 か所	短期	実施時期										
				備考 進捗状況	・実施済									
2				実施時期										
				備考 進捗状況										
3				実施時期										
				備考 進捗状況										
その他				実施時期										
				備考 進捗状況										
実施に必要な資金額及び調達方法														
・他館が所有している筆談ツール（ホワイトボード、マーカー、イレーサー）を移管。 ・他館カウンターで設置しているものと同様な表示を設置予定。														
実施済項目														
・令和4年度に筆談ツール及び表示を設置済														
その他事項														
・表示で筆談ツールの用意があることを案内し、利用者がカウンターで気軽に問い合わせができるよう対応を行っている。														
事業箇所図														
本多図書館駅前分館 4 階 ①筆談ツール 表 示														

建築物特定事業														
整備対象		国分寺駅北口事務所			対象事業者名		国分寺市							
事業内容・実施時期														
番号	事業内容	延長(m) 箇所数	目標 時期		実施時期									
					短期					長期				
					R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
1	道路から出入口までの経路 の段差解消	1 箇所	継続 検討	実施時期	※検討中									
				備考 進捗状況	・ ※市役所移転を見据え、実施の可否等を調整していく。									
2	視覚障害者に配慮した道路 から窓口までの誘導案内の 設置	約 40m	継続 検討	実施時期	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
				備考 進捗状況	※検討中 ・ ※市役所移転を見据え、実施の可否等を調整していく。									
3	階段上端部への点状ブロッ クの設置	1 箇所	継続 検討	実施時期	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
				備考 進捗状況	※検討中 ・ ※市役所移転を見据え、実施の可否等を調整していく。									
4	階段への手すりの設置	1 箇所	継続 検討	実施時期	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
				備考 進捗状況	※検討中 ・ ※市役所移転を見据え、実施の可否等を調整していく。									
5	筆談ツールの準備とその表 示の設置	1 箇所	短期	実施時期	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
				備考 進捗状況	・ 筆談ツール及びその表示の設置済。									
6	車いす使用者用トイレの設 置	1 箇所	継続 検討	実施時期	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
				備考 進捗状況	※検討中 ・ ※市役所移転を見据え、実施の可否等を調整していく。									
そ の 他				実施時期	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
				備考 進捗状況										
実施に必要な資金額及び調達方法														
・ 実施内容を含め、必要な経費等は事業の具体化にあわせて決定していく。														
実施済項目														
・ 番号 5 筆談ツール及びその表示の設置。														
その他事項														

事業箇所図

筆談ツール（設置済）

筆談ツール設置表示（設置済）



建築物特定事業

整備対象	本町・南町地域センター	対象事業者名	国分寺市
------	-------------	--------	------

事業内容・実施時期

番号	事業内容	延長(m) 箇所数	目標 時期		実施時期									
					短期					長期				
					R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
1	視覚障害者に配慮した道路から出入口までの誘導案内の設置	1 箇所	長期	実施時期										
				備考 進捗状況	・公共施設個別施設計画実施に合わせて設置予定 ・マンション管理組合の所有地であるため、協議を要する。									
2	筆談ツールの準備とその表示の設置	1 箇所	短期	実施時期										
				備考 進捗状況	・筆談ツール設置済み。									
3	トイレへのオストメイト用設備の設置	1 箇所	短期	実施時期										
				備考 進捗状況	・公共施設個別施設計画実施に合わせて設置予定									
4	トイレへのベビーチェアの設置	1 箇所	短期	実施時期										
				備考 進捗状況	・公共施設個別施設計画実施に合わせて設置予定									

実施に必要な資金額及び調達方法

・公共施設個別施設計画実施に合わせて適宜、実施する。


実施済項目

・筆談ツールの設置。

その他事項

・番号1については、マンション管理組合の所有地に設置する必要があるため、協議を要する。

事業箇所図

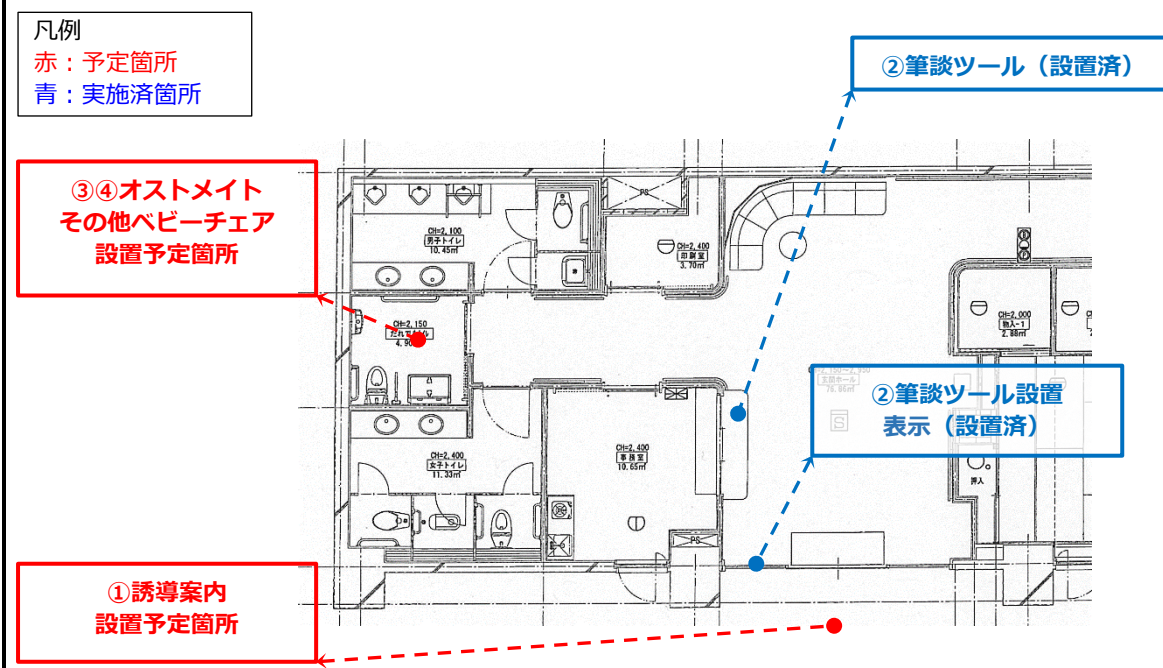

建築物特定事業														
整備対象		第七小学校			対象事業者名		国分寺市							
事業内容・実施時期														
番号	事業内容	延長(m) 箇所数	目標 時期		実施時期									
					短期					長期				
					R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
1	道路から主要な出入口までの経路の段差解消	未定	短期	実施時期										
				備考 進捗状況	・令和5, 6年度で実施する校舎増築工事で段差を解消する									
2	排水溝の蓋を目の細かいものへ交換	未定	短期	実施時期										
				備考 進捗状況	・修繕実施の緊急度等を勘案し、対応を検討									
3	主要な出入口から受付までの経路の段差解消	未定	継続 検討	実施時期	※検討中									
				備考 進捗状況	・市全体の学校施設に係るバリアフリー化計画や学校施設更新時に対応を検討									
4	エレベーターの設置	1 箇所	短期	実施時期										
				備考 進捗状況	・令和5, 6年度で実施する校舎増築工事で増築校舎内に設置									
5	階段上端部への点状ブロックの設置	未定	短期	実施時期										
				備考 進捗状況	・令和5, 6年度で実施する校舎増築工事で増築校舎内に設置									
6	視覚障害者に配慮した道路から受付までの誘導案内の設置	未定	継続 検討	実施時期	※検討中									
				備考 進捗状況	・市全体の学校施設に係るバリアフリー化計画や学校施設更新時に対応を検討									
7	筆談ツールの準備	1 箇所	短期	実施時期										
				備考 進捗状況	・早期に実施予定									
その他				実施時期										
				備考 進捗状況	・									
実施に必要な資金額及び調達方法														
・事業実施に必要な経費等は、庁内で協議していく。														
実施済項目														
・筆談対応の表示済み														
その他事項														

事業箇所図



⑤階段上端部への点状ブロックの設置予定箇所



⑦筆談ツールの準備予定箇所（表示は設置済）

建築物特定事業														
整備対象		第二中学校			対象事業者名		国分寺市							
事業内容・実施時期														
番号	事業内容	延長(m) 箇所数	目標 時期		実施時期									
					短期					長期				
					R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
1	道路から主要な出入口までの経路の段差解消	未定	継続 検討	実施時期	※検討中									
				備考 進捗状況	・市全体の学校施設に係るバリアフリー化計画や学校施設更新時に 対応を検討									
2	排水溝の蓋を目の細かいものへ交換	未定	短期	実施時期	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
				備考 進捗状況	・修繕実施の緊急度等を勘案し、対応を検討									
3	視覚障害者に配慮した道路から受付までの誘導案内の設置	未定	継続 検討	実施時期	※検討中									
				備考 進捗状況	・市全体の学校施設に係るバリアフリー化計画や学校施設更新時に 対応を検討									
4	エレベーターの設置	1 箇所	継続 検討	実施時期	※検討中									
				備考 進捗状況	・市全体の学校施設に係るバリアフリー化計画や学校施設更新時に 対応を検討									
5	筆談ツールの準備	1 箇所	短期	実施時期	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
				備考 進捗状況	・早期に実施予定									
その他				実施時期	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
				備考 進捗状況										
実施に必要な資金額及び調達方法														
・事業実施に必要な経費等は、庁内で協議していく。														
実施済項目														
・筆談対応の表示済み														
その他事項														
事業箇所図														
 ①道路から主要な出入口までの経路の段差箇所  ⑤筆談ツールの準備予定箇所（表示は設置済）														

建築物特定事業														
整備対象		第四小学校			対象事業者名		国分寺市							
事業内容・実施時期														
番号	事業内容	延長(m) 箇所数	目標 時期		実施時期									
					短期					長期				
					R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
1	筆談ツールの準備とその表示の設置	1 箇所	短期	実施時期										
				備考 進捗状況	・ 早期に実施予定									
2	トイレへのオストメイト用設備の設置	1 箇所	長期	実施時期										
				備考 進捗状況	・ 令和 11 年度、大規模改造工事の設計において設置検討									
3	トイレへのベビーチェアの設置	1 箇所	長期	実施時期										
				備考 進捗状況	・ 令和 11 年度、大規模改造工事の設計において設置検討									
4	トイレへのベビーベッドの設置	1 箇所	長期	実施時期										
				備考 進捗状況	・ 令和 11 年度、大規模改造工事の設計において設置検討									
その他				実施時期										
				備考 進捗状況										
実施に必要な資金額及び調達方法														
・ 事業実施に必要な経費等は、庁内で協議していく。														
実施済項目														
・ 道路から主要な出入口までの段差解消済み（スロープあり）。 ・ 視覚障害者誘導用ブロック設置済み ・ エレベーター設置済														
その他事項														
事業箇所図														
 道路から主要な出入口までの経路の段差解消済み  視覚障害者誘導用ブロック設置済み														

建築物特定事業														
整備対象		本多児童館			対象事業者名		国分寺市							
事業内容・実施時期														
番号	事業内容	延長(m) 箇所数	目標 時期		実施時期									
					短期					長期				
					R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
1	視覚障害者に配慮した道路から出入口までの誘導案内の設置	1ヶ所	継続 検討	実施時期										
				備考 進捗状況	※検討中 ・本多児童館長寿命化大規模修繕の具体化にあわせて決定していく。									
2	階段上端部への点状ブロックの設置	1ヶ所	短期	実施時期										
				備考 進捗状況										
3	筆談対応を示す表示の設置	1ヶ所	短期	実施時期										
				備考 進捗状況	実施済									
4	車いす使用者用トイレの改修	1ヶ所	継続 検討	実施時期										
				備考 進捗状況	※検討中 ・本多児童館長寿命化大規模修繕の具体化にあわせて決定していく。									
その他				実施時期										
				備考 進捗状況										
実施に必要な資金額及び調達方法														
・本多児童館長寿命化大規模修繕の具体化にあわせて決定していく。														
実施済項目														
・筆談対応を示す表示の設置														
その他事項														
事業箇所図														
凡例 赤：予定箇所 青：実施済箇所 1階 育成室 湯沸室 事務室 出入口 遊戯室 ④車いす使用者用トイレの改修 女子トイレ 男子トイレ みんなのトイレ 2階 図工室 図書室 女子トイレ 男子トイレ 音楽室 幼児室 待機トイレ 授乳室 バルコニー ③筆談対応を示す表示 ①視覚障害者に配慮した道路から出入口までの誘導案内の設置 ②階段上端部への点状ブロックの設置														

建築物特定事業														
整備対象		地域包括支援センターほんだ		対象事業者名		国分寺市								
事業内容・実施時期														
番号	事業内容	延長(m) 箇所数	目標 時期		実施時期									
					短期					長期				
					R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
1	視覚障害者に配慮した出入口から受付までの誘導案内の設置	未定	継続 検討	実施時期										
				備考 進捗状況	※検討中 ・関係団体等と調整し検討する。									
2	筆談対応を示す表示の設置	1 か所	短期	実施時期										
				備考 進捗状況	・筆談対応を示す表示を窓口カウンターに設置した。									
				実施時期										
				備考 進捗状況	・									
その他				実施時期										
				備考 進捗状況	・									
実施に必要な資金額及び調達方法														
・実施内容を含め、必要な経費等は関係団体等と調整のうえ事業の具体化にあわせて決定していく。														
実施済項目														
・建物入り口部分及び階段の視覚障害者誘導用ブロック設置、車いす対応エレベーター設置（音声案内有り）、建物内の段差解消、車いす使用者用トイレ設置、車いす使用者用駐車場設置、筆談用具設置、筆談対応を示す表示の設置														
その他事項														
事業箇所図														
②筆談対応を示す表示の設置箇所														
														

建築物特定事業														
整備対象		地域生活支援センタープラッツ		対象事業者名		社会福祉法人はらからの家福祉会								
事業内容・実施時期														
番号	事業内容	延長(m) 箇所数	目標 時期		実施時期									
					短期					長期				
					R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
1	道路から出入口までの経路 の段差解消	5m	継続 検討	実施時期	※検討中									
				備考 進捗状況	・※施設改修の実施時期に合わせて検討する。									
2	筆談ツールの準備とその表 示の設置	1 箇所	短期	実施時期	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
				備考 進捗状況	・令和4年度内に設置を行った。									
3				実施時期	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
				備考 進捗状況	・									
その他				実施時期	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
				備考 進捗状況	・									
実施に必要な資金額及び調達方法														
・必要な経費等は事業の具体化にあわせて決定していく。														
実施済項目														
・出入口の幅は確保済、階段に手すりを設置済。 ・筆談ツールを設置済														
その他事項														
・歩道の勾配の改善は、周辺設備等の修繕との調整を行いながら進める。														
事業箇所図														

建築物特定事業														
整備対象		東部拠点地区親子ひろば 「BOUKEN たまご」			対象事業者名		国分寺市							
事業内容・実施時期														
番号	事業内容	延長(m) 箇所数	目標 時期		実施時期									
					短期					長期				
					R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
1	出入口の有効幅の確保	1 箇所	継続 検討	実施時期	※検討中									
				備考 進捗状況	・施設改修等の機会を捉え、実施を検討。(建物所有者との調整が必要)									
2	視覚障害者に配慮した道路 から出入口までの誘導案内 の設置	1 箇所	継続 検討	実施時期	※検討中									
				備考 進捗状況	・施設改修等の機会を捉え、実施を検討。(建物所有者との調整が必要)									
3	筆談ツールの準備とその表 示の設置	1 箇所	短期	実施時期	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
				備考 進捗状況	実施済									
そ の 他				実施時期	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
				備考 進捗状況										
実施に必要な資金額及び調達方法														
・番号1および番号2に係る必要な経費等は、事業の状況にあわせて決定予定。														
実施済項目														
令和4年度に、3筆談ツールの準備とその表示の設置を実施済 親子ひろば出入り口に筆談ノートを配置した。また、外から見える位置に、筆談マークを表示した。														
その他事項														
実施内容														
③筆談ボードを配備するとともに、ひろば出入口付近に筆談マークを表示した。														
③筆談マーク表示箇所   														


建築物特定事業														
整備対象		国分寺南町診療所			対象事業者名		医療法人社団 福仁会							
事業内容・実施時期														
番号	事業内容	延長(m) 箇所数	目標 時期		実施時期									
					短期					長期				
					R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
1	道路からの出入口までの経路の 段差解消	1 箇所	継続 検討	実施時期										
				備考 進捗状況	※継続検討中									
2	視覚障害者に配慮した道路から 受付までの誘導案内の設置	1 箇所	継続 検討	実施時期										
				備考 進捗状況	※継続検討中									
3	車いす使用者に対応したカウンターの設置	1 箇所	継続 検討	実施時期										
				備考 進捗状況	※継続検討中									
4	筆談ツールの準備とその表示の設置	1 箇所	短期	実施時期										
				備考 進捗状況	・人的対応している									
5	トイレへのオストメイト用設備の設置	1 箇所	継続 検討	実施時期										
				備考 進捗状況	※車いす対応の改裝見積り中									
6	トイレへのベビーチェアの設置	1 箇所	継続 検討	実施時期										
				備考 進捗状況	※検討中									
7	トイレへのベビーベッドの設置	1 箇所	継続 検討	実施時期										
				備考 進捗状況	※検討中									
8	階段上端部への点状ブロックの設置	1 箇所	継続 検討	実施時期										
				備考 進捗状況	※検討中									
その他				実施時期										
				備考 進捗状況										
実施に必要な資金額及び調達方法														
実施済項目														
その他事項														

事業箇所図

④筆談ツールの準備とその表示の設置予定箇所




建築物特定事業														
整備対象		セレオ国分寺		対象事業者名		株式会社 JR 中央線コミュニティデザイン								
事業内容・実施時期														
番号	事業内容	延長(m) 箇所数	目標 時期		実施時期									
					短期					長期				
					R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
1	視覚障害者に配慮した誘導案内の設置	2～4 か所	継続 検討	実施時期	※検討中									
				備考 進捗状況	・将来的な大規模改修工事などに合わせ、誘導ブロックを設置する場合の誘導先や、音声案内については今後検討していきます。 ・セレオ国分寺に面した駅コンコースの床は、一部を除き JR 様の財産である為、誘導用ブロック等を設置する場合は別途協議が必要となります。 ・西側エリアは貸付範囲となり床仕上が丸井様財産である為、別途協議が必要となります。									
2	階段上端部への点状ブロックの設置	2 か所	継続 検討	実施時期	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
				備考 進捗状況	※検討中									
3				実施時期	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
				備考 進捗状況	・									
その他				実施時期	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
				備考 進捗状況	・									
実施に必要な資金額及び調達方法														
実施済項目														
・バリアフリートイレ、8F オストメイト、介助用ベットの設置 ・ベビーシート、ベビーチェア、授乳室の設置 ・貸出用ベビーカーの設置 ・子供用トイレの設置 ・社員のサービス介助士取得 ・手話でのあいさつを社員が勉強														
その他事項														
・視覚障害者誘導用ブロックの設置は周辺施設・設備所有者との調整を行いながら進める														

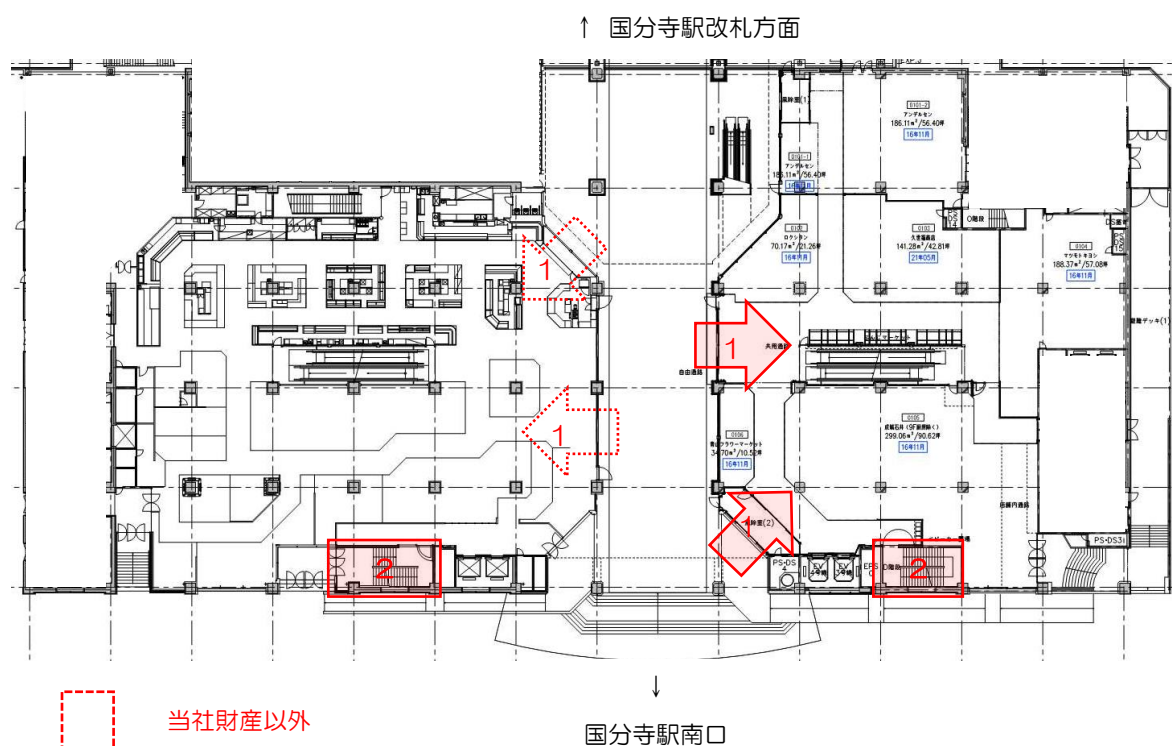

①視覚障害者誘導用ブロックの設置位置の例



②点状ブロック設置の設置位置の例

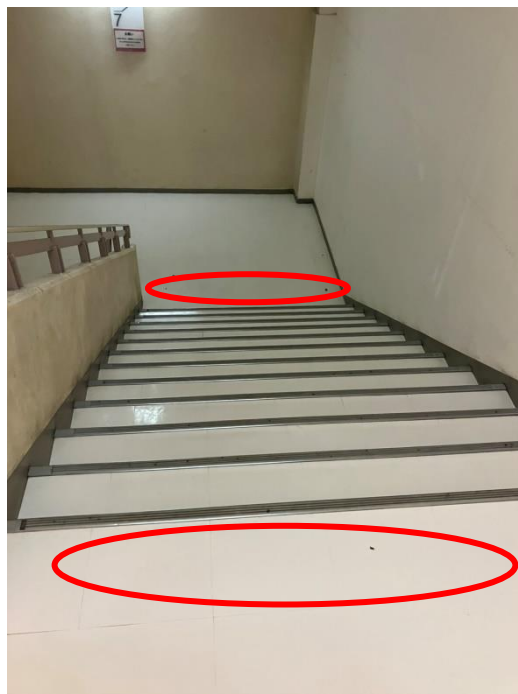

建築物特定事業														
整備対象		西友国分寺店			対象事業者名		合同会社西友							
事業内容・実施時期														
番号	事業内容	延長(m) 箇所数	目標 時期		実施時期									
					短期					長期				
					R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
1	視覚障害者に配慮した道路からサービスカウンターまでの誘導案内の設置	未定	継続 検討	実施時期										
				備考 進捗状況	※検討中 ・社内本部や関係者と調整し、実施時期を調整していく。									
2	車いす使用者に対応したカウンターの設置	未定	継続 検討	実施時期										
				備考 進捗状況	※検討中 ・社内本部や関係者と調整し、実施時期を調整していく。									
3	筆談ツールの準備とその表示の設置	1箇所	短期	実施時期										
				備考 進捗状況	R5年度までに準備しスタート予定 ・社内本部や関係者と調整し、実施時期を調整していく。									
4	階段上端部への点状ブロックの設置	未定	継続 検討	実施時期										
				備考 進捗状況	※検討中 ・社内本部や関係者と調整し、実施時期を調整していく。									
5	車いす使用者用トイレの設置	未定	継続 検討	実施時期										
				備考 進捗状況	※検討中 ・社内本部や関係者と調整し、実施時期を調整していく。									
6	トイレへのオストメイト用設備の設置	未定	継続 検討	実施時期										
				備考 進捗状況	※検討中 ・社内本部や関係者と調整し、実施時期を調整していく。									
7	トイレへのベビーベッドの設置	未定	継続 検討	実施時期										
				備考 進捗状況	※検討中 ・社内本部や関係者と調整し、実施時期を調整していく。									
その他				実施時期										
				備考 進捗状況										
実施に必要な資金額及び調達方法														
・事業実施に必要な経費等は、社内において協議をしていく。														
実施済項目														
・主要な出入り口や店内通路の幅は確保されている。 ・施設全体を案内する案内板設置済み														
その他事項														

事業箇所図

③サービスカウンターにホワイトボードを常時用意予定



建築物特定事業

整備対象	みずほ銀行国分寺支店	対象事業者名	株式会社みずほ銀行
------	------------	--------	-----------

事業内容・実施時期

番号	事業内容	延長(m) 箇所数	目標 時期		実施時期									
					短期					長期				
					R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
1	階段上端部への点状ブロックの設置	2 か所	短期	実施時期										
				備考 進捗状況	・設置済み									
2				実施時期										
				備考 進捗状況										
3				実施時期										
				備考 進捗状況										
その他				実施時期										
				備考 進捗状況										

実施に必要な資金額及び調達方法


- ・事業実施に必要な経費は社内経費で完了

実施済項目

- ・支店入店口にスロープの設置
- ・営業フロアへのエレベータ設置
- ・支店入口から営業フロアへの階段に点状ブロック設置

その他事項

事業箇所図

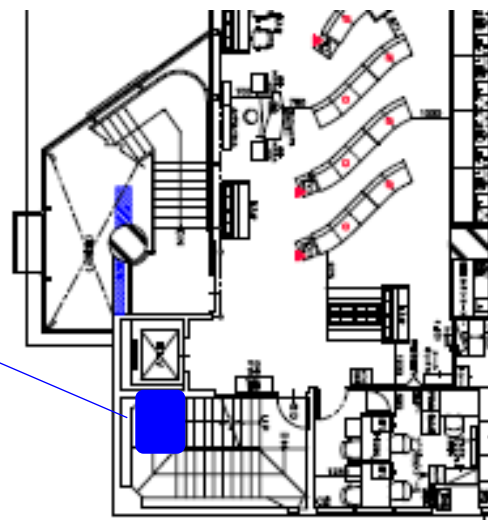

①階段上端部への点状ブロックの設置（設置済）

建築物特定事業

整備対象	多摩信用金庫 国分寺支店	対象事業者名	多摩信用金庫
------	--------------	--------	--------

事業内容・実施時期

番号	事業内容	延長(m) 箇所数	目標 時期		実施時期									
					短期					長期				
					R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
1	視覚障害者に配慮した道路から受付案内までの誘導案内の実施	1 か所	継続 検討	実施時期										
				備考 進捗状況	※検討中									
2				実施時期										
				備考 進捗状況										
3				実施時期										
				備考 進捗状況										
その他				実施時期										
				備考 進捗状況										

実施に必要な資金額及び調達方法

--

実施済項目

--

その他事項

出入口から受付（ロビーフロア）のフロアにロビー担当者を配置しています。A T Mの操作方法や受付までのご案内等を行っており、障がい者も安心してご利用いただけるよう、配慮しております。

事業箇所図

①視覚障害者に配慮した誘導案内の設置予定箇所



建築物特定事業

整備対象	多摩信用金庫 国分寺南口支店	対象事業者名	多摩信用金庫
------	----------------	--------	--------

事業内容・実施時期

番号	事業内容	延長(m) 箇所数	目標 時期		実施時期									
					短期					長期				
					R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
1	視覚障害者に配慮した道路から受付までの誘導案内の設置	未定	継続 検討	実施時期										
				備考 進捗状況	※検討中 ・検討中									
2				実施時期										
				備考 進捗状況										
3				実施時期										
				備考 進捗状況										
その他				実施時期										
				備考 進捗状況										

実施に必要な資金額及び調達方法

--

実施済項目

--

その他事項

出入口から受付（ロビーフロア）のフロアにロビー担当者を配置しています。A T Mの操作方法や受付までのご案内等を行っており、障がい者も安心してご利用いただけるよう、配慮しております。

事業箇所図



建築物特定事業														
整備対象		国分寺本町郵便局			対象事業者名		日本郵便株式会社							
事業内容・実施時期														
番号	事業内容	延長(m) 箇所数	目標 時期		実施時期									
					短期					長期				
					R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
1	道路から出入口までの経路 の段差解消	1 箇所	継続 検討	実施時期	※検討中									
				備考 進捗状況	・関係各所と早期実現に向けて鋭意調整中									
2	筆談ツールの準備とその表 示の設置	2 台	短期	実施時期	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
				備考 進捗状況	・令和4年4月、準備完了。									
3				実施時期	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
				備考 進捗状況										
その他				実施時期	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
				備考 進捗状況										
実施に必要な資金額及び調達方法														
実施済項目														
・自動ドアの設置。点字ブロックの設置。窓口ローカウンター設置。段差解消の為、簡易スロープ設置。														
その他事項														
事業箇所図														
②筆談表示（設置済）  窓口ローカウンター設置 														

建築物特定事業														
整備対象		国分寺南郵便局			対象事業者名		日本郵便株式会社							
事業内容・実施時期														
番号	事業内容	延長(m) 箇所数	目標 時期		実施時期									
					短期					長期				
					R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
1	視覚障害者に配慮した道路から受付までの誘導案内の設置	1 箇所	継続 検討	実施時期										
				備考 進捗状況										
2	出入口の有効幅の確保	1 箇所	継続 検討	実施時期										
				備考 進捗状況										
3	車いすの使用者に対応したカウンターの設置	1 箇所	継続 検討	実施時期										
				備考 進捗状況										
4	筆談ツールの準備とその表示の設置	1 箇所	短期	実施時期										
				備考 進捗状況	実施済									
5	階段上端部への点状ブロックの設置	1 箇所	継続 検討	実施時期										
				備考 進捗状況										
その他				実施時期										
				備考 進捗状況										
実施に必要な資金額及び調達方法														
・事業実施に必要な経費等は、社内において協議をしていく。														
実施済項目														
・筆談ツールの準備と表示の設置。														
その他事項														

事業箇所図


②出入口の有効幅の確保



④筆談ツールの準備とその表示
の設置（設置済）




⑤階段上端部への点状ブロック
の設置

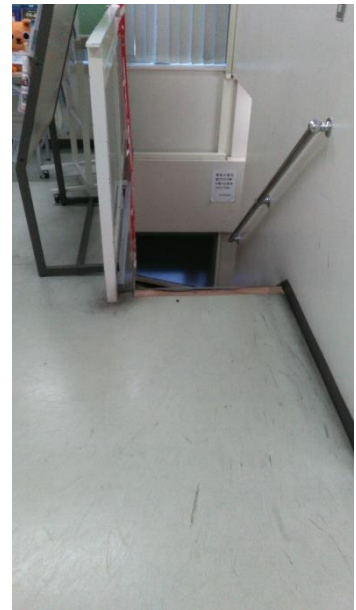

建築物特定事業														
整備対象		J R東日本ホテルメッツ国分寺		対象事業者名		株式会社 J R中央線コミュニティデザイン 日本ホテル株式会社								
事業内容・実施時期														
番号	事業内容	延長(m) 箇所数	目標 時期		実施時期									
					短期					長期				
					R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
1	視覚障害者に配慮した道路から受付までの誘導案内の設置	未定	継続 検討	実施時期	※検討中									
				備考 進捗状況	※権利者等と調整し、検討する。									
2	階段上端部への点状ブロックの設置	未定	継続 検討	実施時期	※検討中									
				備考 進捗状況	※権利者等と調整し、検討する。									
3	車いす使用者に対応したカウンターの設置	1	継続 検討	実施時期	※検討中									
				備考 進捗状況	※改修のタイミングに合わせて、検討する。									
4	筆談対応を示す表示の設置	1	短期	実施時期	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
				備考 進捗状況	・案内表示を掲示。iPad 筆談アプリで対応。									
5	車いす使用者用トイレの設置	1	継続 検討	実施時期	※検討中									
				備考 進捗状況	※改修のタイミングに合わせて、検討する。									
6	トイレへのオストメイト用設備の設置	1	継続 検討	実施時期	※検討中									
				備考 進捗状況	※改修のタイミングに合わせて、検討する。									
7	トイレへのベビーチェアの設置	1	継続 検討	実施時期	※検討中									
				備考 進捗状況	※改修のタイミングに合わせて、検討する。									
8	トイレへのベビーベッドの設置	1	継続 検討	実施時期	※検討中									
				備考 進捗状況	※改修のタイミングに合わせて、検討する。									
その他				実施時期	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
				備考 進捗状況										
実施に必要な資金額及び調達方法														
・事業実施時に検討する。														
実施済項目														
・筆談対応を示す表示の設置														
その他事項														

④筆談表示設置箇所（設置済）

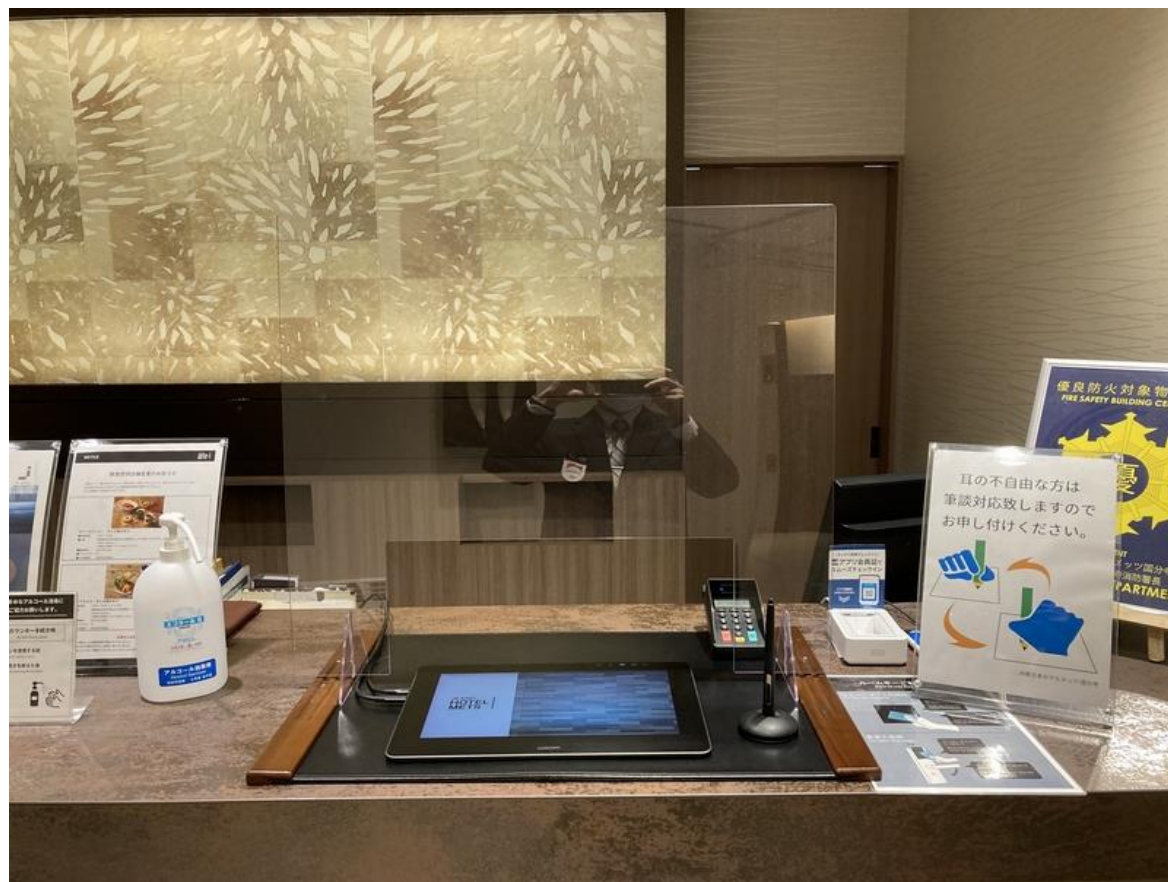


交通安全特定事業														
事業対象		生活関連経路		対象事業者名		東京都公安委員会								
事業内容・実施時期														
番号	事業内容	延長(m) 箇所数	目標 時期		実施時期									
					短期					長期				
					R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
1	バリアフリー対応型信号機（音響式、経過時間表示付き等）の整備	未定	短期・長期	実施時期										
				備考 進捗状況	・順次実施予定（整備済箇所所有。実施済項目欄及び実施内容欄参照）									
2	エスコートゾーンの整備	未定	短期・長期	実施時期										
				備考 進捗状況	・順次実施予定									
3	道路標識及び道路標示の高輝度化	未定	短期・長期	実施時期										
				備考 進捗状況	・適切な補修等を継続的に実施（高輝度化は実施済）									
4	違法駐車車両の指導取締り等	—	短期・長期	実施時期										
				備考 進捗状況	・継続的に実施									
その他	「交通安全特定事業計画国分寺駅周辺地区」を策定	—	短期	実施時期										
				備考 進捗状況	「交通安全特定事業を実施する道路の区間」や「特定事業の実施に際し配慮すべき重要事項」等、より詳細な特定事業計画を策定した									
実施済項目														
- 別紙1－③（南町二丁目交差点）のバリアフリー対応型信号機について、実施済箇所所有。 - 別紙1 バリアフリー対応型信号機の設置予定箇所図の3箇所について、バリアフリー対応型信号機の設置済。														
 														
その他事項														
実施内容、写真、参考資料等														
※実施内容は別紙に示す														


別紙

1. バリアフリー対応型信号機（音響式、経過時間表示付き等）の整備


バリアフリー対応型信号機の設置予定箇所図

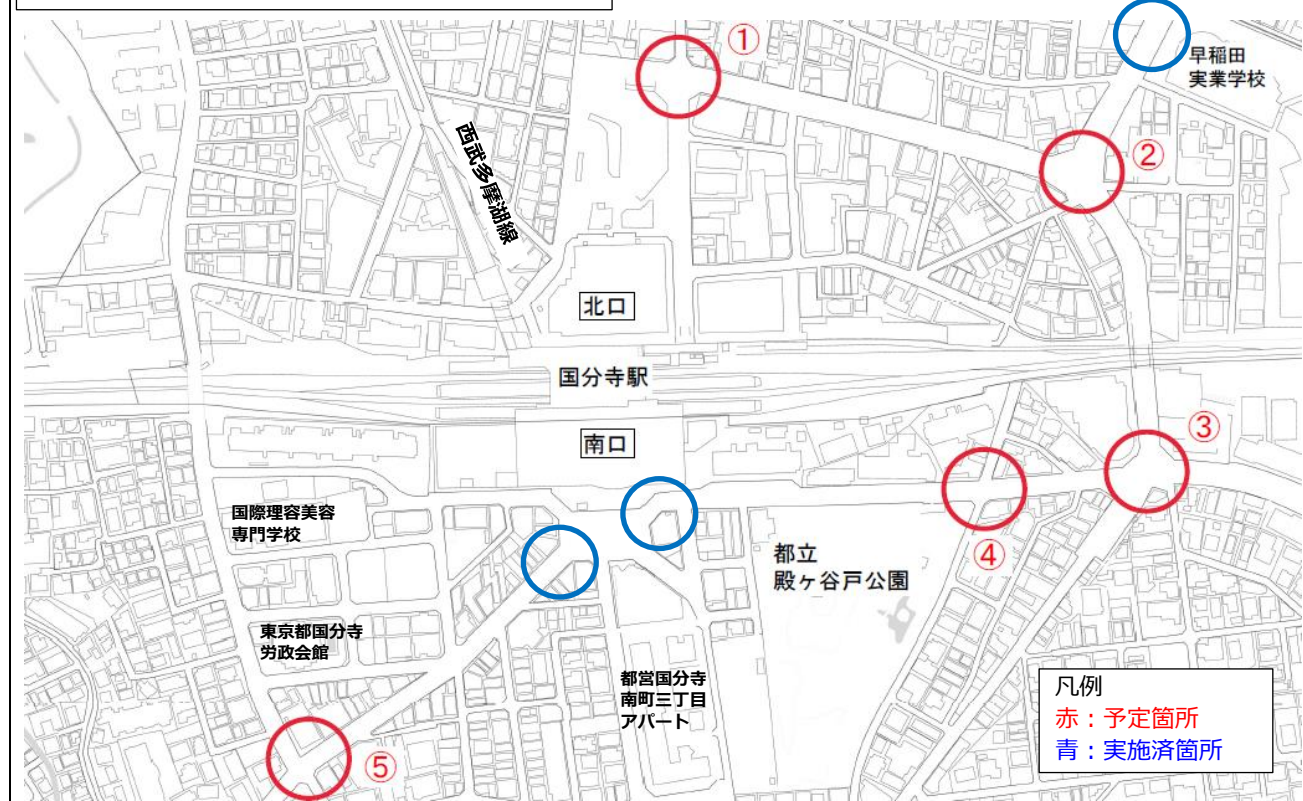


①本町二丁目交差点

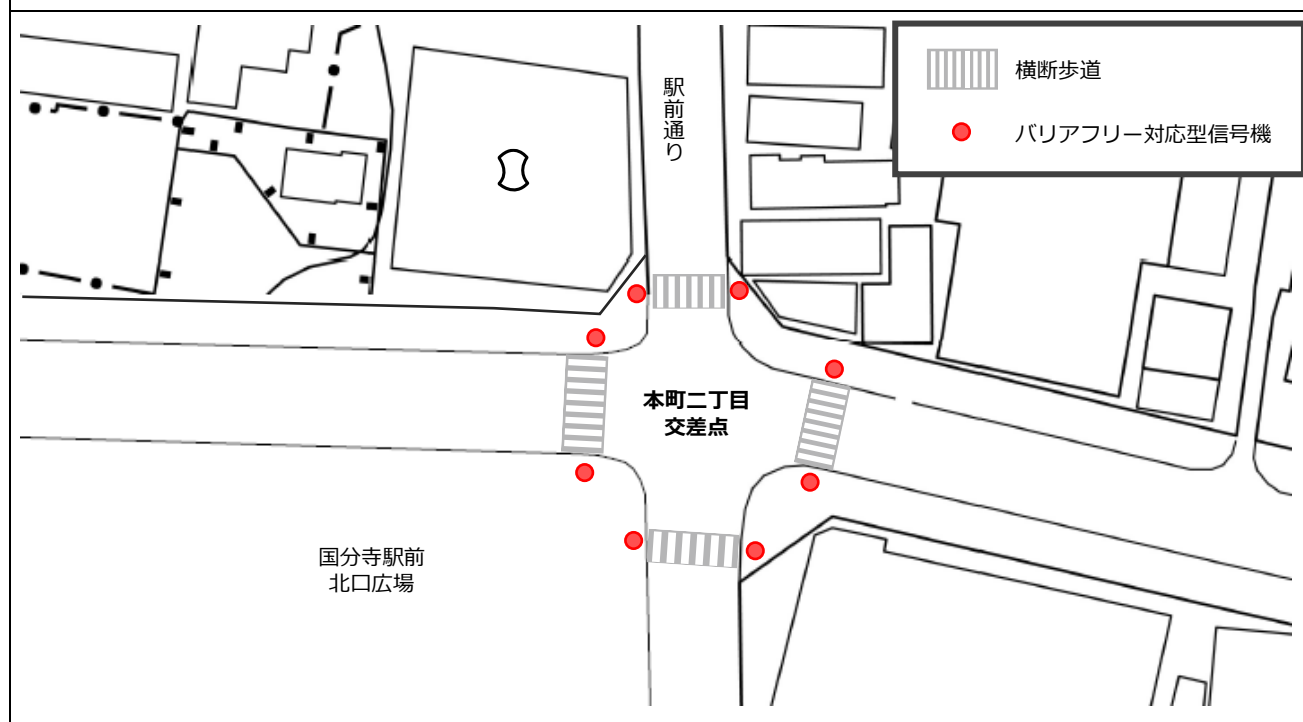


②国分寺本町一丁目交差点

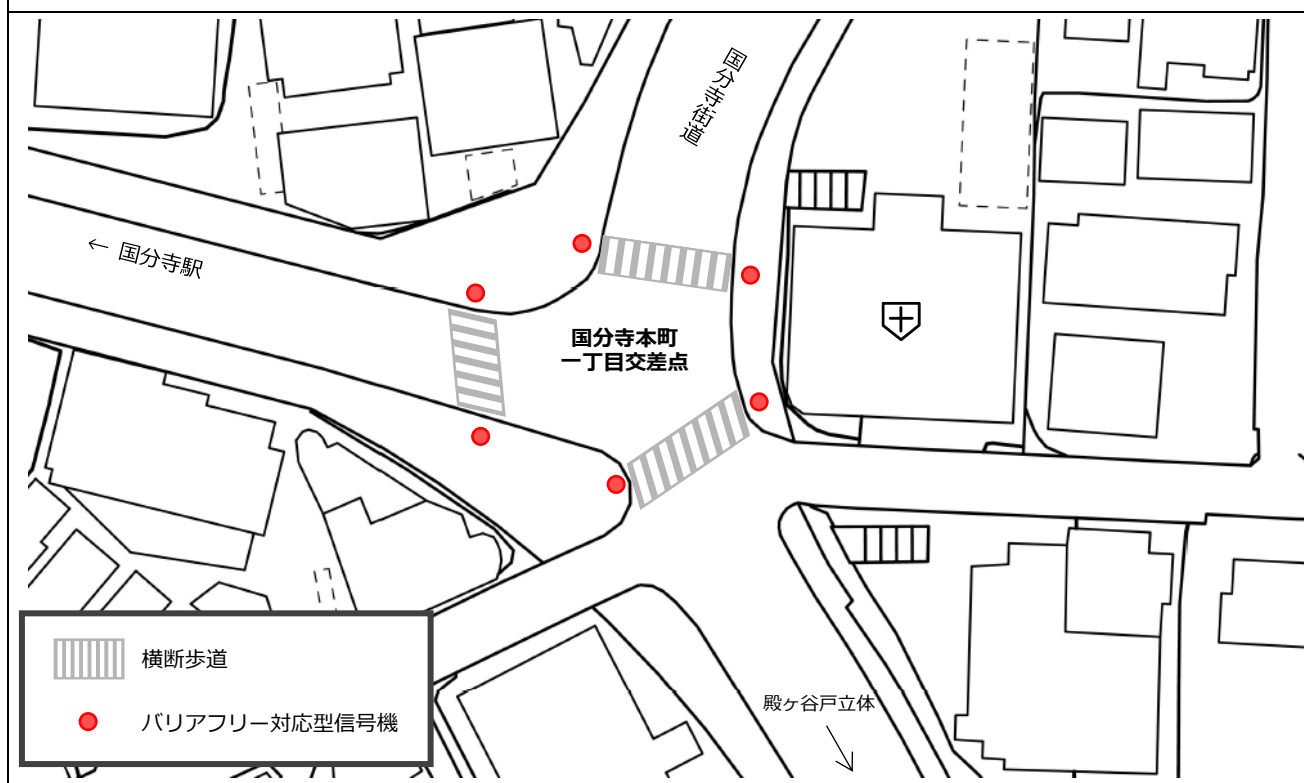


③南町二丁目交差点

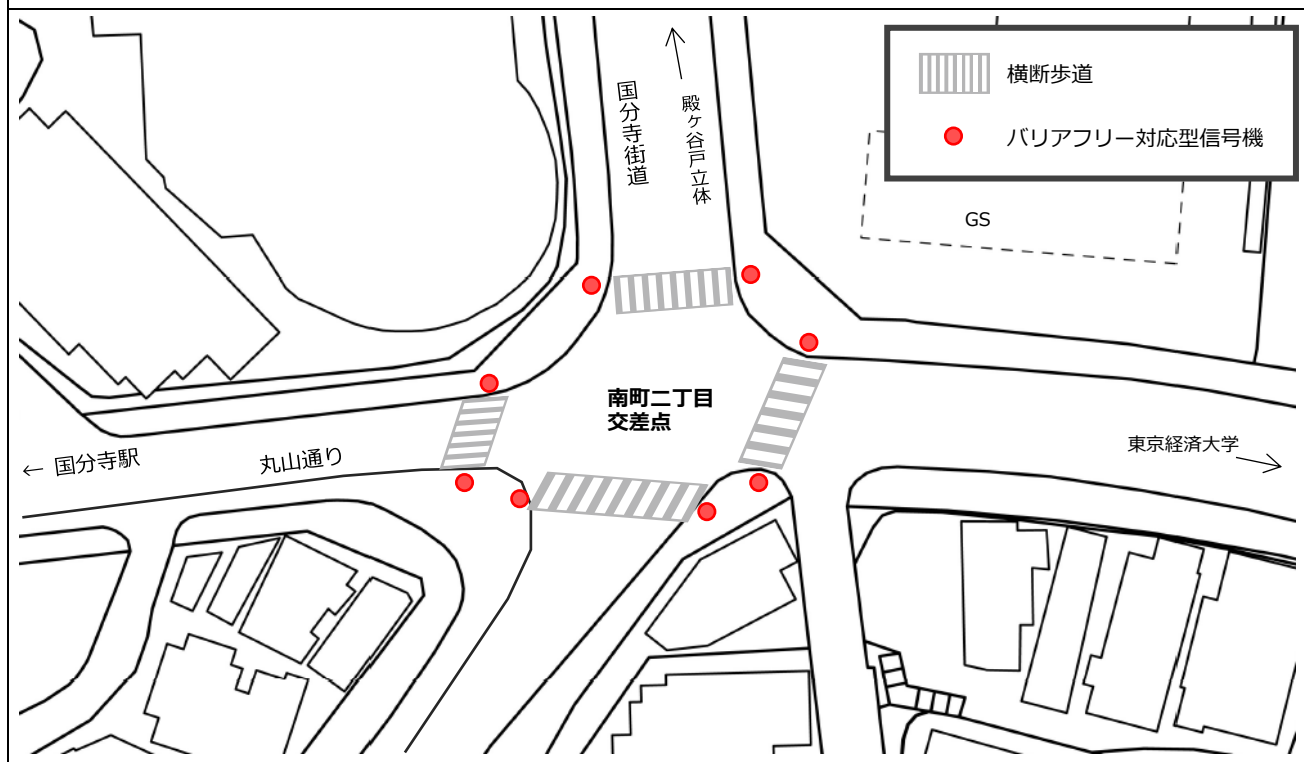

④丸山通り

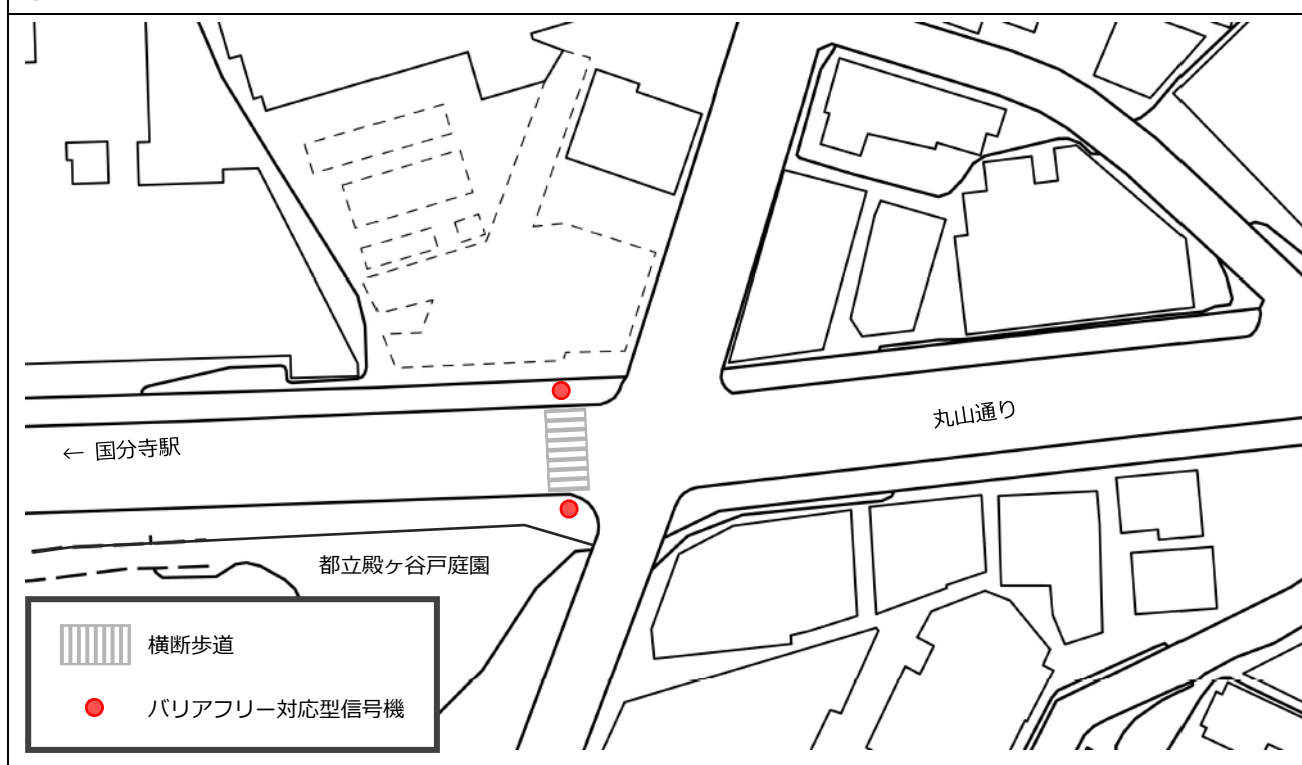

⑤南町三丁目交差点

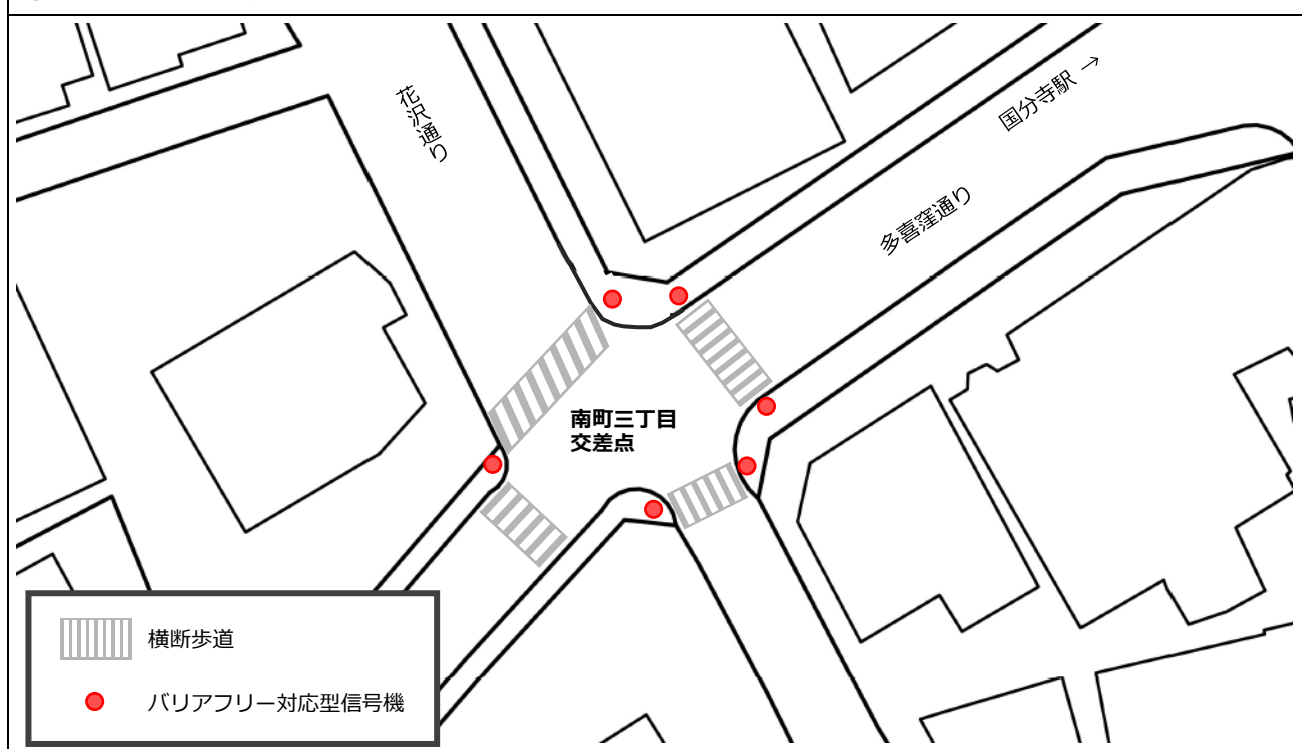

2. エスコートゾーンの整備



①	主要地方道	所沢府中線	国分寺市泉町 2 丁目 4 番 1 号～国分寺東恋ヶ窪 4 丁目 23 番地 8
②	一般都道府県道	恋ヶ窪新田三鷹線	国分寺東恋ヶ窪 4 丁目 23 番地 8～国分寺市本多 1 丁目 14 番 11 号
③	一般都道府県道	小川山府中線	国分寺市本多 1 丁目 14 番 11 号～国分寺市南町 2 丁目 17 番 1 号
④	一般都道府県道	立川国分寺線	国分寺市南町 2 丁目 17 番 1 号～国分寺市泉町 2 丁目 4 番 1 号

教育啓発特定事業													
事業対象		市立小・中学校の児童・生徒		対象事業者名		国分寺市・国分寺市教育委員会							
事業内容・実施時期													
番号	事業内容	目標 時期		実施時期									
				短期					長期				
				R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
1	高齢者、障害のある人々などとの交流や対話の機会の設定	短期・長期	実施時期										
			備考 進捗状況	継続的に実施									
2			実施時期										
			備考 進捗状況										
3			実施時期										
			備考 進捗状況										
その他			実施時期										
			備考 進捗状況										
実施済項目													
・各市立小・中学校が年間指導計画に基づき実施													
その他事項													
実施内容、写真、参考資料等													
・市立小・中学校においては、各学校の年間指導計画に基づき、以下に示す「車いす体験」のような活動を通して、「心のバリアフリー」に関する理解を深めるための指導を計画的に行っている。													
													
車いす体験 (令和4年10月 小学校4年生) 講師：ボランティアセンター 参加人数：約 160 名													

教育啓発特定事業													
事業対象		市職員		対象事業者名		国分寺市							
事業内容・実施時期													
番号	事業内容	目標 時期		実施時期									
				短期					長期				
				R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
1	待遇等の職員研修の実施	短期・ 長期	実施時期										
			備考 進捗状況	継続的に実施									
2	心のバリアフリーに関する学習会の実施	短期・ 長期	実施時期										
			備考 進捗状況	継続的に実施									
3			実施時期										
			備考 進捗状況										
その他			実施時期										
			備考 進捗状況										
実施済項目													
・公務員として市民と接する際の心構えを習得するため、新任研修「待遇研修」を年1回実施。 ・心のバリアフリーに関する学習会に関する学習会を年一回実施													
その他事項													
実施内容、写真、参考資料等													
1. 「待遇研修」の主な内容（バリアフリーに関する内容） ・国分寺市職員の障害を理由とする差別解消推進対応要綱について ・東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例について ・障害種別ごとの主な特徴について ・障害者差別解消法による「合理的配慮」について 2. 心のバリアフリーに関する学習会 （開催日：令和5年3月 講師：まちづくり計画課職員 参加人数 11人） ・年一回実施 ・様々な心身の特性や考え方を持つすべての人々が、相互に理解を深めようとコミュニケーションをとり支えあう心のバリアフリーに関する内容の学習会を実施した。 受講者からは、「身近にどんなバリアがあるか改めて考える良い機会になった」、「困っている方がいた時に、どのような支援や配慮が必要か、正しく理解することが重要だと感じた」等の意見があった。													



教育啓発特定事業													
事業対象		市民		対象事業者名		国分寺市							
事業内容・実施時期													
番号	事業内容	目標 時期		実施時期									
				短期					長期				
				R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
1	ヘルプマーク等の配布	短期・長期	実施時期										
		備考 進捗状況	継続的に実施										
2	理解促進啓発活動の実施	短期・長期	実施時期										
		備考 進捗状況	継続的に実施										
3			実施時期										
		備考 進捗状況											
その他			実施時期										
		備考 進捗状況											
実施済項目													
・ヘルプマーク・ヘルプカード及び災害時等障害者支援バンダナの配布、普及啓発グッズの作成・配布（継続して実施） ・障害者週間（毎年12月3日～9日）に合わせた障害者週間行事の実施（継続して実施） ・障害者差別解消法理解促進のための研修会・講演会の実施（H28～29） ・障害理解促進のための映画上映会の実施（H30～31）													
その他事項													
実施内容、写真、参考資料等													
① ヘルプマーク等の配布（継続して実施） ・高齢者、障害者等、支援が必要な方のためのマーク等（ヘルプカード、ヘルプマーク及び災害時等障害者支援バンダナ）を配布 ・市民に対し、マーク等への理解を促進するための啓発活動を実施													
② 理解促進啓発活動の実施（継続して実施） ・毎年、障害者週間（12月3日～9日）に合わせて障害者週間行事を企画し、広く市民に向けて、障害理解促進に向けた講演会、展示会、体験型ワークショップ等を実施													
【R4年の実施概要】 ① ヘルプマーク、ヘルプカード普及啓発グッズとしてボールペンを作成し、市内小学校や庁内窓口にて配布した ② 障害者週間行事として、「ユニバーサルマナー」についての講演会、市内障害者施設によるワークショップ及び物品販売会、障害のある方々による絵画等作品展示会を実施した				令和4年度障害者週間行事 講演会：「ユニバーサルマナーセミナー～今日からできること～」を開催									

教育啓発特定事業													
事業対象		JR 国分寺駅			対象事業者名		JR 東日本						
事業内容・実施時期													
番号	事業内容	目標 時期		実施時期									
				短期					長期				
				R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
1	高齢者・障害者等に対する適切な接遇・ 解除の方法に関する駅係員への継続的な 教育訓練の実施	短期 ・ 長期	実施時期										
			備考 進捗状況	・継続的に実施する。									
2			実施時期										
			備考 進捗状況	・									
3			実施時期										
			備考 進捗状況	・									
その他			実施時期										
			備考 進捗状況	・									
実施済項目													
・実車を使用した救出訓練等の社員教育を継続して実施 ・「声かけ・サポート」運動を継続して実施													
その他事項													
実施内容、写真、参考資料等													
① 社員教育の実施（継続して実施） ●駅間長時間停車中の車内に、白杖・車いすお客さま・高齢者・障害者がいる想定での実車を使用した救出訓練を実施した。（2022 年 9 月 5 日～ 8 日 三鷹車両センターにて実施） ●当社・他社問わず、鉄道業において発生した情報は発生の都度、朝礼・駅報にて社員周知するとともに、社員教育として「他山の石」の活用を行っている。 ② 「声かけ・サポート」運動の実施（継続して実施） ●ポスターの掲出・駅構内放送の実施を行うとともに、社員からお客さまに対して、お客さまと双方向でコミュニケーションをとりながら、鉄道サービス業として適切な声かけを実施した。													

教育啓発特定事業													
事業対象		西武国分寺駅			対象事業者名		西武鉄道株式会社						
事業内容・実施時期													
番号	事業内容	目標 時期		実施時期									
				短期					長期				
				R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
1	高齢者、障害者等に対する適切な接遇・ 介助の方法に関する駅係員への継続的な 教育訓練の実施	短期 ・ 長期	実施時期										
			備考 進捗状況										
2			実施時期										
			備考 進捗状況										
3			実施時期										
			備考 進捗状況										
その他			実施時期										
			備考 進捗状況										
実施済項目													
・机上及び実技による社員教育を継続して実施 ・「声かけ・サポート」運動強化キャンペーンを継続して実施													
その他事項													
実施内容、写真、参考資料等													
① 社員教育の実施（継続して実施） お客さまにより安心感をもって西武鉄道をご利用いただくため、机上及び実技による社内教育を実施し対応スキル向上に努めている。													
② 「声かけ・サポート」運動強化キャンペーン（継続して実施） お客さまが安全かつ安心して施設をご利用いただけるよう、お困りのお客さまに対して駅係員から積極的にお声かけを行うとともに、周囲のお客さまからもお声かけにご協力いただく。 （交通事業者 84 社局、障害者団体を含む 7 団体で実施。2022 年 8 月 26 日 ニュースリリース）													

教育啓発特定事業

事業対象	路線バス（西武）	対象事業者名	西武バス株式会社
------	----------	--------	----------

事業内容・実施時期

番号	事業内容	目標 時期		実施時期									
				短期					長期				
1	高齢者，障害者等に対する適切な接遇・ 介助の方法に関する乗務員への継続的な 教育訓練の実施	短期 ・ 長期	実施時期	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
			備考 進捗状況										
2			実施時期	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
			備考 進捗状況										
3			実施時期	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
			備考 進捗状況										
その他			実施時期	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
			備考 進捗状況										

実施済項目

- ・全乗務員に対して各営業所で3ヶ月に1回開催している定期研修のうち、年1回は車いすを使用した実地研修を実施。

その他事項

- ・一般的な接遇教育として最低年6回、覆面添乗員が営業車両に乗り込み接遇状況を確認、接遇が不適切な者については各営業所管理者から指導を実施。その他定期的に研修所での集合教育等を実施。

実施内容、写真、参考資料等



教育啓発特定事業													
事業対象		路線バス（立川）		対象事業者名		立川バス株式会社							
事業内容・実施時期													
番号	事業内容	目標 時期		実施時期									
				短期					長期				
				R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
1	高齢者、障害者等に対する適切な接遇・介助の方法に関する乗務員への継続的な教育訓練の実施	短期・長期	実施時期										
			備考 進捗状況										
2			実施時期										
			備考 進捗状況										
3			実施時期										
			備考 進捗状況										
その他			実施時期										
			備考 進捗状況										
実施済項目													
・ 奇数月には全乗務員対象に小集団教育を実施													
その他事項													
実施内容、写真、参考資料等													
													

教育啓発特定事業

事業対象	路線バス（京王）	対象事業者名	京王電鉄バス株式会社
------	----------	--------	------------

事業内容・実施時期

番号	事業内容	目標 時期		実施時期									
				短期					長期				
				R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
1	高齢者、障害者等に対する適切な接遇・介助の方法に関する乗務員への継続的な教育訓練の実施	短期・長期	実施時期										
			備考 進捗状況										
2			実施時期										
			備考 進捗状況										
3			実施時期										
			備考 進捗状況										
その他			実施時期										
			備考 進捗状況										

実施済項目

- ・全乗務員に対して 3 年に 1 度の頻度で受講させている定期研修（開催は毎年）において、本物の車いすを用いた介助訓練、手足におもりやギブス等で関節を固定してバスに乗り降りする高齢者疑似体験を実施。

その他事項

- ・全般的な接遇教育として全乗務員に対して年 2 回以上、覆面添乗員が営業車両に乗車してチェックを行い、各営業所の管理者から指導を実施。また必要に応じて集合教育形式の CS 研修も実施。

実施内容、写真、参考資料等



その他の特定事業

整備対象		国分寺駅北口立体広場			対象事業者名		国分寺市							
事業内容・実施時期														
番号	事業内容	延長(m) 箇所数	目標 時期		実施時期									
					短期					長期				
1	北口階段中央部への手すりの設置	1 箇所	短期	実施時期	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
				備考 進捗状況	・実施済									
2	北口階段踊り場への点状ブロックの設置	1 箇所	短期	実施時期	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
				備考 進捗状況	・実施済									
3				実施時期	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
				備考 進捗状況										
その他	方向定位ブロックの設置	未定	短期	実施時期	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
				備考 進捗状況	・実施済									


実施済項目

・全て実施済み。



その他事項

・方向定位ブロックの設置について、視覚障害者を対象に設置前後における効果の検証を実施している。令和5年度は引き続き事後検証を実施予定。

事業箇所図

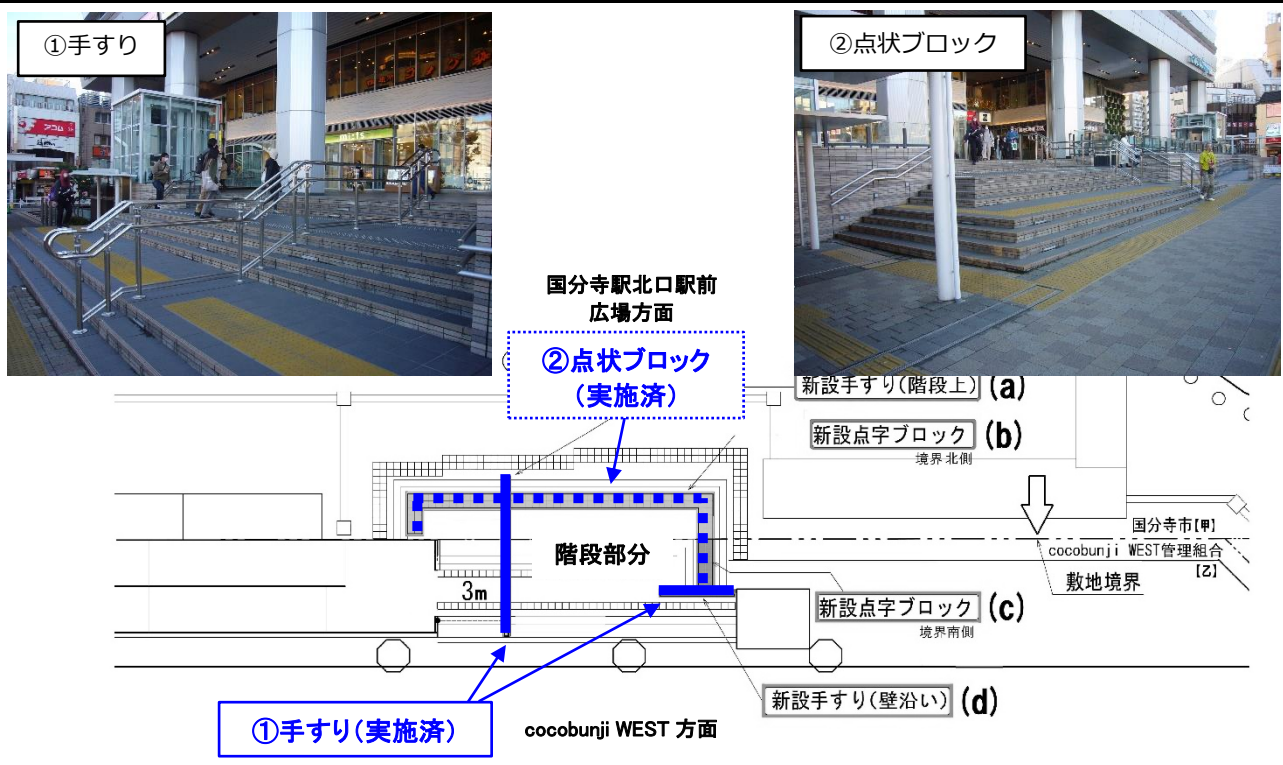

方向定位ブロック設置位置

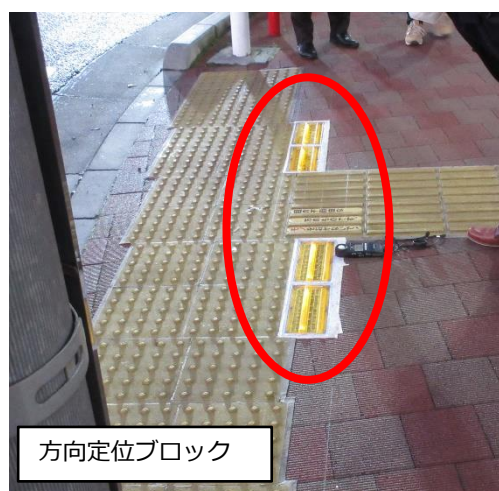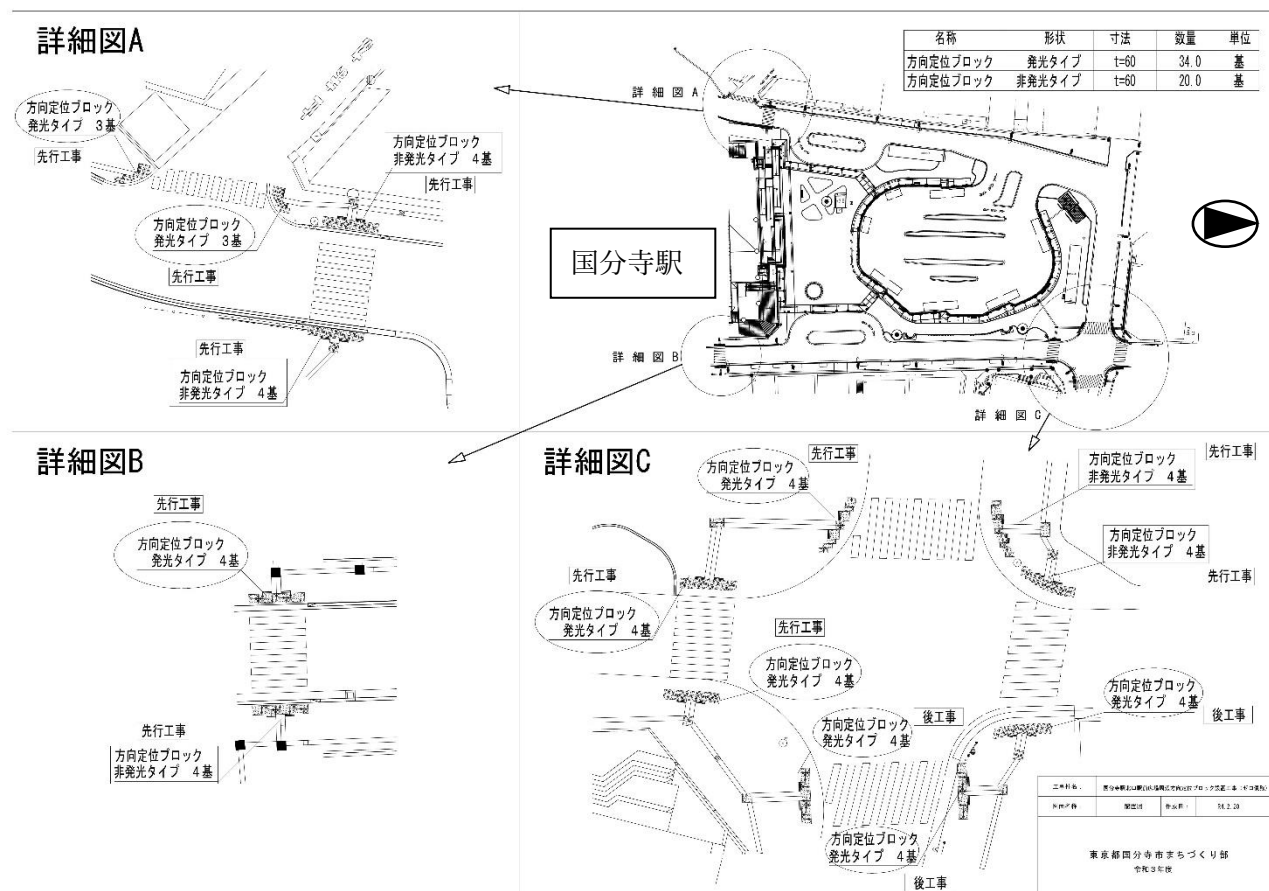

その他の特定事業														
整備対象		南口広場		対象事業者名		権利者等と調整の上、決定。								
事業内容・実施時期														
番号	事業内容	延長(m) 箇所数	目標 時期		実施時期									
					短期					長期				
					R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
1	南口広場の整備	1 箇所	継続 検討	実施時期										
				備考 進捗状況	※検討中 ・【R4】基礎調査委託でバリアフリー状況を確認。維持管理の一部移管等について、土地所有者と協定締結。									
2				実施時期										
				備考 進捗状況										
3				実施時期										
				備考 進捗状況										
その他				実施時期										
				備考 進捗状況										
実施済項目														
その他事項														
・土地所有者との協議，市民意向の把握等を経て具体的な整備内容を決定していく。														
事業箇所図														

その他の事業														
整備対象		泉町二丁目バス停		対象事業者名		京王電鉄バス株式会社								
事業内容・実施時期														
番号	事業内容	延長(m) 箇所数	目標 時期		実施時期									
					短期					長期				
					R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
1	バス停留所への上屋の設置	2 か所	継続 検討	実施時期										
				備考 進捗状況	※検討中 ・収支状況も勘案しながら検討する									
2				実施時期										
				備考 進捗状況										
3				実施時期										
				備考 進捗状況										
その他				実施時期										
				備考 進捗状況										
実施に必要な資金額及び調達方法														
・基礎を深く埋める必要があるため、埋設物の状況によって設置費用は大きく変化する。														
実施済項目														
その他事項														
・上屋設置後も十分な歩行空間が確保されていることを確認する必要がある。														
事業箇所図														

**国分寺市バリアフリー特定事業の進捗状況
(令和4年度実績)**

令和6年1月

発 行：国分寺市

編 集：まちづくり部まちづくり計画課

〒185-8501

東京都国分寺市戸倉1丁目6番地1

電話 042-325-0111（代表）
