

都市計画公園 戸倉公園の整備に関する工事説明会


令和6年7月27日(土)
国分寺市建設環境部
緑と公園課

説明内容


- 工事内容について
- 工事作業について
- 質疑応答

工事内容について【工事場所】

案内図

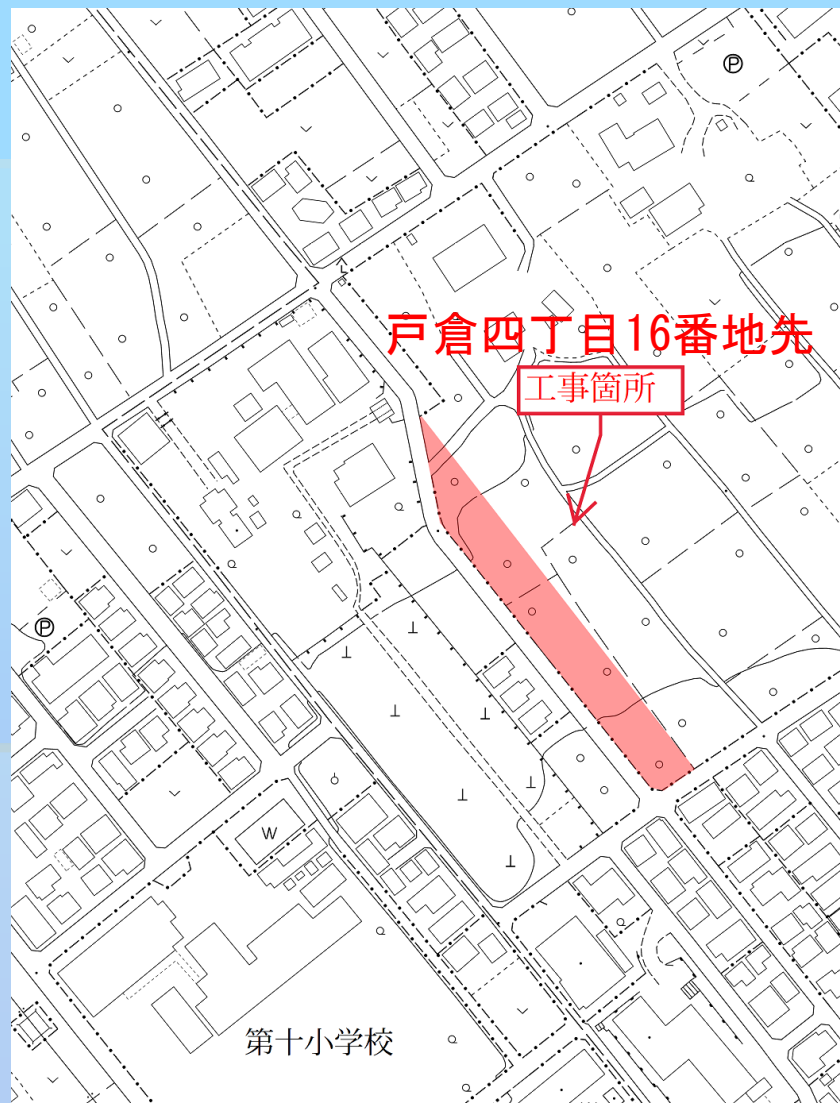

工事内容について【公園全体】

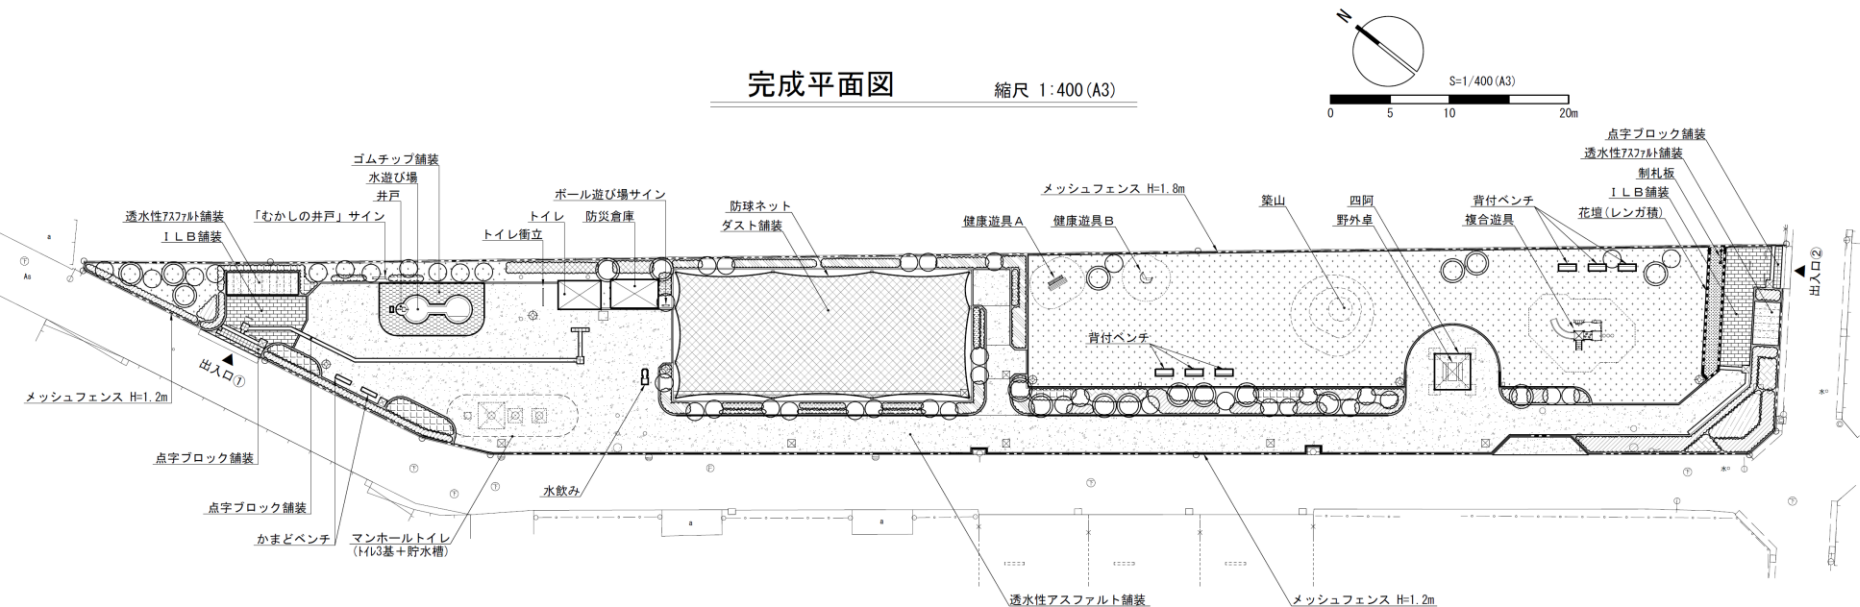


□ 施設概要


敷地面積：約 2,150 m²

- ・ 防災井戸
- ・ マンホールトイレ
- ・ かまどベンチ
- ・ バリアフリートイレ
- ・ 防災倉庫
- ・ ボール遊びのできる場所
(幅 24m 奥行 10m 天井高 5m
天井ネット：昇降式)
- ・ 広場・築山(約 620 m²)
- ・ あずまや、野外卓
- ・ 健康遊具(踏台昇降等)
- ・ 未就学児童用複合遊具
- ・ 花壇、植栽
- ・ 自転車等置場
- ・ 出入口、園路(管理通路)


工事内容について【公園北側】

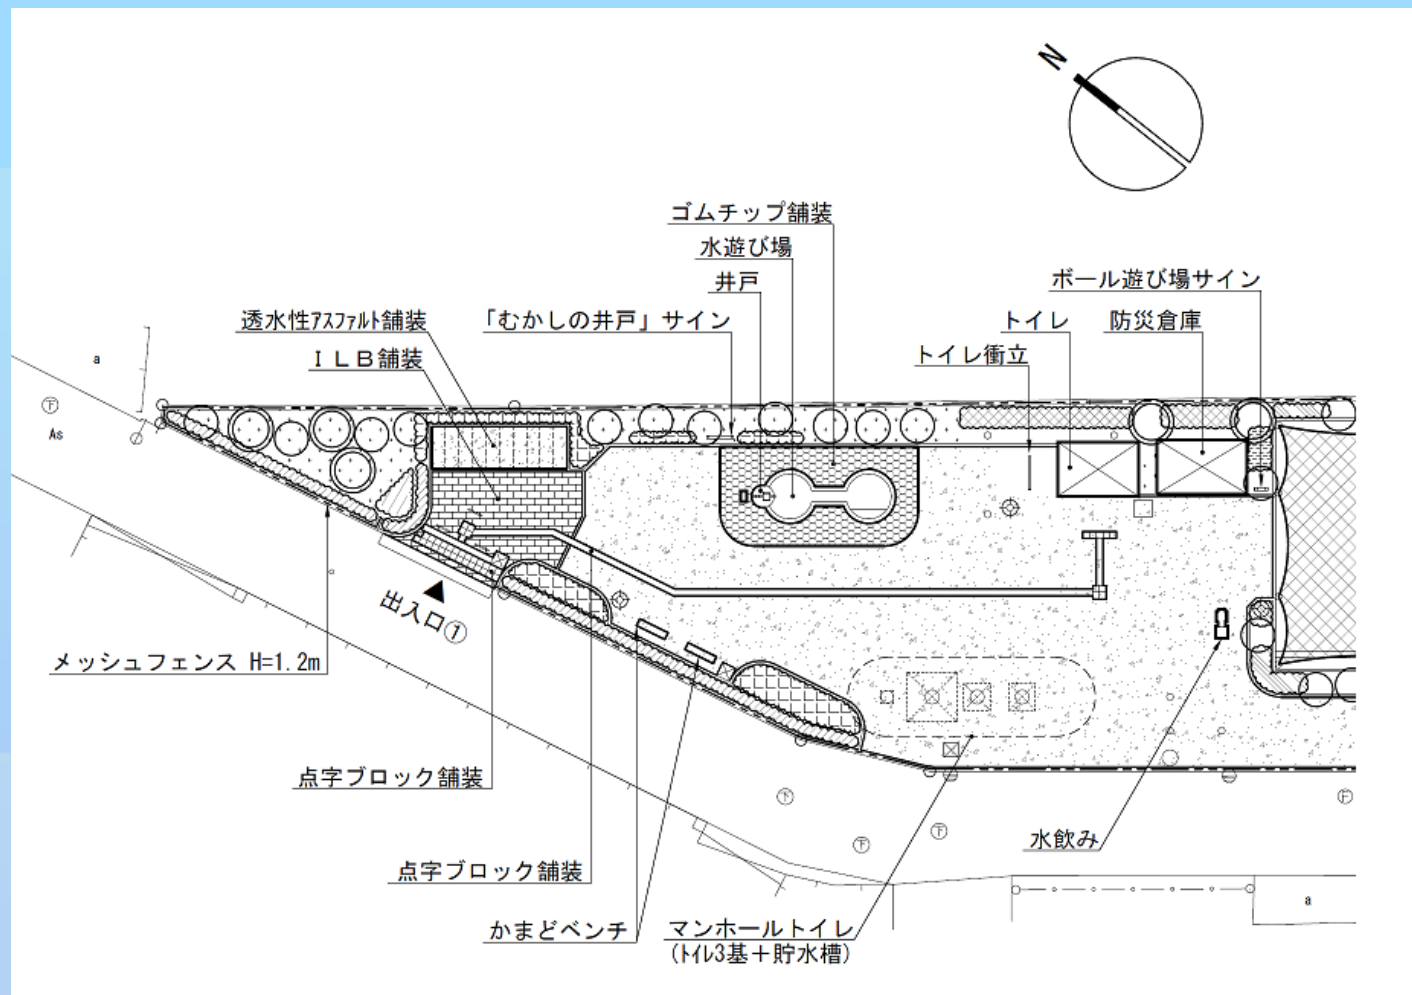


工事内容について【公園中央】

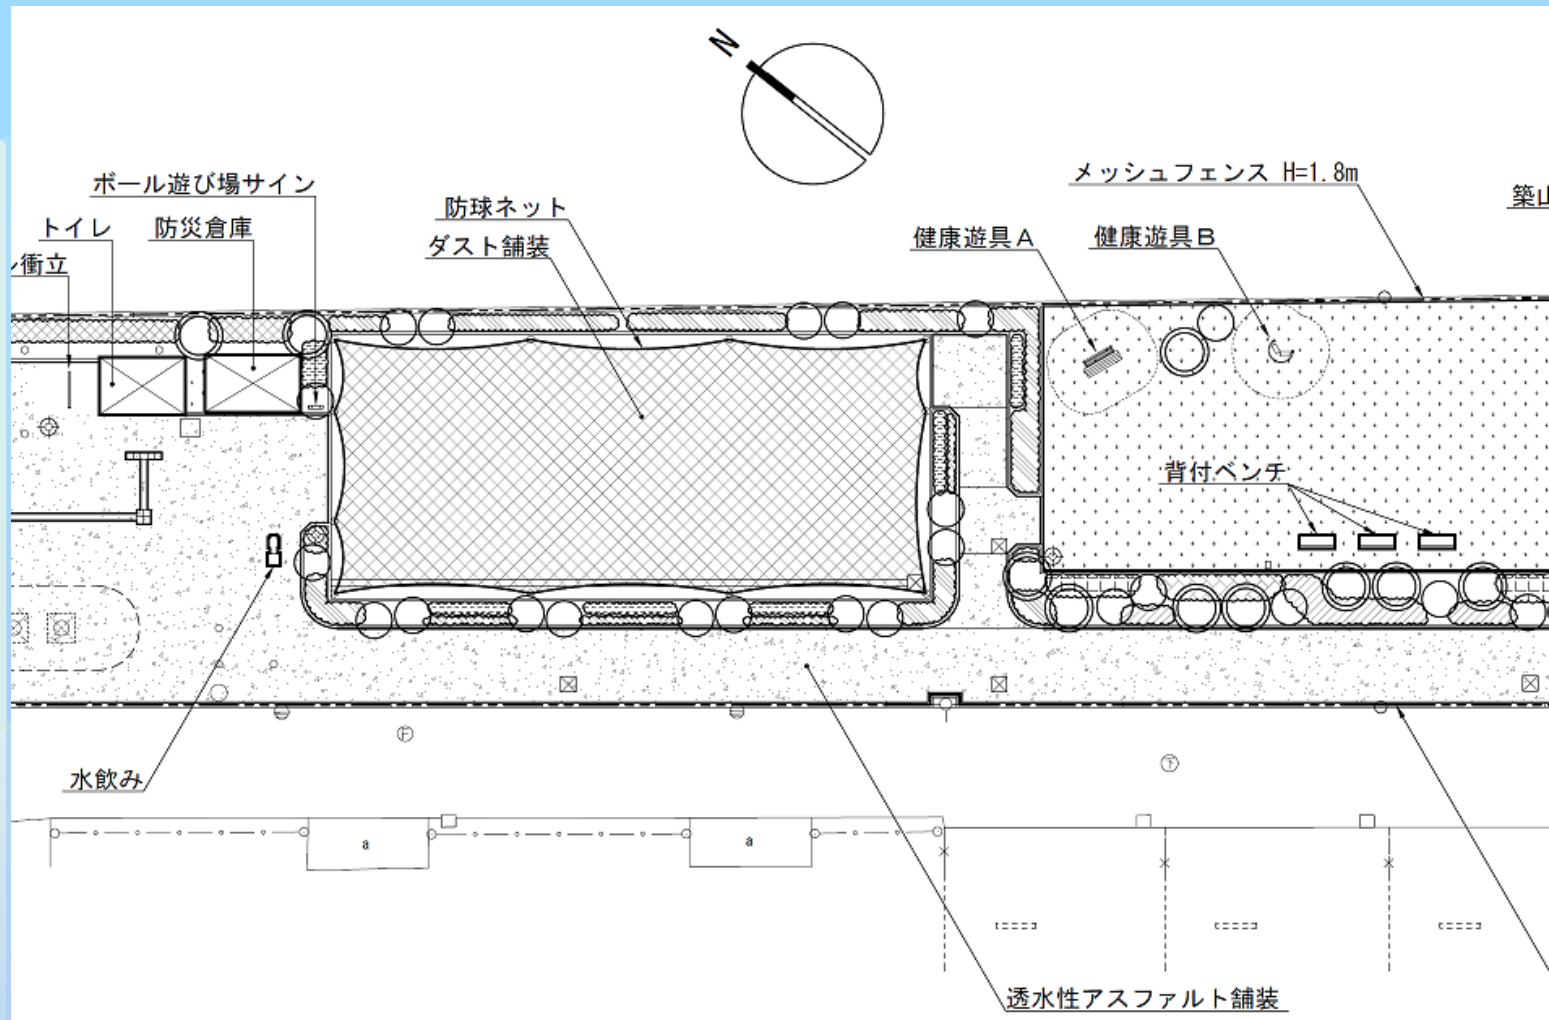

工事内容について【公園南側】

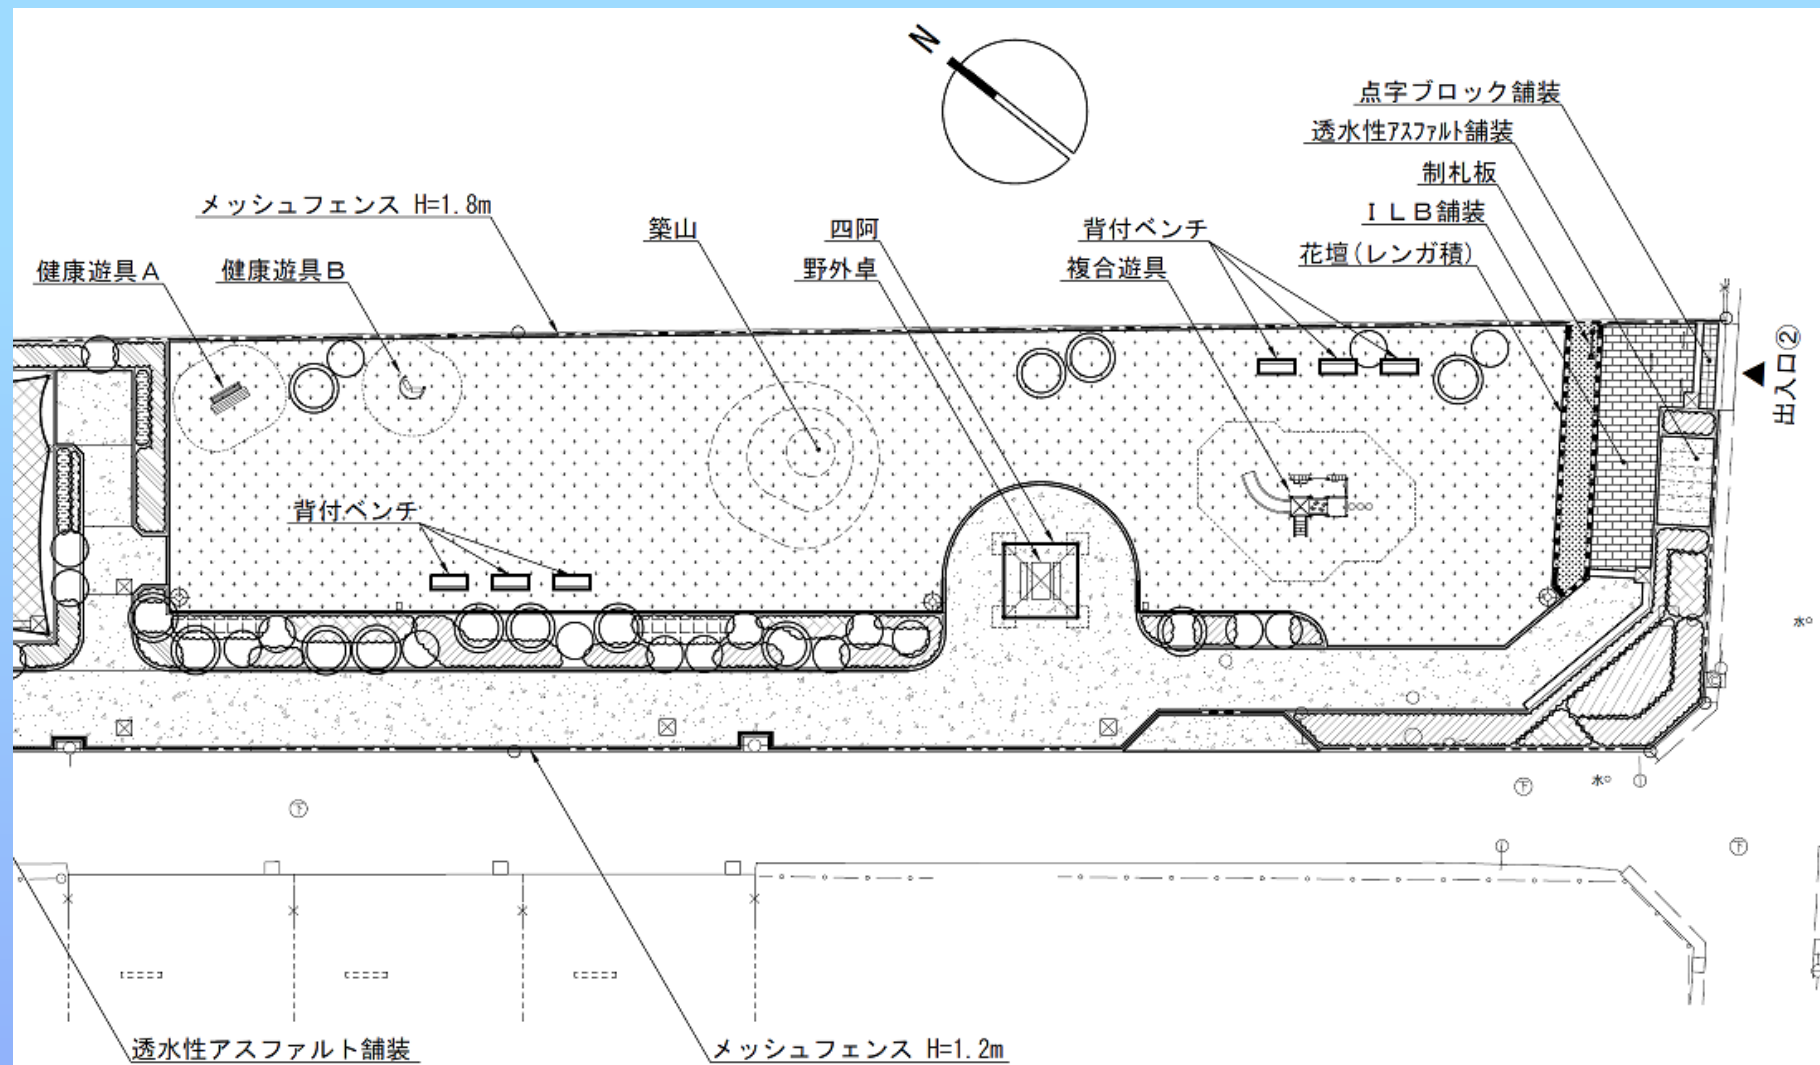

工事内容について【公園整備イメージ】

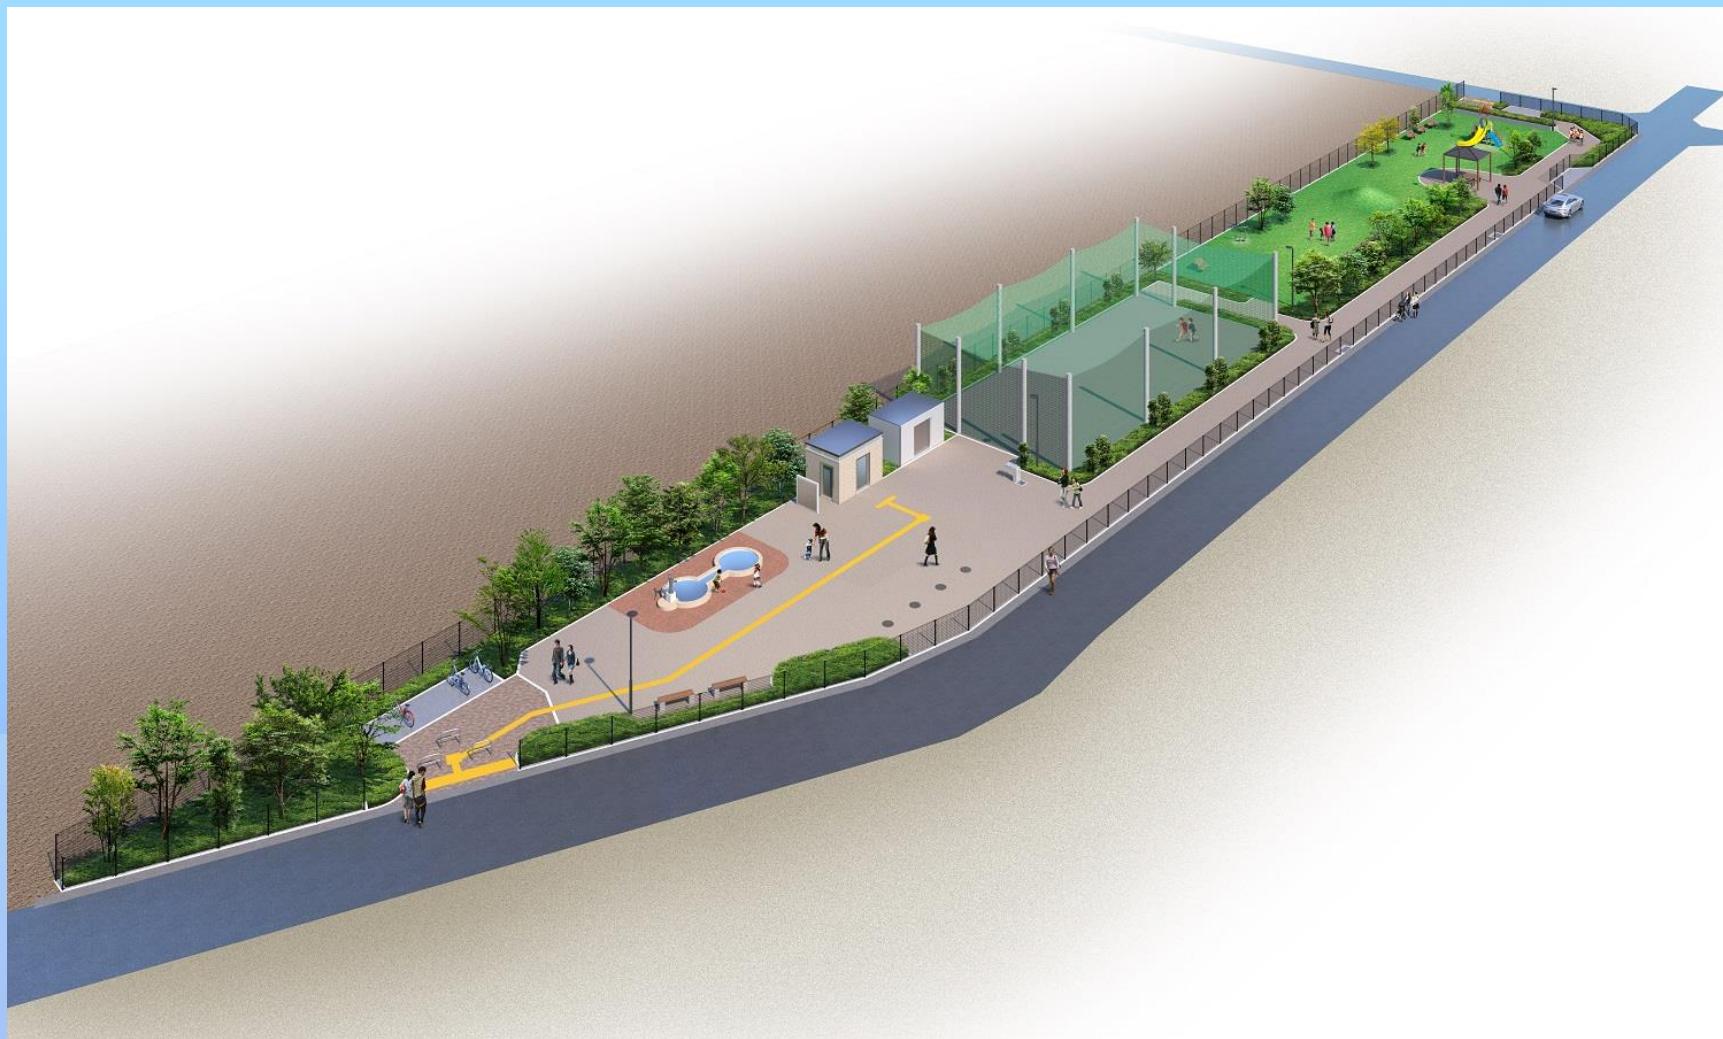

工事作業について

本日の内容

1. 施工会社概要

2. 工事工程

3. 工事中の環境保全対策

1. 施工会社概要

施工会社	鈴木造園株式会社
住 所	国分寺市光町一丁目33番地5
設 立	昭和57年4月5日
業 種	建設業(造園業)
施工経歴	日立製作所中央研究所構内緑地整備工事(昭和58年7月) 泉町公園整備工事その6(平成13年3月) 北町公園整備工事(平成19年3月) 平成22年度シンボルプロムナード公園整備工事(JV) (平成23年3月) 史跡武蔵国分寺跡(僧寺地区)第一期整備工事 (平成30年3月) 恋ヶ窪樹林地整備工事(令和2年3月) 内藤さつき公園整備工事(令和4年3月)

2.工事工程

【工事工期】

令和6年7月16日から令和7年2月28日まで

【作業時間】

8:30～18:00 原則、平日のみ(月～金) ※年末年始を除く

【作業予定】

7月下旬～8月上旬

1.準備工:書類作成と事前測量

8月下旬～10月下旬

2.仮設工、施設撤去工、敷地造成工、井戸設置工
管理施設整備工、便所工、構造物撤去工、
給排水設備設置工

11月上旬～12月上旬

3.水場設置工、四阿工、遊具組立設置工、
サービス施設整備工、倉庫工

翌年1月上旬～2月上旬

4.電気設備工、園路広場整備工、植栽工

翌年2月下旬

5.後片付け、事後測量

3.工事中の環境保全対策


【工事車両の搬出入口】



※主に上記矢印のルートでの搬出入となります。通行の際には、制限速度を遵守し騒音・振動の低減に努めます。

【仮囲い設置計画図】


施工の際は緑のラインで仮囲いをする予定です。

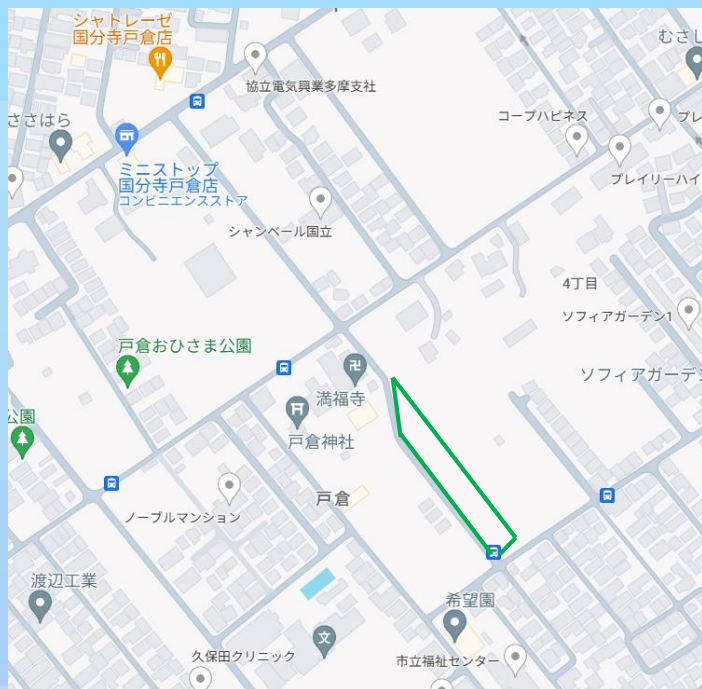


オレンジネットフェンス設置例



プラスチックフェンス設置例

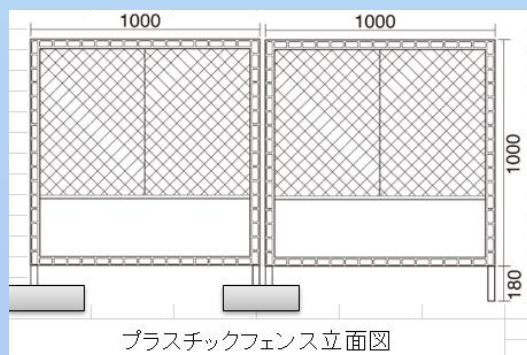

【工事の作業帯例】

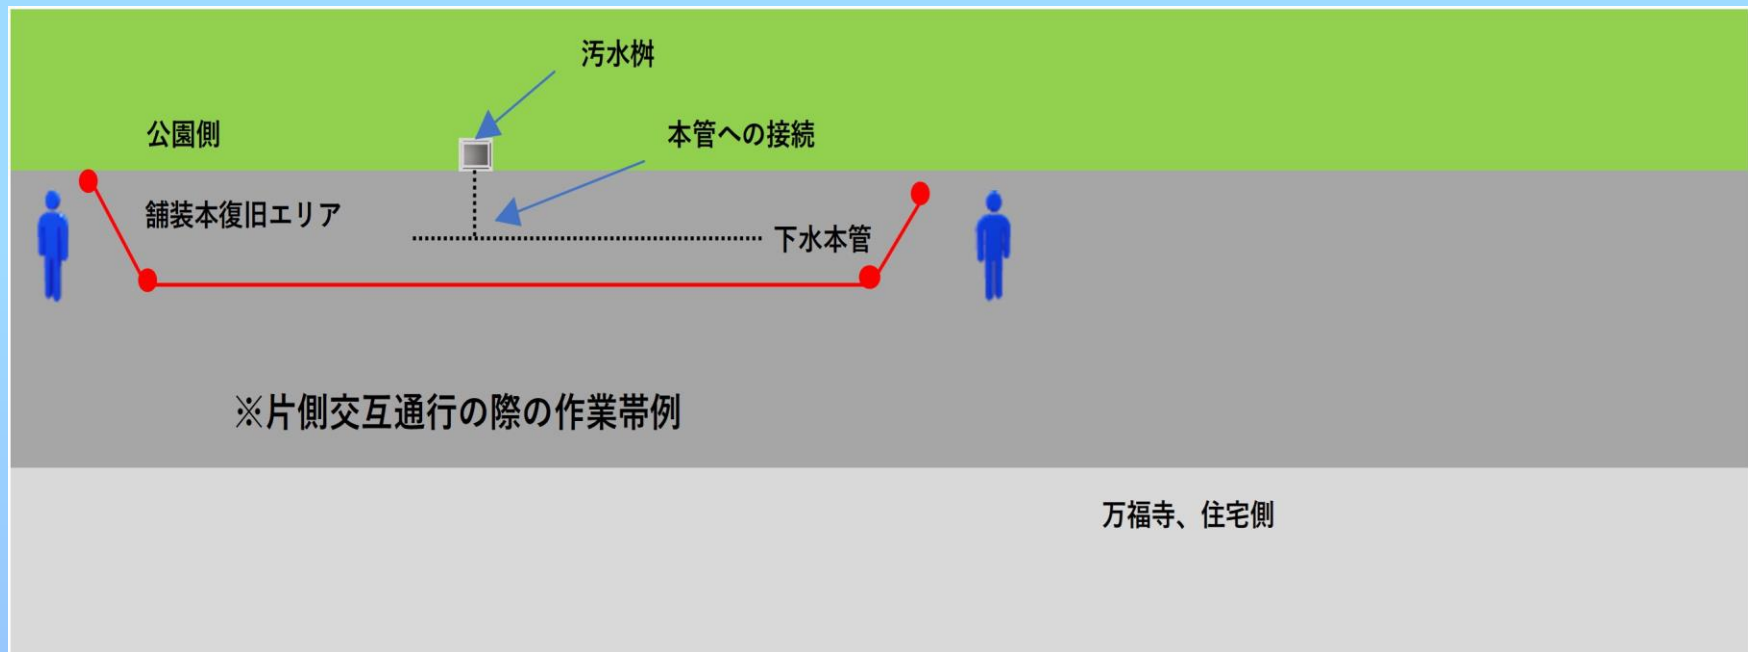

- 沿道での資材積降し・作業時は、道路使用許可証を取得した上で作業帯を設けて作業を行います。ぶんバスの運行に支障が出ないようにします。
- 誘導員を配置し、車両と歩行者を誘導します。

【工事期間中のお願い】

- ✓ 工事期間中、周辺にお住まいの方々には、長期にわたってご迷惑をお掛けしますが、ご理解・ご協力の程よろしくお願いいたします。
- ✓ 工事期間中、ご不明な点がありましたら現場代理人にご連絡ください。

連絡先

鈴木造園株式会社
TEL:042-572-3310

現場代理人:梅木

国分寺市役所
建設環境部 緑と公園課
TEL:042-325-0111(内線353)

担当:内山
