

新庁舎建設工事の進捗状況について


工事写真



スラブ配筋上には作業通路としてメッシュロードが一定間隔で整備されており,安全面・品質面でも良好な環境が整備されていることを確認しました。(6/26)



設備開口の開口補強筋も適切に施工されていることを確認しました。「開口部注意」との表示も適切に行われています。(6/26)

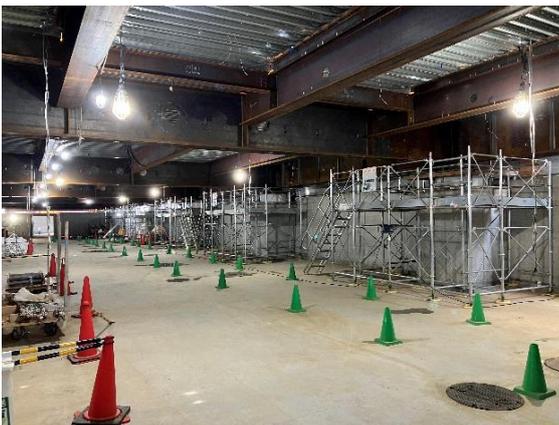


地下1階は不要資材が撤去され、安全通路および仮設照明が整備され、良好な環境が整備されていることを確認しました。(6/26)



設備スリーブの開口補強筋が適切に施工されていることを確認しました。開口補強筋がピンク色で「見える化」されています。(6/26)



現場打ち庇PC部材の製作が行われています。型枠脱型後の表面も綺麗な状態であることを確認しました。庇PC部材を設置する仮設架台も整備され、適切に管理されています。(6/26)

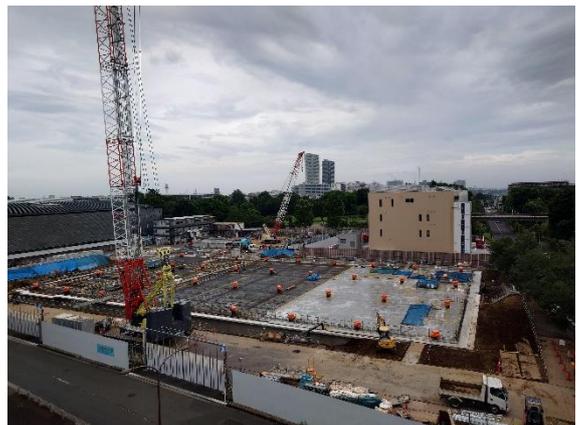

いずみプラザ屋上から現在の全景 (6/30)
