国分寺都市計画道路事業
3･4･12号国分寺駅上水線
（本町三丁目地内～本多二丁目各地内）

令和8年度工事の概要


令和8年10月

国分寺市
建設環境部道路建設課

・国分寺都市計画道路事業３・４・12号国分寺駅上水線の令和８年度の工事について、説明します。

工事概要

工事件名	街路築造工事のうち排水施設設置工事（８－国３・４・12号線）
工事場所	国分寺市本町三丁目地内から本多二丁目地内
工　　期	令和８年７月２９日から令和９年３月１６日まで（契約工期）
発 注 者	国分寺市　建設環境部　道路建設課
受 注 者	森永建設株式会社

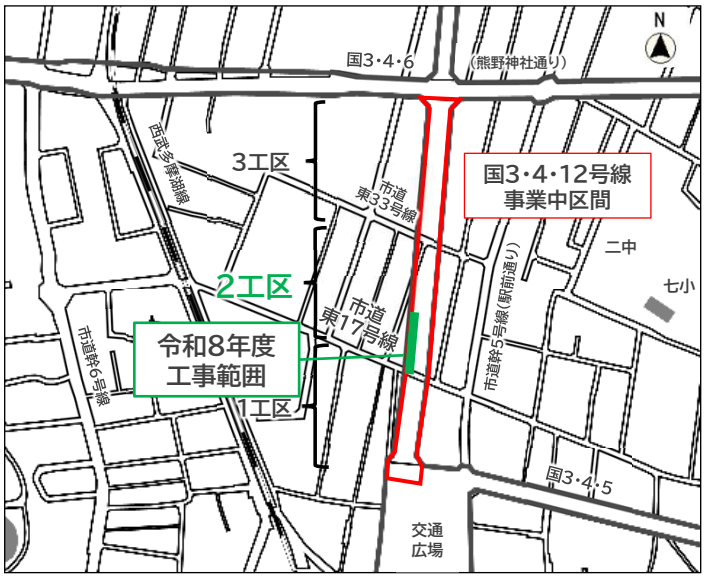


出典：国土地理院地図（地理院タイル（基盤地図情報基本項目モデル））を加工して作成

・工事件名は「街路築造工事のうち排水施設設置工事（８－国３・４・12号線）」です。
・工事場所は、国分寺市本町三丁目地内から本多二丁目地内で、市道東17号線から市道東33号線までの区間である２工区において、道路排水を処理するための排水管やマンホール等を設置します。
・２工区の排水は、市道東17号線に埋設されている下水道管に流す計画のため、事業用地内と、下水道管への接続部付近である市道東17号線上で工事を行います。
・契約工期は令和８年７月29日から、令和９年３月16日までとなっており、この説明会後に現場着手する予定です。
・発注者は国分寺市建設環境部道路建設課で、受注者は森永建設株式会社です。

工程表

◯昼間施工を基本とし、一部の路上作業で夜間施工を検討しています。

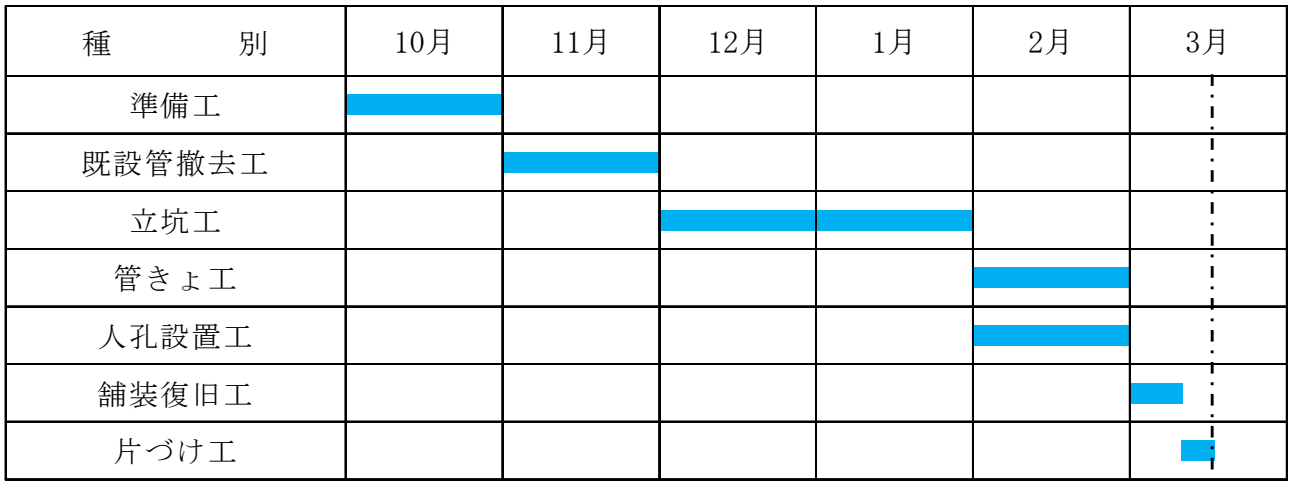

種　　別	10月	11月	12月	1月	2月	3月
準備工						
既設管撤去工						
立坑工						
管きょ工						
人孔設置工						
舗装復旧工						
片づけ工						

・こちらは、工事の流れを示す、工程表です。
・施工時間は、昼間施工を基本とし、一部の路上作業で夜間施工を検討しています。詳細は、交通管理者と協議して決定します。

工事のイメージ：管きょ工（開削工法）


○市道東17号線での工事は主に、地面を地表から掘り下げる開削工法で行います。



・続いて、工事のイメージを説明します。
・今回の工事は、主に、地面を地表から掘り下げる開削工法で行います。

工事のイメージ：管きょ工（小口径推進工法）

◯排水管の一部は、地上から掘り下げるのではなく、立坑から横に穴を掘る推進工法で管きょを設置します。

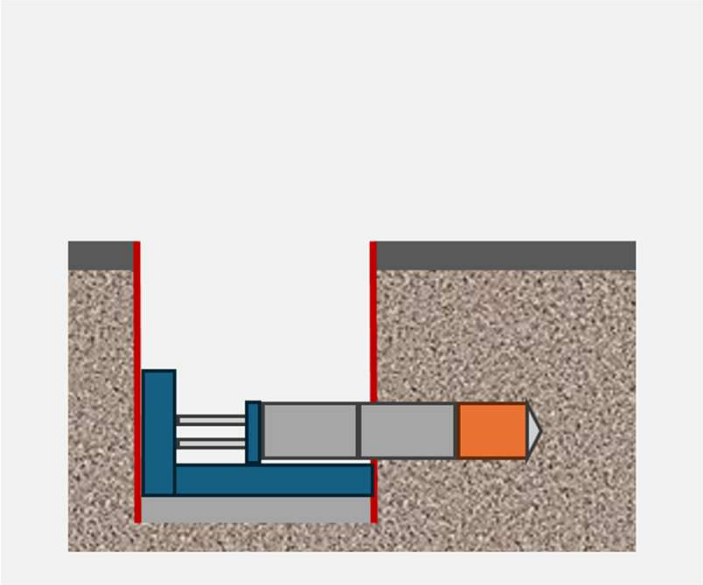

・また、排水管の一部は、地表から掘り下げるのではなく、立坑と呼ばれる縦穴を掘り、立坑から横に穴を掘る推進工法で管きょを設置します。

工事のイメージ：人孔設置工

◯清掃や点検など維持管理のために、マンホール（人孔）を設置します。



・排水管のほかには、清掃や点検など維持管理のために、マンホールを設置します。

工事のイメージ：仮設工

○市道東17号線における工事では、覆工板と呼ばれる仮の蓋を設置するなどして、工事をしていないときは道路を通れるようにします。





覆工板

・市道東17号線における工事では、覆工板と呼ばれる仮の蓋を設置するなどして、工事をしていないときは道路を通れるようにします。

工事中の交通規制

◯市道東17号線での路上工事では、交通規制を行う予定です。

◯車両については一時通行止めを行う予定です。

◯交通誘導員によりご案内しますので、迂回のご協力をお願いします。

迂回経路(案)



出典:国土地理院地図(地理院タイル(基盤地図情報基本項目モデル))を加工して作成


・工事中の交通規制について説明します。
・事業用地内での工事では、交通規制はありません。
・市道東17号線での路上工事では、交通規制を行う予定です。
・歩行者については、歩行者用通路を設けますので、通行できます。
・車両については一時通行止めを行う予定です。
・一時通行止めのときは、交通誘導員によりご案内しますので、迂回のご協力をお願いします。
・一時通行止めを行う際は、事前に予告看板を設置するほか、周辺の皆様にはチラシによりお知らせします。

工事車両の経路

◯主動線として、市道東17号線から、市道幹4号線を利用する計画です。

◯市道東17号線は通学路となっているため、登校時間の利用を避けるとともに、下校時間については歩行者優先を徹底し、安全管理に努めます。

工事車両経路

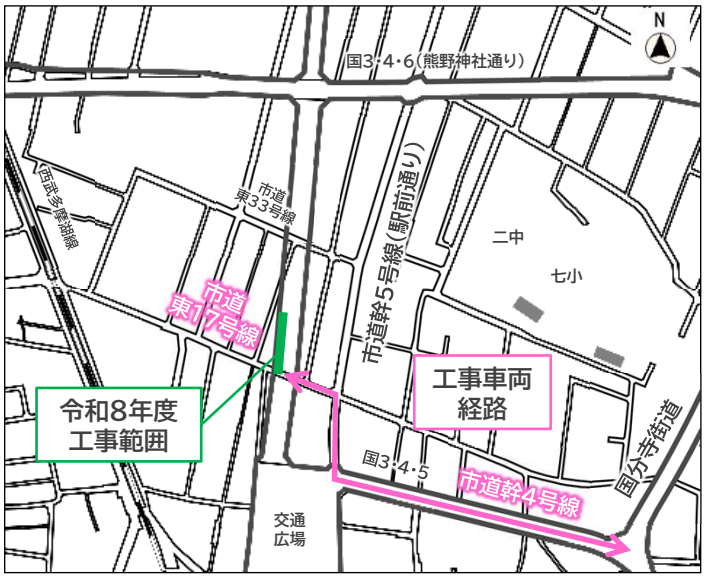

出典:国土地理院地図(地理院タイル(基盤地図情報基本項目モデル))を加工して作成

・工事車両の経路です。
・主動線として、市道東17号線から、市道幹４号線を利用する計画です。
・なお、市道東17号線は通学路となっているため、登校時間の利用を避けるとともに、下校時間については歩行者優先を徹底し、安全管理に努めます。

皆様のご理解とご協力を
お願いします。

・工事中はご不便をおかけすることもあるかと思いますが、安全第一で進めていきますので、ご理解とご協力をお願いします。
